


神通川堤防一部欠損箇所の復旧完了(H30.7.11(水)18:30)

平成30年7月豪雨出水により堤防断面の欠損が確認された神通川の葛原地先では、6日夕方から堤防の復旧を24時間体制で実施してきましたが、11日18時30分に堤防の復旧が完了しました。同時刻、福濱富山河川国道事務所長が現地を訪れ、復旧した堤防を確認するとともに、復旧工事に携わった災害協定会社等の関係者に対して謝意を述べました。


- 堤防欠損箇所：神通川水系神通川左岸22.4~22.5km L=100m（富山市葛原地先）
- 堤防欠損発見日時：平成30年7月 6日（金）11時過ぎ ※職員河川巡視にて
- 緊急復旧開始時刻：平成30年7月 6日（金）19時10分
- 緊急復旧完了時刻：平成30年7月11日（水）18時30分 ※昼夜連続119時間

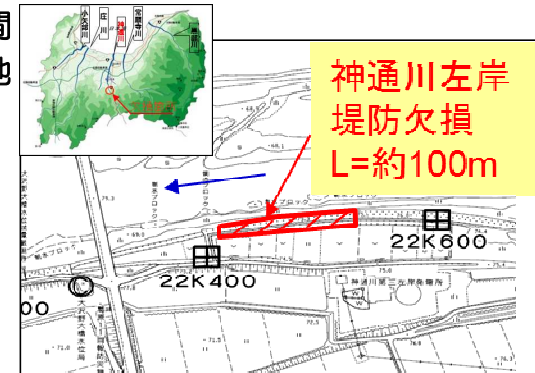

復旧が完了した堤防(平成30年7月11日(水)18:30)

■復旧内容

根固めブロック投入(4t)	: 432個
堤防復旧盛土	: 1,900m ³
耐候性大型土のう設置(1t)	: 350個
遮水シート	: 800m ²
袋詰玉石設置(2~3t)	: 333個

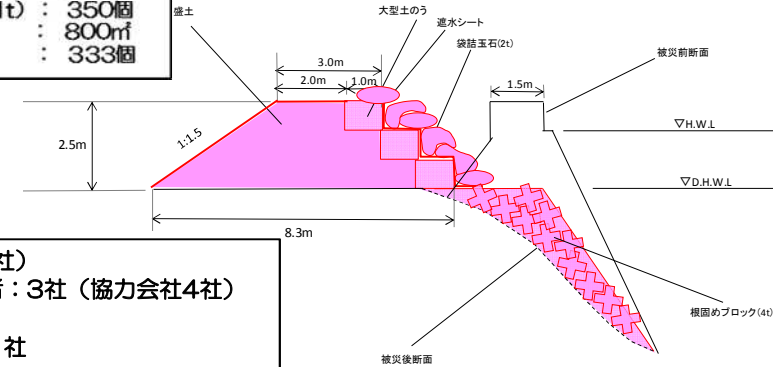

- 復旧工事関係者(11社)
- 緊急応急対策協定会社: 3社(協力会社4社)
 - 照明車設置者: 3社
 - カメラ配信管理者: 1社



復旧完了報告を行う工事関係者代表



工事関係者に謝意を述べる福濱事務所長



復旧した堤防(上流から下流を望む)
