

だいげんたさぼうかいらんばん 大源太砂防回覧板

平成30年1月号 (No.18)

国土交通省北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社 大源太砂防堰堤作業所
(担当: 横川 TEL 025-775-7948)

新年明けましておめでとうございます

昨年中は大源太川第1号砂防堰堤補強工事にひとかたならぬお力添えを賜り、厚く御礼申し上げます。


補強工事も工事開始から約3年が経ち、また仮設段階ではありますが設備が徐々に出来上がっていくことは、地域の皆様方のご支援、ご協力があったのことに改めて厚く感謝いたします。

本年の皆様方のご健勝、ご活躍をご祈念申し上げますとともに、引き続き大源太川第1号砂防堰堤工事にご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

(工事関係者一同)



新しい年を迎えた大源太山と大源太湖

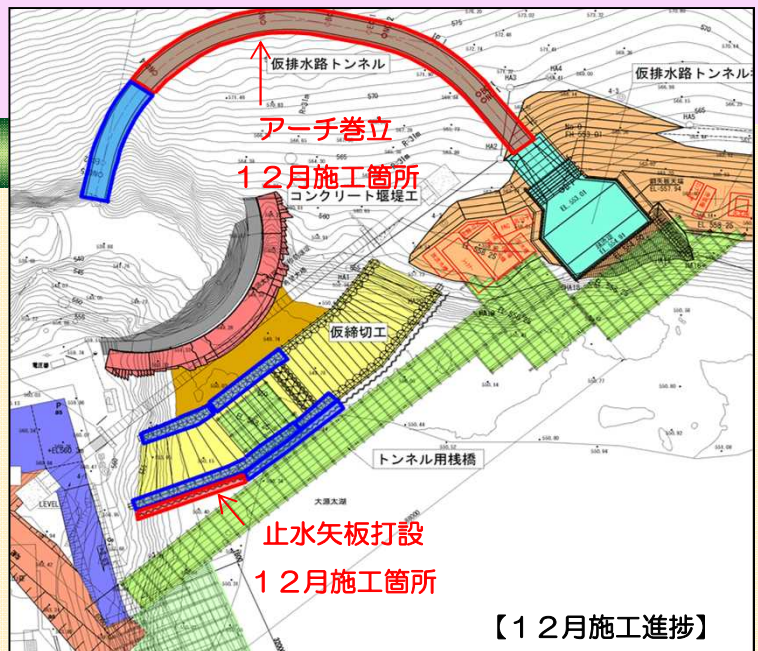

【12月施工進捗】

1. 補強工事の進捗について

12月末までに今年度の予定工事が完了しました。なお、工事は積雪のため、1月より一時休止し、3月より再開する予定です。

【仮排水トンネル】

12月末までにアーチ部のコンクリートがほぼ完了しました。

【仮締切工】

12月末までに鋼管杭、止水鋼矢板の左岸部半分の施工が完了しました。

【仮排水トンネル工】


着工前



掘削完了



アーチ巻立完了



【仮締切工】

着工前



鋼管施工中



左岸部施工完了



2. 湯沢町観光協会による現場視察会が行われました。

11月17日、湯沢町観光協会による工事現場視察会が行われました。当日は観光関係者16名の方が参加され、貫通した仮排水トンネル内の施工状況、仮締切工の鋼管杭施工状況等を見て頂きました。特殊な施工機械やトンネル内の様子など、皆さん大変熱心に興味深く見学をされていました。



遊歩道で集合写真



トンネル坑口にて



当日は大源太山も冠雪し皆様をお迎え

多くの観光客が訪れる場所での工事なので、観光ルートの確保や振動、騒音対策、環境対策がとても重要です。今後も関係者と連絡を取り合い、観光客への配慮や対策をしっかりと行っていきたいと思ひます。

3. 汚濁防止設備の撤去等

濁水対策として谷後地区取水堰に設置していた「やしマット」は、冬期の工事休止期間中にフィルターが詰まる恐れがあるため、12月14日に撤去しました。

湖水の濁りを防止するため設置していた汚濁防止フェンスについても、フェンス内の濁りがなくなるのを待ち一旦撤去する予定です。



谷後取水堰堤撤去状況



谷後取水堰堤撤去完了



汚濁防止フェンス

4. 冬期の現場体制について

今年度の工事が完了し、12月末に現場の機械、資材を撤去しました。また、現場周辺のバリケード、看板類等も積雪による破損防止のため撤去しました。3月の工事再開時に再設置する予定です。

冬期休止期間中は、棧橋進入路手前及び工事用道路出入口はロープ柵等で立入禁止措置を行います。また、現場内で異常がないか現場パトロールを定期的に行うこととしています。

旭原の作業所も冬期間は撤去していますが、お問い合わせ等がございましたら、下記までご連絡をお願い致します。

佐藤工業(株) 横川(よこかわ) 025-775-7948



工事現場の様子

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧ください。
アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ	国土交通省湯沢砂防事務所(建設監督官)	TEL 025(784)2254
	佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所	TEL 025(775)7948
