

# 平成27年度 安全管理優良受注者 株式会社 明翫組

平成26年度 完成工事  
金沢港(大野地区)防波堤(西)嵩上工事



# 1.完成工事の概要

本工事は、金沢港(大野地区)防波堤(西)の嵩上工及び仮設工を施工するものである。


工種	種別	細別	数量
嵩上工	嵩上コンクリート工	型枠	548m <sup>2</sup>
		コンクリート	1276m <sup>3</sup>
		H形鋼	344本
仮設工	仮設道路工		1式



コンクリート打設状況



型枠脱型状況

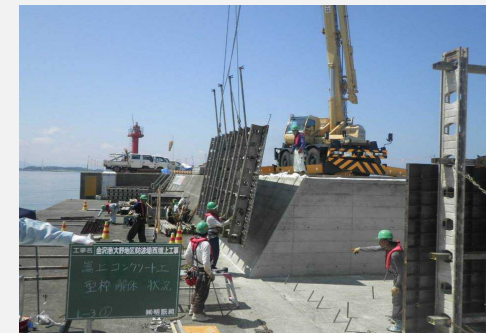

## 2. 社内の安全管理体制

### 社内安全パトロール



- ・月3回の頻度でパトロールを実施
- ・作業所は直ちに是正措置を行い、是正報告をする

### 社内検討会



- ・顧客事項の確認、技術提案の履行方法の検討
- ・現場特性を考慮した施工・工程・安全管理の検討

### 社内安全大会・安全朝礼



- ・経営トップによる訓示、安全方針の再確認
- ・全社員が参加し、積極的な知識習得を図る

### 安全衛生大会(全社員参加)



- ・外部講師を招いての安全講話
- ・夏期期間における事故防止に対する知識を教育

### 安全衛生大会(全社員及び協力業者参加)



- ・労働安全コンサルタントによる安全講話
- ・優良な協力業者に感謝状贈呈

# 3. 工事現場における日々の安全活動

安全朝礼・KY活動の実施




- ・KY活動後、水分等摂取チェック表(熱中症予防)を作成して作業員の健康管理を行った

災害防止協議会(毎月1回)



- ・月間作業予定、作業連絡調整及び災害防止計画
- ・安全衛生管理に関する改善、要望事項を検討

熱中症防止対策

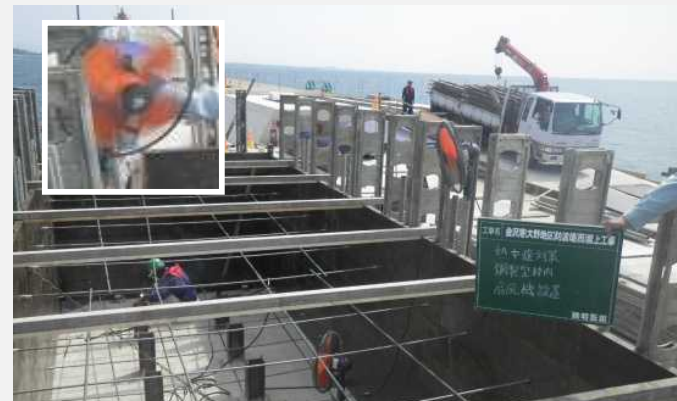

- ・鋼製型枠内の作業は無風状態となるため扇風機を2基設置して、一人作業を禁止した

連絡通路の端部・段差部の明示と整備



- ・端部にロープスティック、段差部カラーコーン設置
- ・段差部はコンクリートで擦付け、走行ラインを明示

H形鋼設置時にクッション材取付



- ・H形鋼のエッジ部(角)は鋭利なため、万が一衝突した場合の安全対策としてクッション材を取付けた

作業員の足落とし防止対策



- ・箱抜き部(300-深さ500mm)の転落防止対策
- ・作業エリアの箱抜き部はプラ敷き板を設置した

# 4.安全教育の充実

## 現場での安全教育・訓練(毎月)



- ・ プロジェクターを使用した安全ビデオの上映
- ・ 熱中症災害を防止するため、知識を習得している



- ・ 実施訓練により避難場所・経路を作業員へ周知
- ・ 地震・津波時の発生を想定した避難訓練を実施した




## 新規入場者教育



- ・ 救命胴衣投入訓練
- ・ 墜落・転落災害時を想定した救助訓練を実施した



- ・ 新規入場者パンフレットで現場特有の事項を周知
- ・ 健康状態を確認し、熱中症予防チェックシート記入

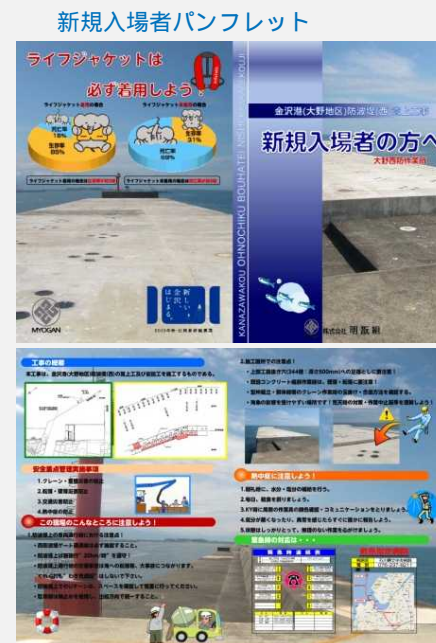

# 5. その他の顕著な活動

## 安全管理に関する社会的貢献等

一般社団法人 石川県建設業協会 副会長  
一般社団法人 金沢建設業協会 理事  
建設業労働災害防止協会 石川支部金沢分会 監事  
その他県、市の災害応急活動に参加

## ボランティア活動

クリーン・ビーチいしかわinかなざわ  
新幹線おもてなし大作戦  
大雨(浸水害)・洪水警報発表時パトロール  
地域清掃奉仕

## クリーン・ビーチ in かなざわへの参加



- ・石川県の海岸線583kmを守る海岸愛護運動に参加
- ・重機(クローラードンプ・タイヤローダー)を出動

## 就業体験学習(毎年8月)



- ・金沢市立工業高等学校の就業体験学習(2名)

## 大雨・洪水警報発表時パトロール



- ・大雨警報発令時、会社周辺地域の用水及び道路のパトロールへ出動

## まちなか一斉美化清掃



- ・地域清掃奉仕として金沢市内における清掃活動実施
