




関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所
〈第15号〉 令和 元年10月

「関川砂防通信」第15号をお届けします。

- 現在、昨年度までに契約した5件の砂防工事を推進しています。
- 工事の進捗状況は次ページに掲載しています。
- 次号は12月上旬に発行する予定です。

飯豊山系砂防事務所管内図

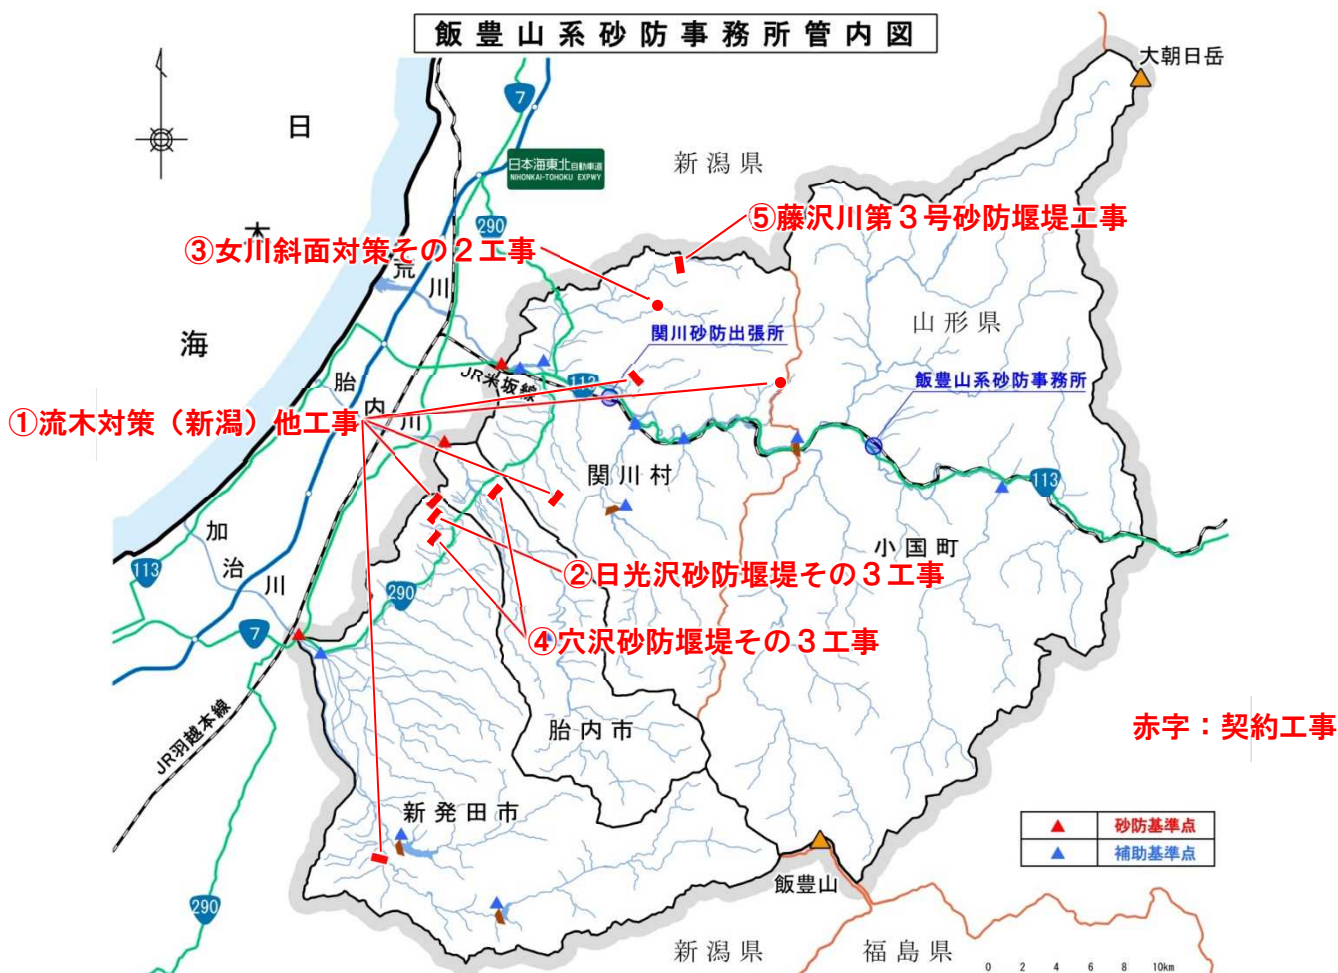

番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
①	流木対策（新潟）他工事	（株）小野組	H30. 8. 10～R 1. 12. 13	流木対策（シノ沢、イノ沢、黒俣川、吹ノ沢） 砂防堰堤（杉ノ沢）
②	日光沢砂防堰堤その3工事	新発田建設（株）	H31. 3. 9～R 2. 1. 24	砂防堰堤
③	女川斜面对策その2工事	グリーン産業（株）	H31. 3. 20～R 1. 11. 29	斜面对策
④	穴沢砂防堰堤その3工事	（株）伊藤組	H31. 3. 26～R 1. 12. 20	砂防堰堤（穴沢、沢ノ入）
⑤	藤沢川第3号砂防堰堤工事	（株）加藤組	H31. 3. 26～R 1. 12. 20	砂防堰堤

発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025



① 流木対策（新潟）他工事：（株）小野組

新発田市溝足地先（シバクラ沢砂防堰堤、イモノマ沢砂防堰堤）、胎内市黒俣地先（黒俣川砂防堰堤）、関川村滝原地先（吹ノ沢砂防堰堤）において、流木対策工を整備しています。また、新発田市上赤谷地先（杉ノ沢）において、砂防堰堤（2期工事）を整備しています。

シバクラ沢砂防堰堤 平成30年11月下旬に流木対策工の整備が完了しました。

イモノマ沢砂防堰堤 令和元年6月下旬に流木対策工の整備が完了しました。

黒俣川砂防堰堤 平成30年12月下旬に流木対策工の整備が完了しました。

吹ノ沢砂防堰堤 平成30年12月下旬に流木対策工の整備が完了しました。

杉ノ沢砂防堰堤 **【緊急3カ年対策】**



現在、掘削工事をしています。

② 日光沢砂防堰堤その3工事 : 新発田建設(株)

【緊急3カ年対策】

新発田市下中山地先の加治川水系坂井川支溪日光沢において、砂防堰堤(2期工事)を整備しています。




日光沢砂防堰堤(2期工事) 護岸工整備状況
(令和 元年 9月末現在)

現在、堰堤下流側の護岸工をしています。

③ 女川斜面对策その2工事 : グリーン産業(株)

【緊急3カ年対策】

岩船郡関川村小和田地先の右岸側管理用道路(女川林道)において、斜面对策工を整備しています。

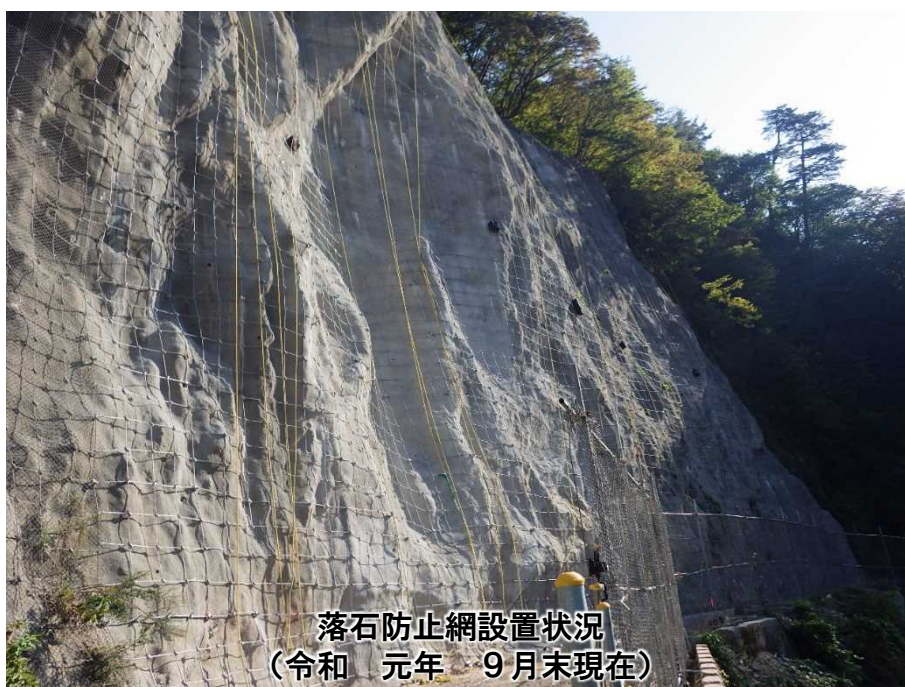

落石防止網設置状況
(令和 元年 9月末現在)

現在、斜面に落石防止網を設置しています。

④ 穴沢砂防堰堤その3工事 : (株)伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢において、第1号砂防堰堤を整備しています。また、胎内市夏井地先の沢ノ入砂防堰堤（長寿命化）を整備しています。

第1号穴沢砂防堰堤

【緊急3カ年対策】



現在、堰堤コンクリートを打設しています。

沢ノ入砂防堰堤



現在、準備（工食用道路整備等）工事をしています。

⑤ 藤沢川第3号砂防堰堤工事 : (株)加藤組

【緊急3カ年対策】

岩船郡関川村中東地先の藤沢川において、第3号砂防堰堤を整備しています。



現在、準備（伐採等）工事をしています。

【緊急3カ年対策】とは

近年激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している状況から、総理大臣からの指示を受け、とりまとめられた「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」等を踏まえ、特に緊急に実施すべき対策として、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が、閣議決定されました。

国土交通省では、所管する分野において、総点検の結果や得られた教訓等を踏まえ、ソフト・ハードの両面から集中的に取り組んでいます。

<国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo01_hh_000028.html>
