

平成23年7月細砂通過放流（第3回）
の実施経過について（速報）


平成23年7月5日

連携排砂実施機関
国土交通省北陸地方整備局
関西電力(株)北陸支社


細砂通過放流（第3回）実施の経過

日	時	出し平ダム	宇奈月ダム	備考
7月4日	4:00	予備体制入り		富山県東部北大雨洪水注意報発令
	17:43	第3回細砂通過放流実施（連携通砂準備）体制入り（ $Q_{in} = 300\text{m}^3/\text{s}$ ）		出し平ダム $Q_{in} = 301.7\text{m}^3/\text{s}$
		連携排砂実施機関発足		
	18:31	ピーク流入量確認（ $Q_p = 370.0\text{m}^3/\text{s}$ ）	-	
	19:23	-	ピーク流入量確認（ $Q_p = 456.6\text{m}^3/\text{s}$ ）	
	21:31	-	水位低下用ゲート開操作開始	
	21:47	連携排砂連絡調整本部発足		
22:43	排砂ゲート開操作開始	-		
7月5日	0:40	排砂ゲート閉操作開始	-	
	0:43	排砂ゲート全閉	-	
	3:43	-	水位低下用ゲート閉操作開始	出し平ダム排砂ゲート全閉から約3時間経過
	4:00	-	水位低下用ゲート全閉	
連携排砂実施機関・連携排砂連絡調整本部解散				

出し平ダム水文データ

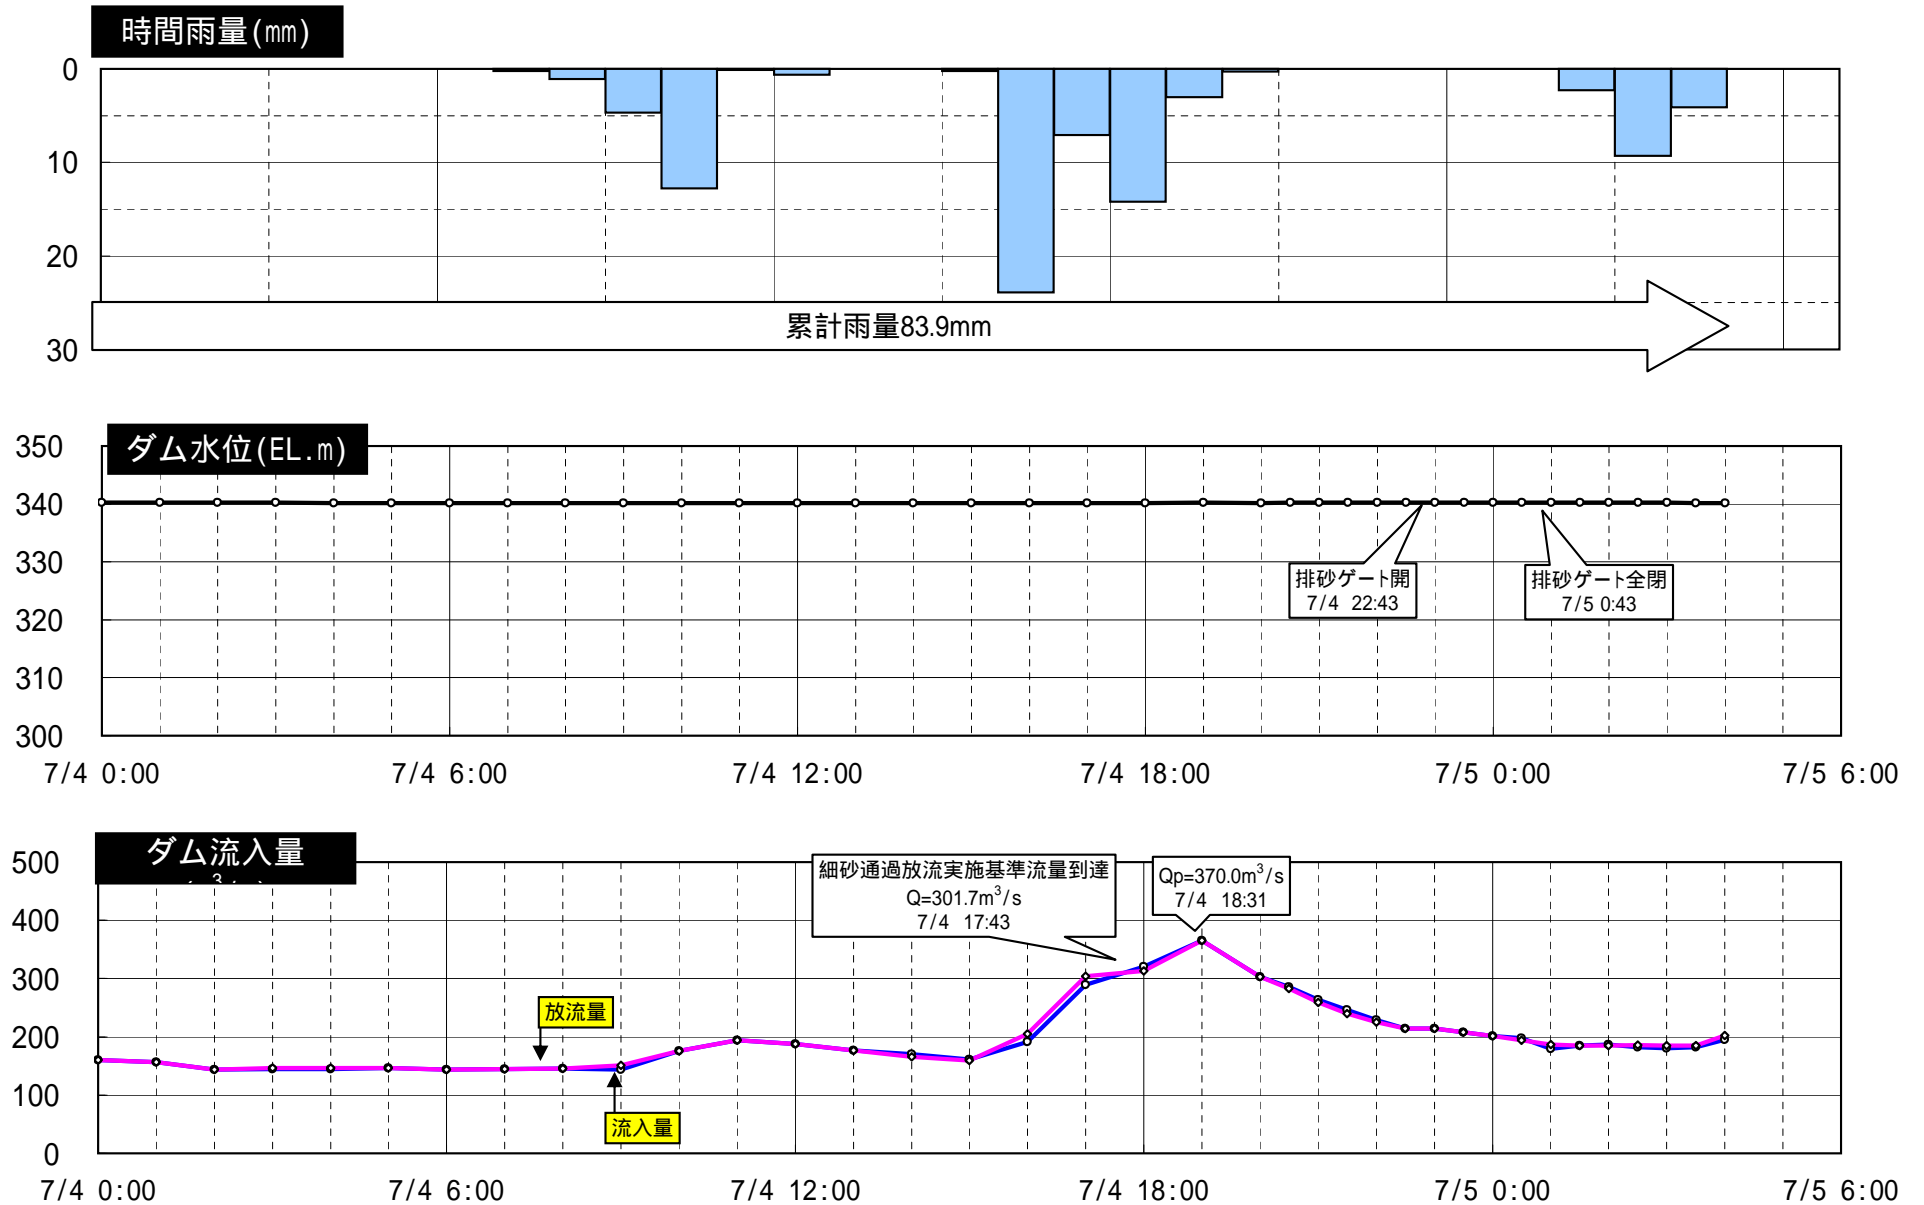

宇奈月ダム水文データ

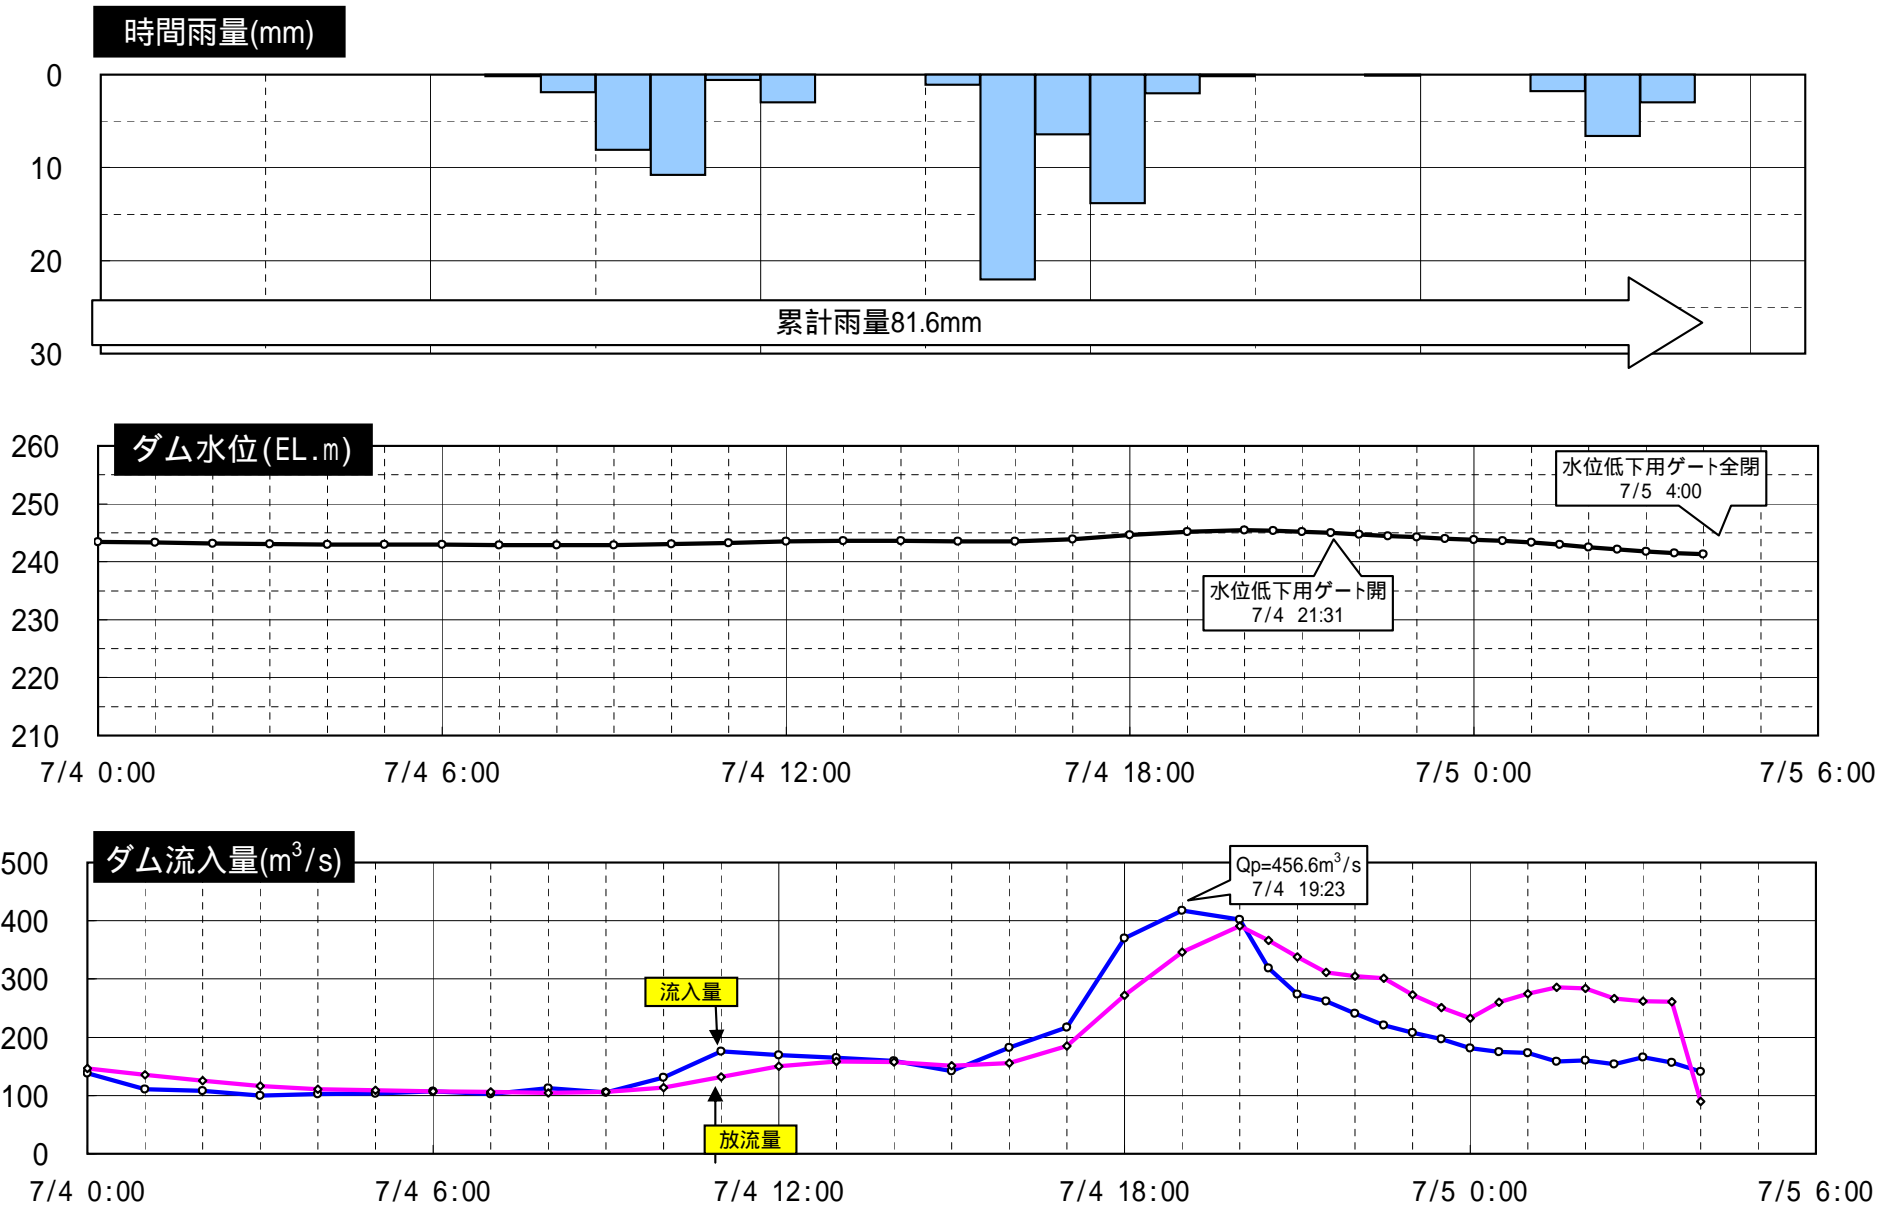

2. 細砂通過放流の状況（両ダム水位の模式図）

