


宇奈月ダム運用開始以降における 連携排砂実施時等の宇奈月ダム最大流入量比較


今年の連携排砂は、実施規模としては、排砂・通砂・細砂通過放流等の実施洪水の中で一番小さい出水での実施となった。

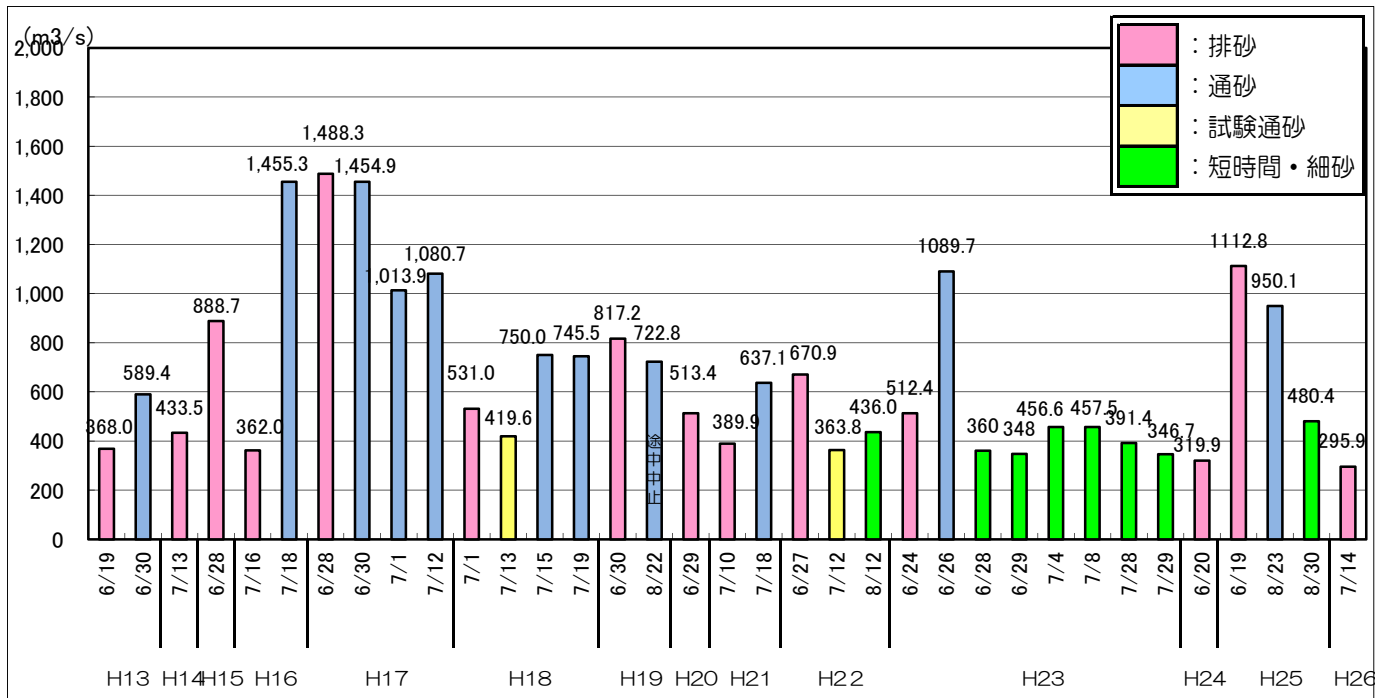

年度	日 時	宇奈月ダム流入量 (m ³ /s)	順 位	区 分
H13	6月19日 17:06	368.0	28	排砂
	6月30日 17:37	589.4	16	通砂
H14	7月13日 21:10	433.5	24	排砂
H15	6月28日 10:25	888.7	9	排砂
H16	7月16日 22:18	362.0	30	排砂
	7月18日 3:12	1,455.3	2	通砂
H17	6月28日 17:32	1,488.3	1	排砂
	6月30日 5:40	1,454.9	3	通砂
	7月1日 19:37	1,013.9	7	通砂
	7月12日 7:28	1,080.7	6	通砂
H18	7月1日 6:23	531.0	17	排砂
	7月13日 18:31	419.6	25	試験通砂
	7月15日 20:40	750.0	11	通砂
	7月19日 2:43	745.5	12	通砂
H19	6月30日 0:30	817.2	10	排砂
	8月22日 19:58	722.8	13	通砂【途中で作業中止】
H20	6月29日 13:45	513.4	18	排砂
H21	7月10日 13:57	389.9	27	排砂
	7月18日 11:57	637.1	15	通砂
H22	6月27日 20:53	670.9	14	排砂
	7月12日 7:51	363.8	29	試験通砂
	8月12日 16:47	436.0	23	短時間
H23	6月24日 21:57	512.4	19	排砂
	6月26日 10:00	1,089.7	5	通砂
	6月28日 6:59	360.0	31	細砂通過
	6月29日 2:46	348.0	32	細砂通過
	7月4日 19:23	456.6	22	細砂通過
	7月8日 3:03	457.5	21	細砂通過
	7月28日 7:58	391.4	26	細砂通過
7月29日 10:01	346.7	33	細砂通過	
H24	6月20日 4:29	319.9	34	排砂
H25	6月19日 12:41	1,112.8	4	排砂
	8月23日 15:44	950.1	8	通砂
	8月30日 16:55	480.4	20	細砂通過
H26	7月14日 2:08	295.9	35	排砂

連携排砂時等における愛本合口堰堤取水停止時間

連携排砂・通砂による愛本合口堰堤の取水停止時間は平成13年度からの連携排砂・通砂の
以来、過去21回で8番目に短く、41時間05分で終了（H19通砂を除く）

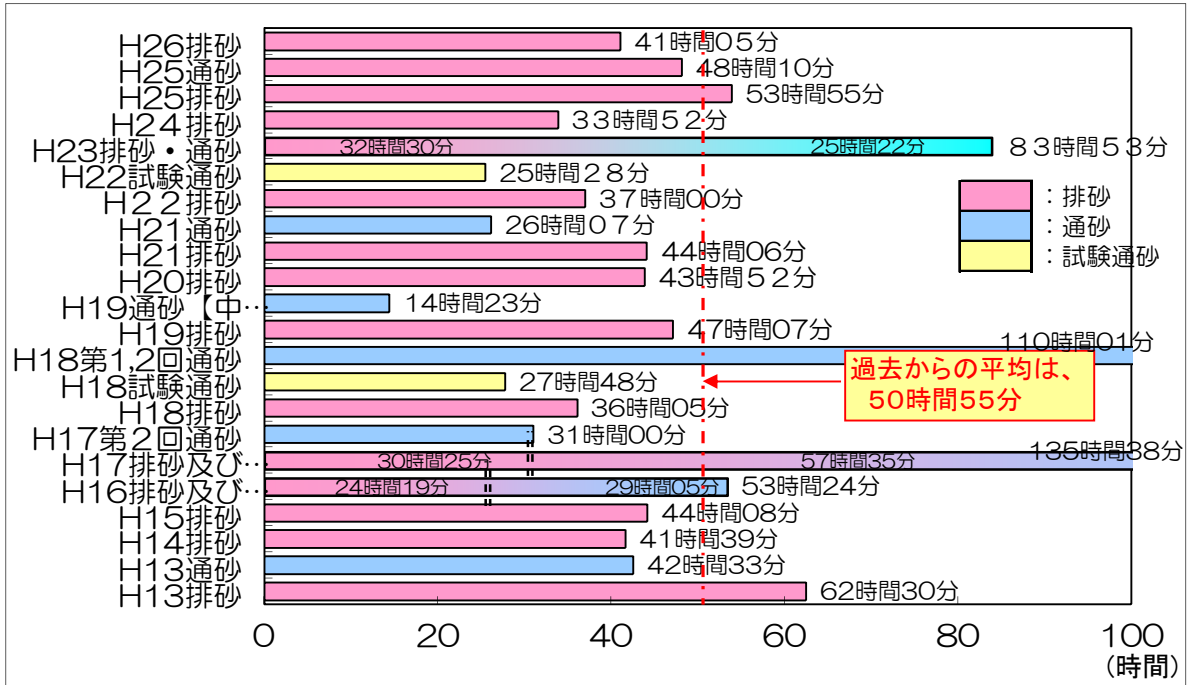

	取水停止時間	備考
H26排砂	41時間05分	
H25通砂	48時間10分	
H25排砂	53時間55分	
H24排砂	33時間52分	排砂後の措置中、中止
H23排砂及び通砂	83時間53分	
H22試験通砂	25時間28分	
H22排砂	37時間00分	
H21通砂	26時間07分	
H21排砂	44時間06分	
H20排砂	43時間52分	
H19通砂	14時間23分	途中で通砂作業中止
H19排砂	47時間07分	
H18第1回及び第2回通砂	110時間01分	
H18試験通砂	27時間48分	
H18排砂	36時間05分	
H17第2回通砂	31時間00分	
H17排砂及び通砂	135時間38分	一時取水再開有
H16排砂及び通砂	53時間24分	
H15排砂	44時間08分	
H14排砂	41時間39分	
H13通砂	42時間33分	
H13排砂	62時間30分	
