


## 連携排砂等を含む洪水における愛本合口堰堤取水停止時間

令和4年度の連携排砂は途中で中止となった。  
 愛本合口堰堤の取水停止時間の長さは18時間30分であり、平成13年度からの連携排砂・通砂の開始以来では過去2番目に短い停止時間となった。  
 令和3年度に引き続き、Twitterや黒部河川事務所ホームページにより、停止や再開に関する情報発信をおこなった。

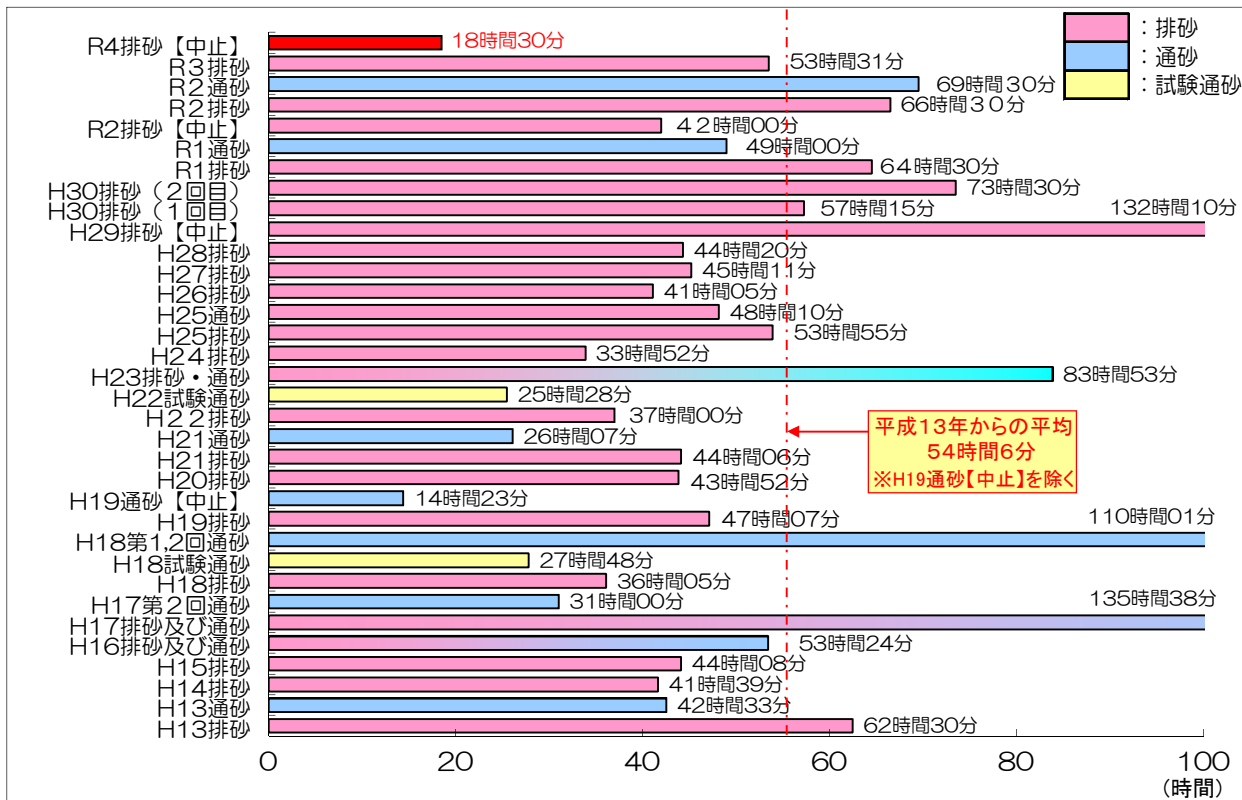

	取水停止時間	備考
R4排砂【中止】	18時間30分	水位低下中に中止
R3排砂	53時間31分	
R2通砂	69時間30分	
R2排砂	66時間30分	
R2排砂【中止】	42時間00分	水位低下中に中止
R1通砂	49時間00分	
R1排砂	64時間30分	
H30排砂(2回目)	73時間30分	
H30排砂(1回目)	57時間15分	
H29排砂【中止】	132時間10分	途中で排砂作業中止
H28排砂	44時間20分	
H27排砂	45時間11分	
H26排砂	41時間05分	
H25通砂	48時間10分	
H25排砂	53時間55分	
H24排砂	33時間52分	排砂後の措置中、中止
H23排砂及び通砂	83時間53分	

	取水停止時間	備考
H22試験通砂	25時間28分	
H22排砂	37時間00分	
H21通砂	26時間07分	
H21排砂	44時間06分	
H20排砂	43時間52分	
H19通砂	14時間23分	途中で通砂作業中止
H19排砂	47時間07分	
H18第1回及び第2回通砂	110時間01分	
H18試験通砂	27時間48分	
H18排砂	36時間05分	
H17第2回通砂	31時間00分	
H17排砂及び通砂	135時間38分	一時取水再開有
H16排砂及び通砂	53時間24分	
H15排砂	44時間08分	
H14排砂	41時間39分	
H13通砂	42時間33分	
H13排砂	62時間30分	

※上記の取水停止時間は、連携排砂等を実施する前段の洪水における取水停止からカウントしているものである。
