

高瀬川出張所だより

令和3年11月号

寄沢砂防堰堤補強その4工事

着手前



11月末




- 施工会社
金森建設株式会社
- 工期
令和3年5月10日
～令和4年3月31日
- 概略 工事内容
 - ・ 盛土工 V=10200m³
 - ・ 巨石張り(練) 14989個
 - ・ 法面工 870m²

本工事は土砂災害を防止するため、寄沢砂防堰堤の上流左岸側の県道扇沢線沿いに、施工延長200m、法長約15mの護岸に巨石張りをを行う工事です。

12月より、扇沢線は冬季の安全対策のため通行規制が開始となります。作業員一同、今まで以上に気を引き締め、無事に工事を完了できるよう尽力してまいります。

現場での安全の工夫

公衆災害防止

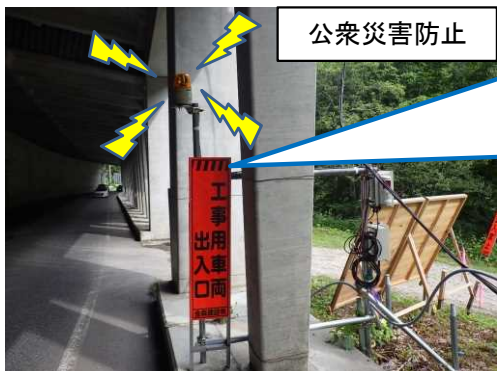

工事車両が県道へ出る際、回転灯とサイレンで一般車両に周知する事で、スノーシェッド内での事故を防止。

背負い型バイブレーターの使用。巨石上での作業において、配線等でのつまづき転倒を防止。



転倒事故防止
