

令和6年能登半島地震

道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議(第5回)

日時: 令和6年9月6日(金) 15:00～

場所: WEB 会議形式

次 第

1. 開会
2. 座長挨拶
3. 議事

(1) 各路線の復旧状況共有

(2) 道路復旧に関わる課題への対応

(3) その他

4. 閉会

-
- 資料－1 出席者名簿
 - 資料－2 道路復旧、通行止め解除の変遷について
 - 資料－3 復旧・復興に向けた道路ネットワーク図
 - 資料－4 道路の復旧状況について
 - 資料－5 道路の復旧状況

令和６年能登半島地震
道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議（第５回）

出席者名簿

（敬称略）

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	竹林 秀基	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	
【石川県】			
土木部	土木部長	桜井 亘	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	別途説明
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	別途説明
七尾市	建設部長	三野 助樹	代理：建設課 課長補佐 鷹合 豊勝
能登町	建設水道課長	鏡島 敏雄	
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	
志賀町	まち整備課長	山内 勉	代理：まち整備課 課長補佐 浜辺 淳成

【事務局】

北陸地方整備局 地域道路課

金沢河川国道事務所

能登復興事務所

石川県土木部 道路建設課

道路整備課

連絡調整会議	県管理道路	市道・町道
第3回 (6月末時点)	○通行止め43箇所(3箇所解消済)のうち、道路ネットワークをつなげ、地域の復興を加速化させるため、<u>20箇所程度</u>について、令和6年8月末までに通行止め解除を目指す	○特に地域の復興を加速化させるため、下記3箇所について、令和6年8月末までに通行止め解除を目指す ①珠洲市道290号線(浄水場アクセス) ②珠洲市道741号線(最終処分地アクセス) ③能登町道上滝之坊1号線(集落へのアクセス)
第4回 (7月末時点)	○通行止め43箇所(4箇所解消済)のうち、8月中に<u>23箇所</u>通行止め解除の見込み 〔:お盆までに 8箇所 :8月末までに 15箇所〕 ⇒残り通行止め 16箇所 (大規模な地すべり箇所含む)	①珠洲市道290号線(浄水場アクセス) :7月31日通行止め解除 ※工事用道路整備による浄水場アクセス確保 ②珠洲市道741号線(最終処分地アクセス) :7月18日通行止め解除 ③能登町道上滝之坊1号線(集落へのアクセス) :7月19日通行止め解除
第5回 (8月末時点)	○通行止め43箇所(4箇所解消済)のうち、8月中に<u>25箇所</u>通行止め解除 〔:お盆までに 8箇所 :8月末までに 17箇所〕 ⇒残り通行止め 14箇所 (大規模な地すべり箇所含む) ○引き続き、通行止め箇所の復旧に努める	○引き続き、通行止め箇所の復旧に努める

資料-3

8月末現在



【完】 お盆までに通行止め解除 8箇所
【完】 8月末までに通行止め解除 17箇所




【完】(主)松任宇ノ気線 内灘町宮坂
【完】(主)松任宇ノ気線 かほく市大崎
【完】(一)高松内灘線 内灘町宮坂～かほく市大崎

◎◎：市役所・町役場・支所

奥能登2市2町の通れるマップ

令和6年8月30日時点

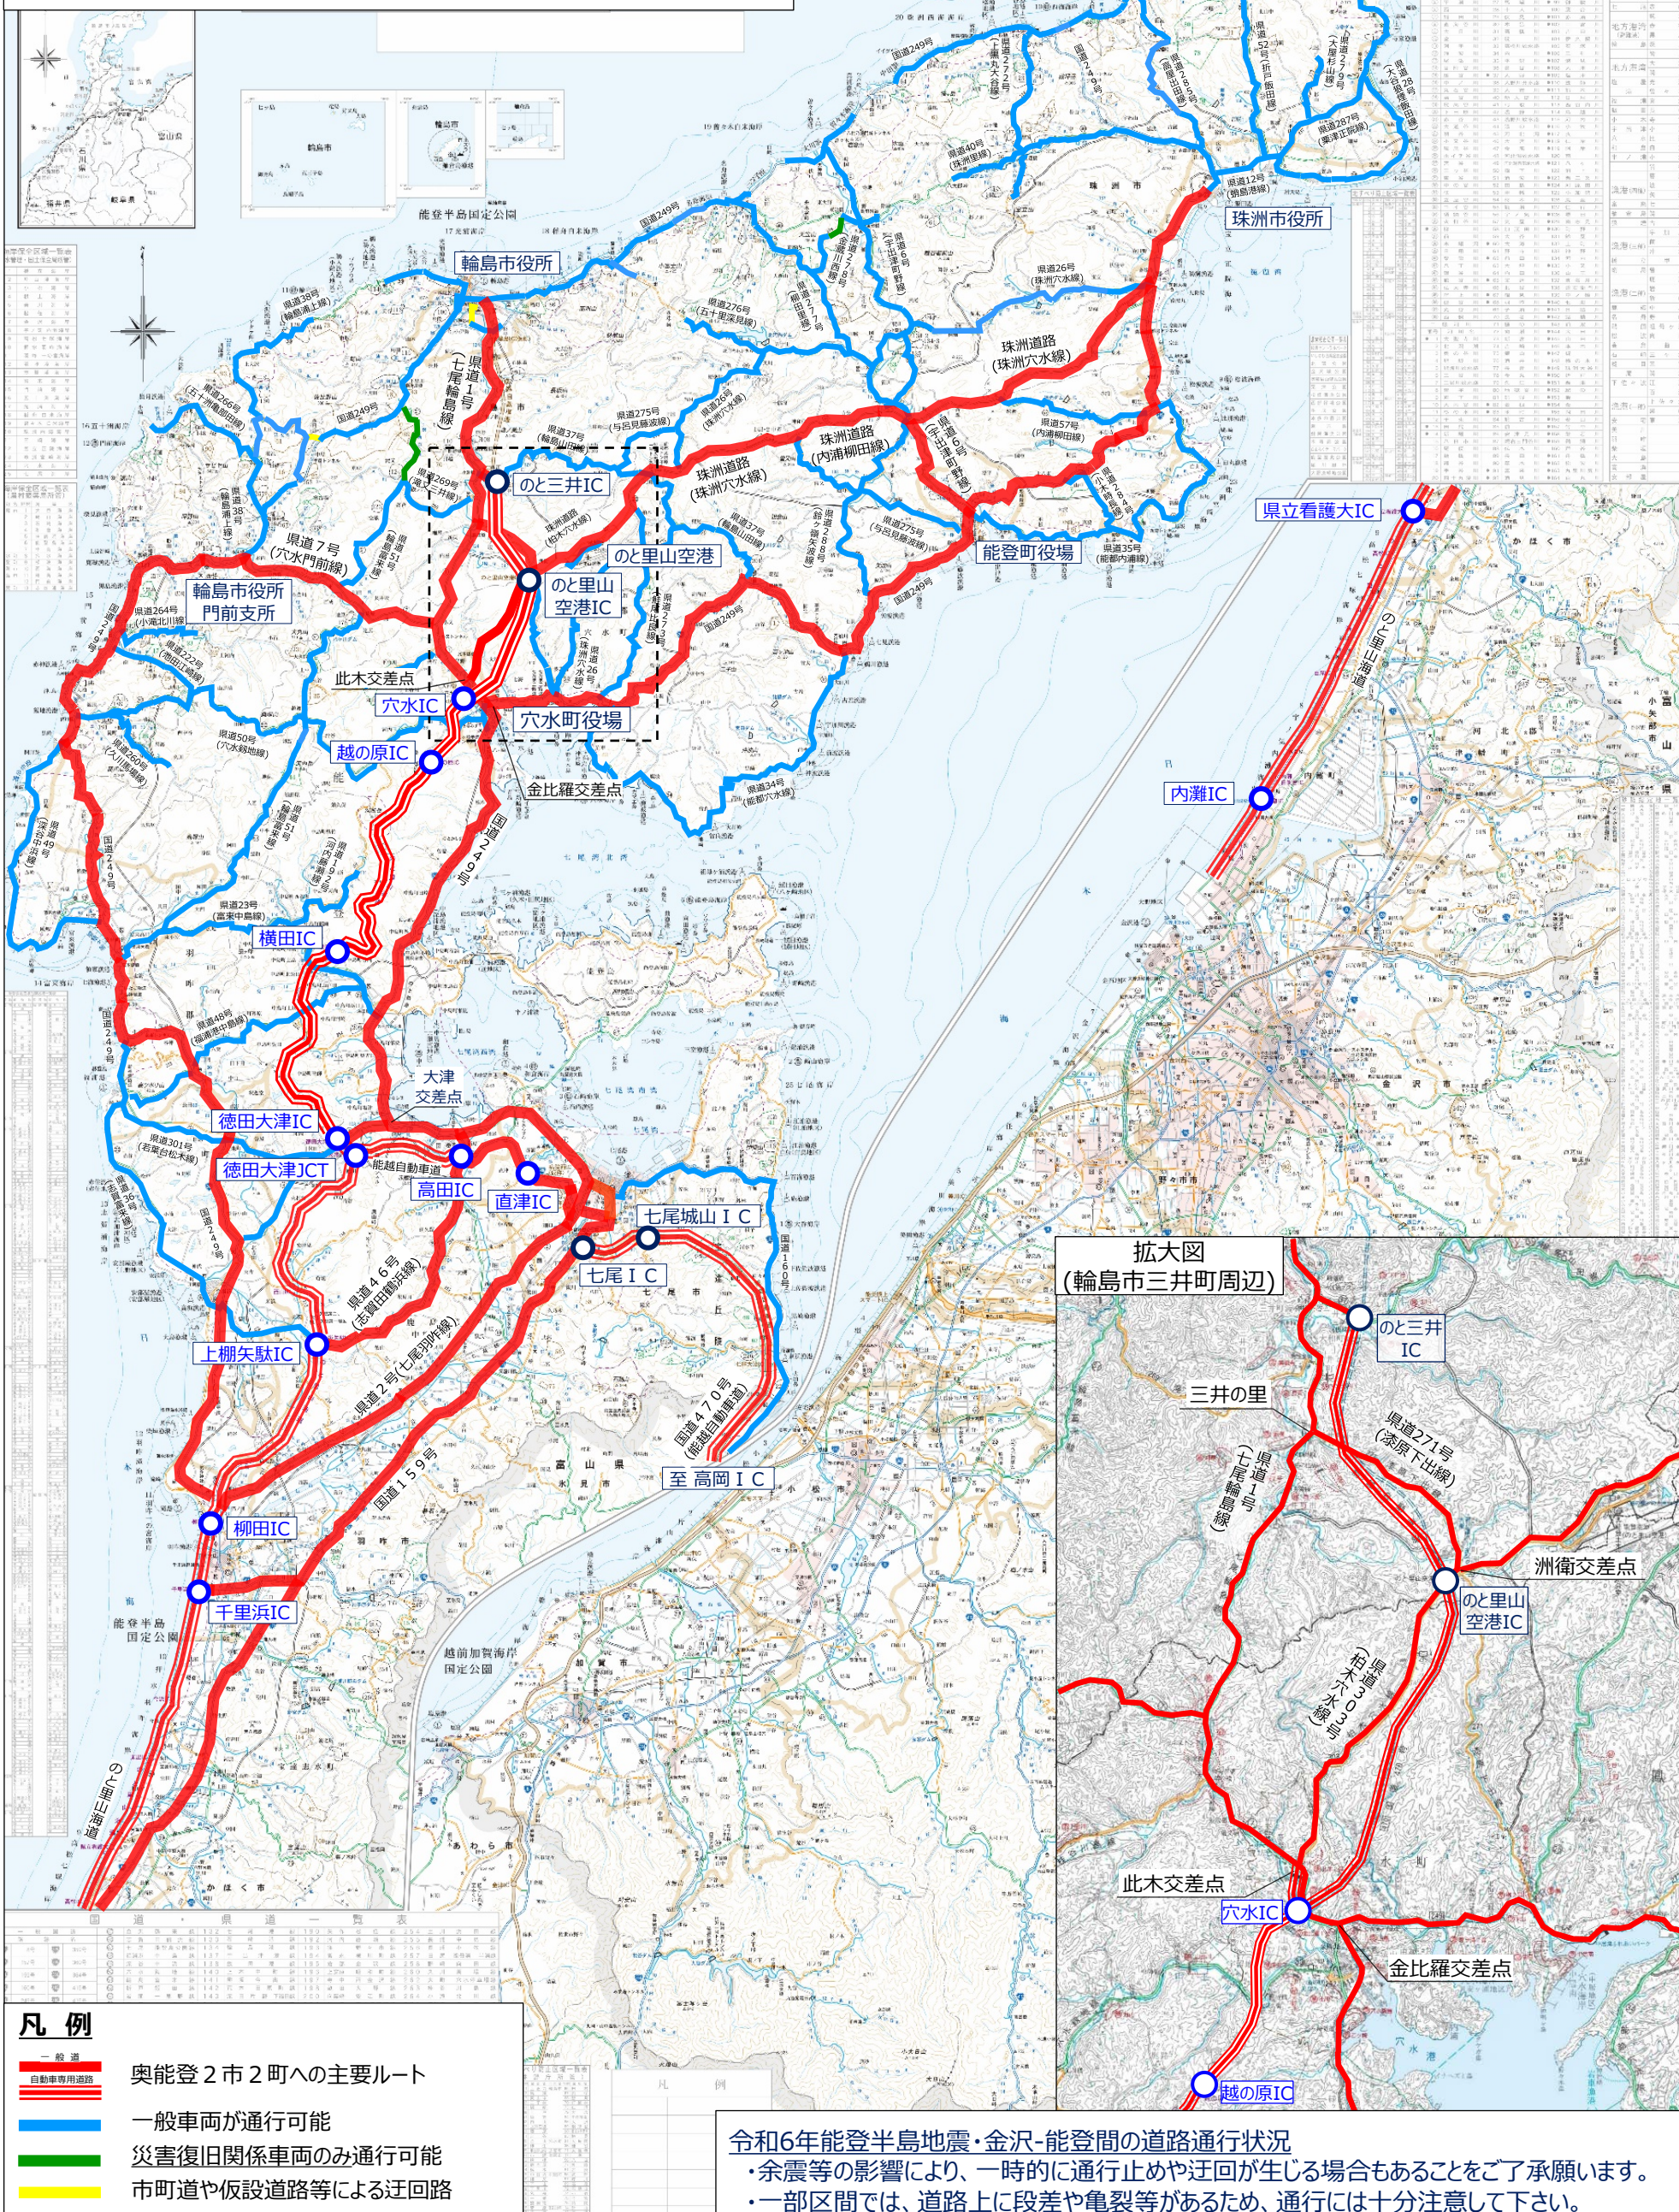


道路の復旧状況について

	発災直後	1月末	6月末	8月末	備考
通行止め箇所数					
県管理道路	87箇所	64箇所	40箇所	14箇所	
幹線市町道路等	多数	多数	約60箇所	約50箇所	
うち、集落(長期避難箇所を除く)、漁港、浄水場等にアクセスするための市町道路	多数	多数	3箇所	0箇所	
都市中心部と集落(長期避難箇所を除く)、漁港、浄水場等※1へのアクセス					
集落(長期避難箇所を除く)、漁港、浄水場等のうち、アクセス困難箇所数	約90箇所	約20箇所	3箇所	0箇所	設定全体拠点数 約900箇所
(アクセス率)	(約90%)	(約98%)	(約99%)	(100%)	
迂回率	—	1.63 (267km/164km)	1.62 (464km/287km)	1.34 (410km/306km)	距離迂回率

※1: 集落(長期避難箇所を除く)、漁港、浄水場、最終処分場

アクセス率＝到達可能拠点数/設定全体拠点数

迂回率＝B/A

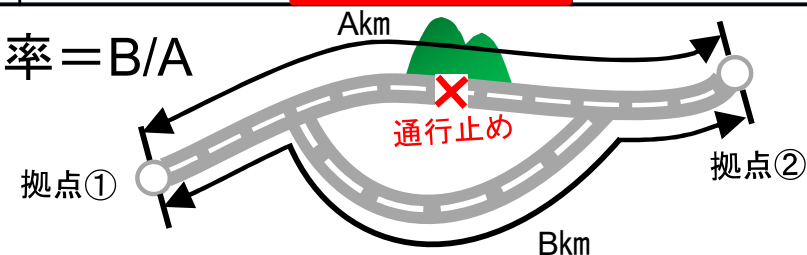

拠点①⇔②間がアクセス可能な路線で算出

道路の復旧状況

○県管理道路の通行止め等は順次解除され、8月末までに全ての集落（長期避難箇所を除く）・漁港・浄水場等※へのアクセスを確保

○令和6年内には国道249号沿岸部を經由した輪島（門前町）～^{わじま}珠洲間^{もんぜんまち}などの通行を確保

【8月末までに通行可能となる道路】



【大規模被災箇所の状況】

国道249号沿岸部

写真(1) 中屋トンネル工区
令和6年1月



令和6年7月



プロテクターにより
1車線通行確保予定(9月末)

写真(2) 千枚田工区
至 珠洲市



令和6年7月



海岸隆起部を活用し1車線通行確保

能越自動車道・のと里山海道

7月17日(水)に、能越自動車道・のと里山海道の能登大橋付近(穴水IC～越の原IC間)を除く全区間で対面通行確保(写真(3))

令和6年1月



令和6年7月



道路用地を活用し対面通行確保

・国道249号沿岸部①～④の具体的な通行確保時期、通行方法については、今後の復旧工事の進捗を踏まえ改めてお知らせします。

※約900箇所：集落（長期避難箇所を除く）、漁港、浄水場、最終処分場
