

国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月19日
10時30分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について(第9報) 緊急災害復旧工事の実施状況(No.1)

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事に着手しました。復旧内容は、堤防に亀裂が入り緩んだ部分の土砂を一時的に掘削除去し、再び築堤盛土(締固め)を行います。工事は24時間体制で実施し、全箇所を10日間で完了させる予定です。(緊急災害復旧工事の実施状況は表-1のとおり)


表-1 緊急災害復旧工事の実施状況(19日10:00現在)

工事箇所	工事の概要	進捗状況
1 燕市野中才地先(上流) (大河津分水路燕市側)	工事延長335m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去作業25m実施
2 燕市野中才地先(下流) (大河津分水路燕市側)	工事延長590m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去作業65m実施
3 長岡市町軽井地先 (信濃川旧寺泊町側)	工事延長350m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、	坂路部亀裂箇所掘削、盛土40m実施

	舗装撤去復旧、縁石撤去復旧 (県道は片側交互通行)
--	------------------------------

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

【問い合わせ先】 国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020 副所長 杉本 利英 調査第二課長 柳 正市

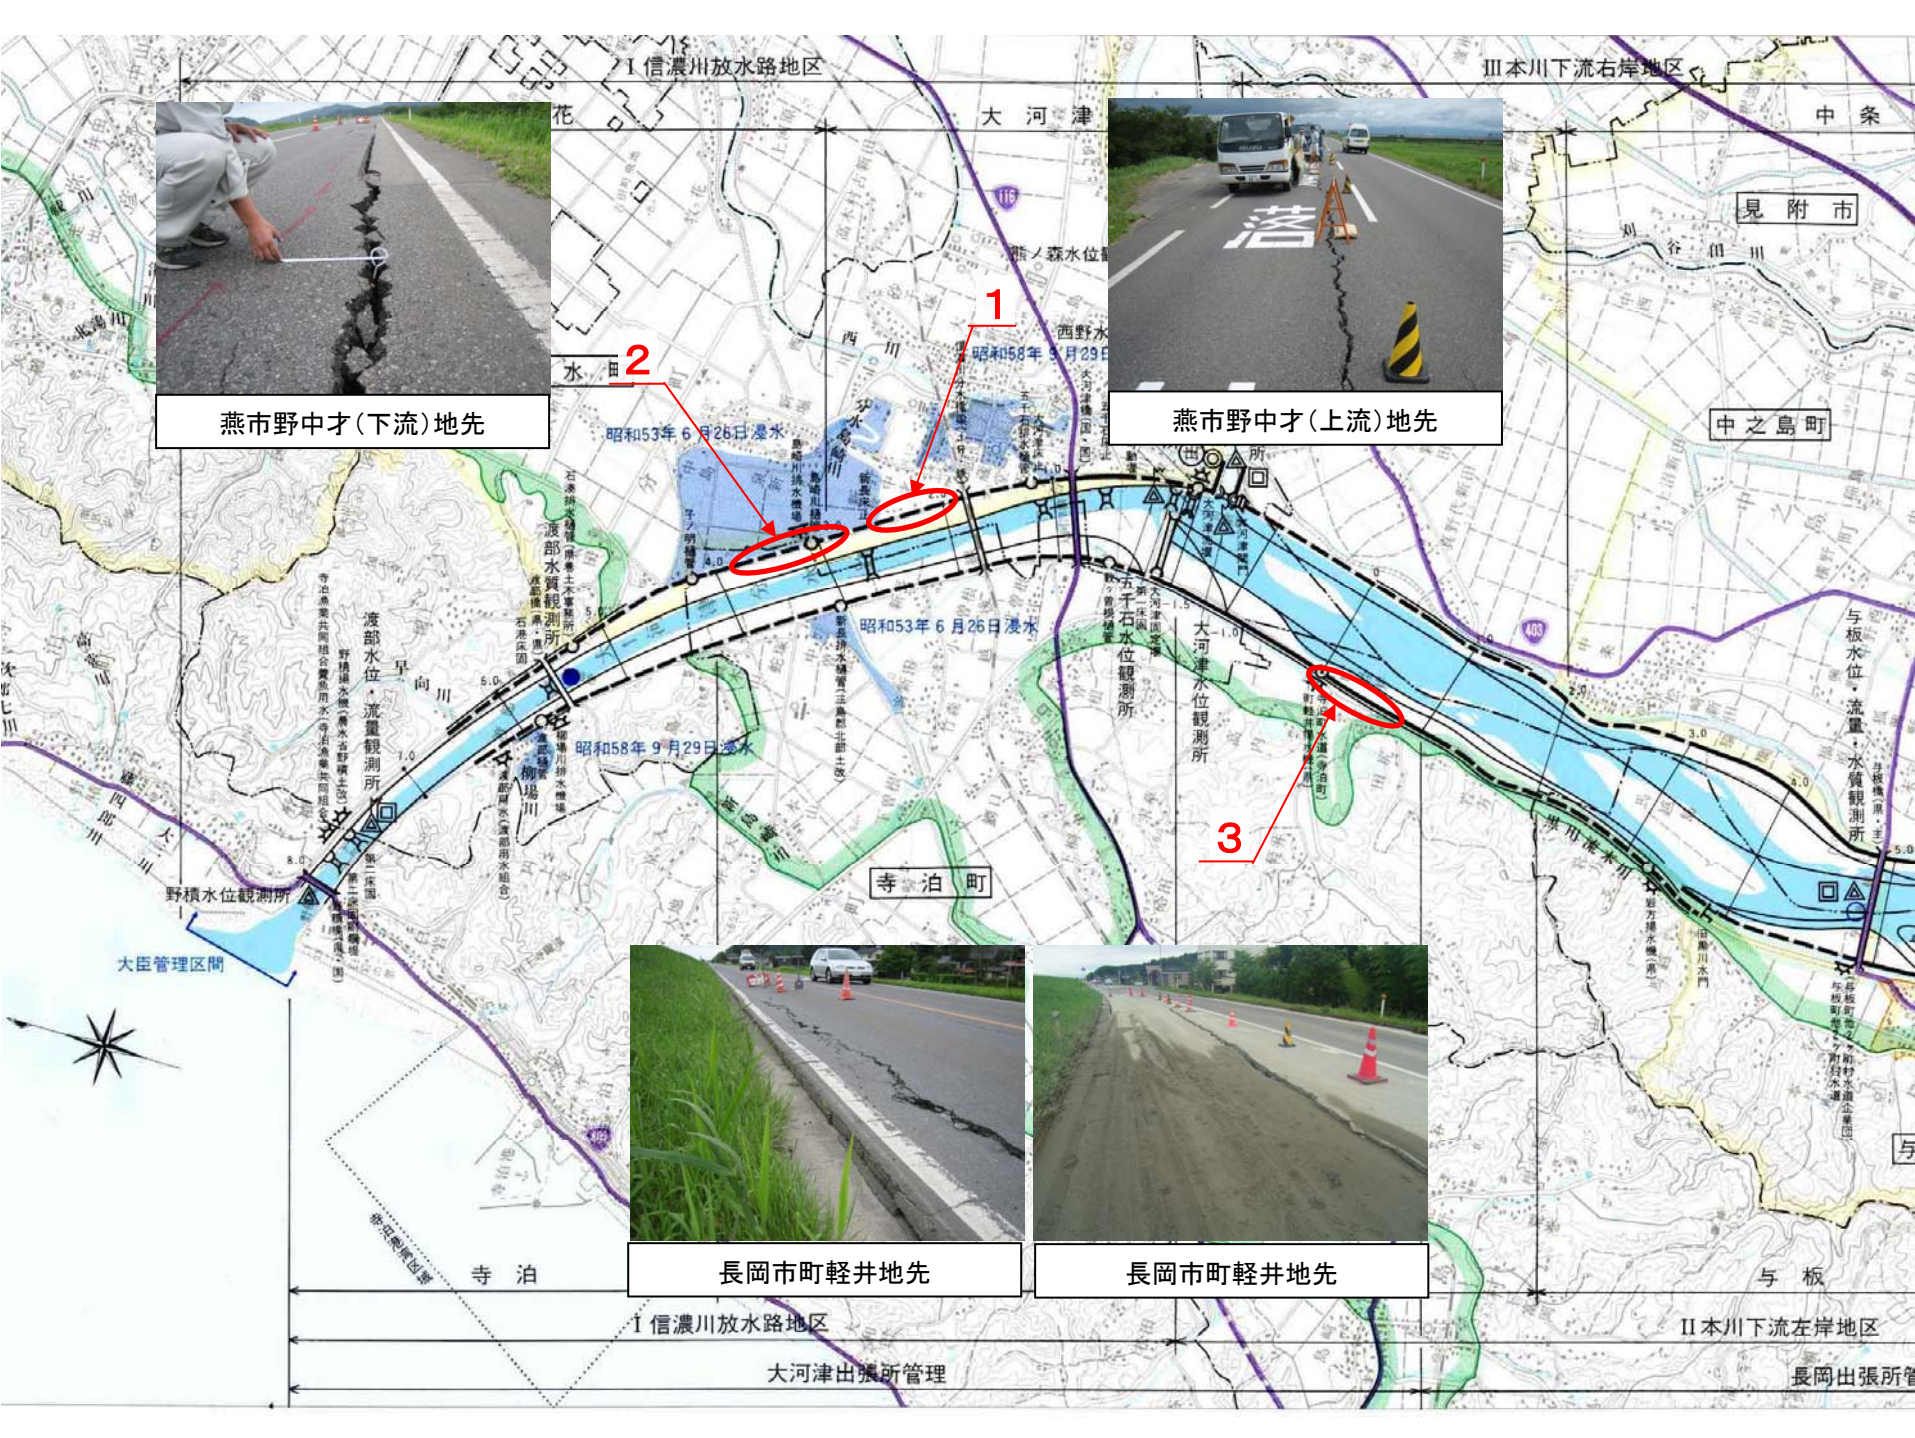

I 信濃川放水路地区

II 本川下流右岸地区



燕市野中才(下流)地先



燕市野中才(上流)地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先

I 信濃川放水路地区

II 本川下流左岸地区

大河津出張所管理

長岡出張所管
