

国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月21日
9時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について（第15報）
緊急災害復旧工事の実施状況（No.5）
堤防護岸の復旧にも着手します

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防及び堤防護岸に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事に着手しました。復旧内容は、堤防に亀裂が入り緩んだ部分の土砂を一時的に掘削除去し、再び築堤盛土（締固め）を行うと共に、新たに堤防護岸に沈下亀裂が生じた部分はジャカゴを設置します。工事は24時間体制で実施し、全箇所を10日間で完了させる予定です。（緊急災害復旧工事の実施状況は表-1のとおり）

表-1 緊急災害復旧工事の実施状況（21日8:00現在）

工事箇所		工事の概要	進捗状況
1	<small>のなかさい</small> 燕市野中才地先（上流） （大河津分水路燕市側）	工事延長335m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 （県道は全面通行止め）	舗装撤去 1,020m ² （完了） 掘削、築堤盛土 <u>135m</u> 【全体進捗率40%】
2	<small>のなかさい</small> 燕市野中才地先（下流） （大河津分水路燕市側）	工事延長590m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧	舗装撤去 828m ² 掘削、築堤盛土 <u>148m</u>

		(県道は全面通行止め)	<u>【全体進捗率 28%】</u>
3	長岡市町軽井地先 (信濃川旧寺泊町側)	工事延長 350m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧、縁石撤去復 旧 堤防護岸沈下亀裂箇所にじ ゃかご設置 (県道は片側交互通行)	坂路部掘削、盛土 <u>76m</u> 県道部掘削、盛土 <u>115m</u> " 舗装撤去 80m <u>【全体進捗率 35%】</u>


平成 19 年新潟県中越沖地震被害状況(第 4 報)をホームページに掲載しています

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

_____ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

【問い合わせ先】
国土交通省信濃川河川事務所 (電話) 0258-32-3020
副所長 杉本 利英
河川環境課長 稲川 貢

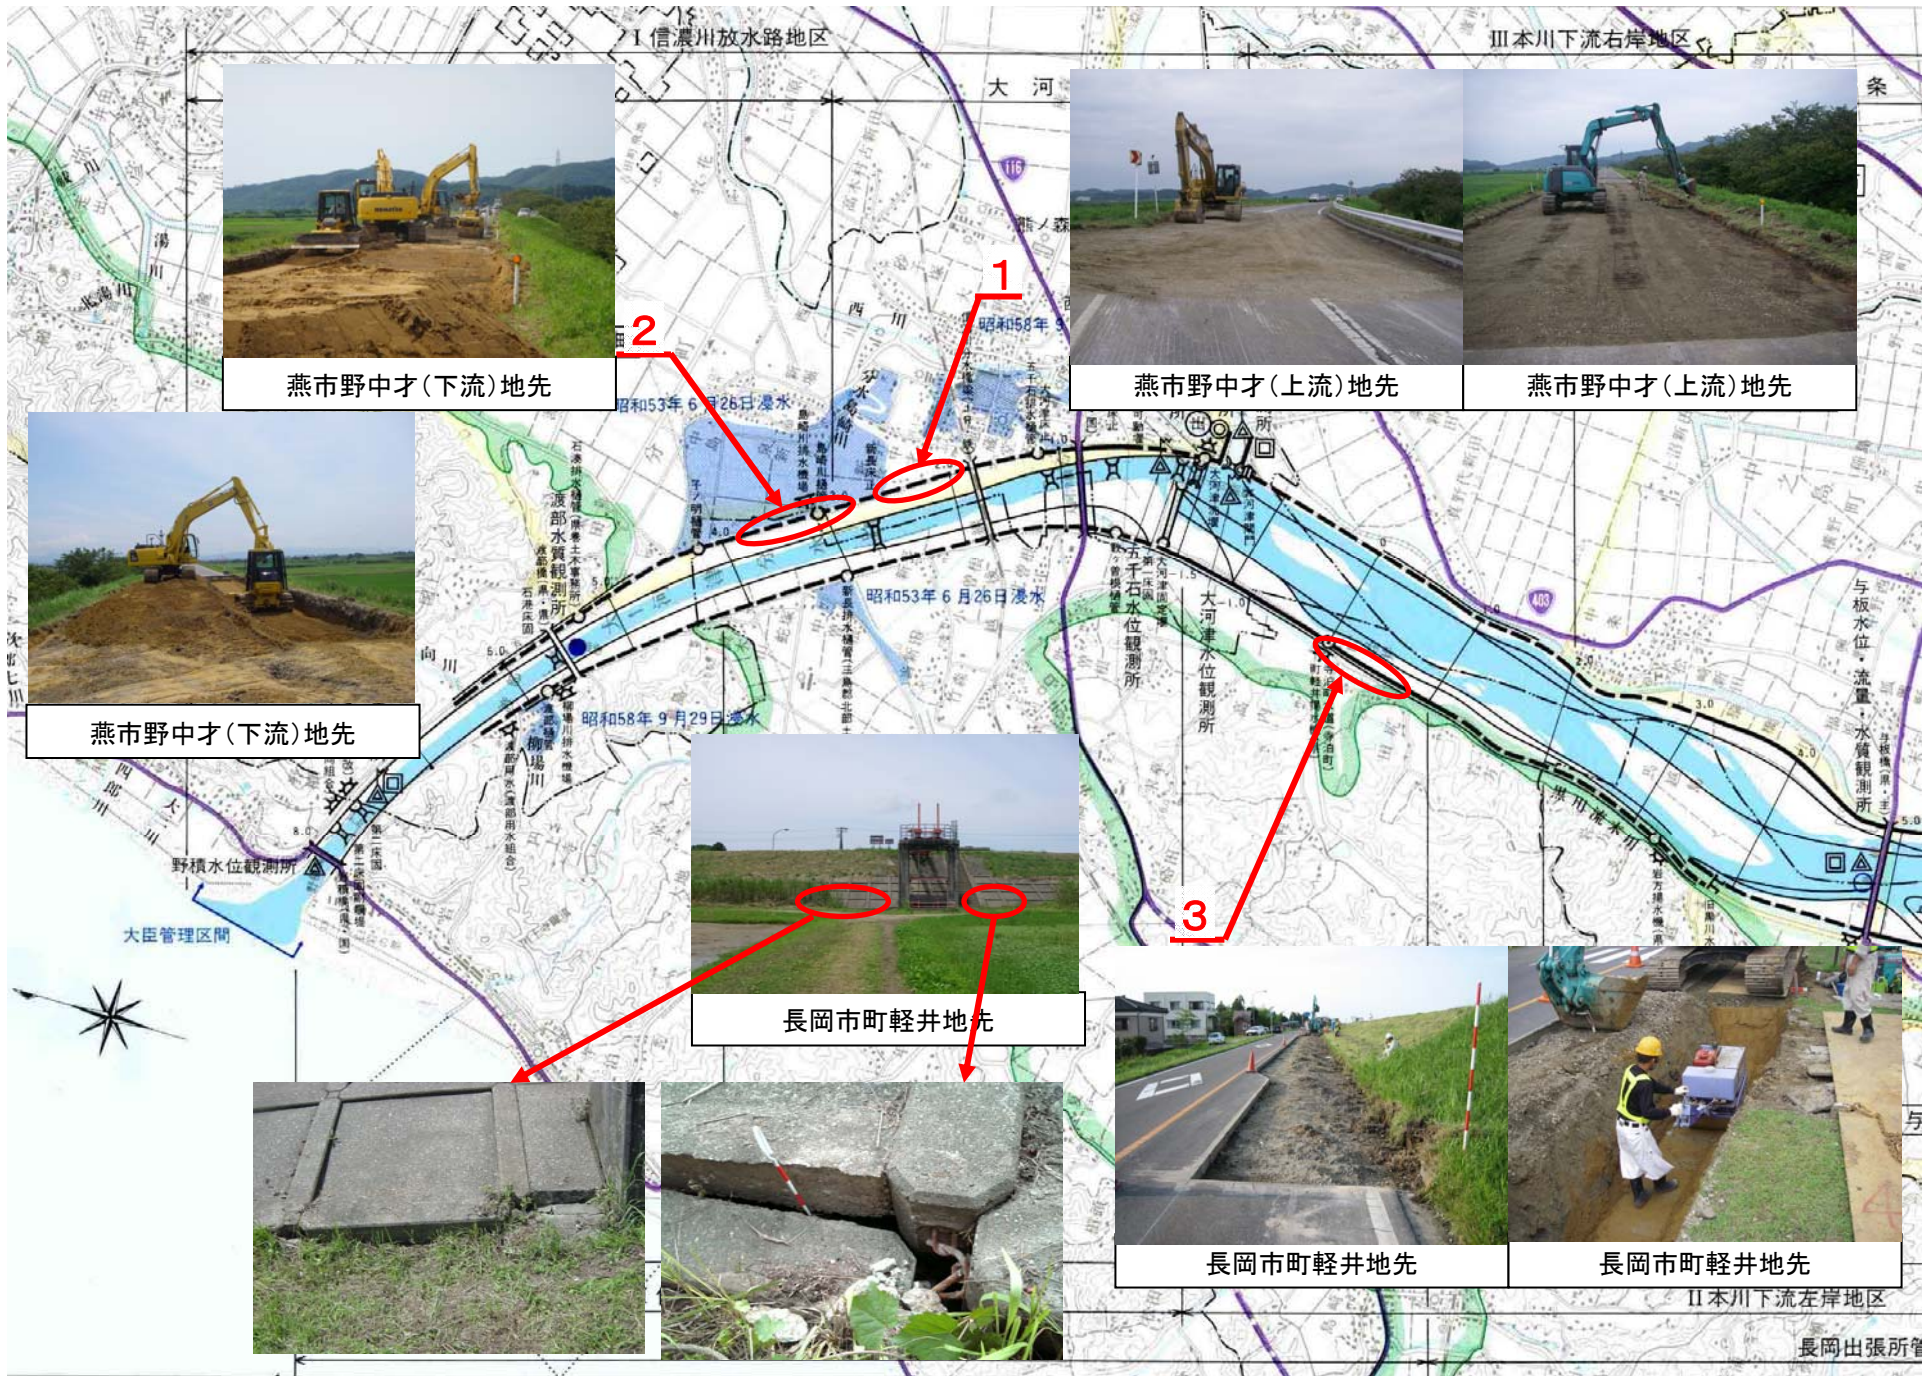

I 信濃川放水路地区

III 本川下流右岸地区

大河

条



燕市野中才(下流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(下流)地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先

II 本川下流左岸地区

長岡出張所
