



国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月21日
19時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について（第16報） 緊急災害復旧工事の実施状況（No.6）

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防及び堤防護岸に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事に着手しました。復旧内容は、堤防に亀裂が入り緩んだ部分の土砂を一時的に掘削除去し、再び築堤盛土（締固め）を行うと共に、新たに堤防護岸に沈下亀裂が生じた部分はジャカゴを設置します。工事は24時間体制で実施し、全箇所を10日間で完了させる予定です。（緊急災害復旧工事の実施状況は表-1のとおり）

表-1 緊急災害復旧工事の実施状況（21日17:00現在）

工事箇所		工事の概要	進捗状況
1	燕市野中才地先（上流） （大河津分水路燕市側）	工事延長335m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 （県道は全面通行止め）	舗装撤去 1,020m ² （完了） 掘削、築堤盛土 <u>155m</u> 【全体進捗率50%】
2	燕市野中才地先（下流） （大河津分水路燕市側）	工事延長590m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 （県道は全面通行止め）	舗装撤去 828m ² 掘削、築堤盛土 <u>198m</u> 【全体進捗率38%】


3	<p>まちかるい 長岡市町軽井地先 (信濃川旧寺泊町側)</p>	<p>工事延長350m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧、縁石撤去復 旧 堤防護岸沈下亀裂箇所にじ ゃかご設置 (県道は片側交互通行)</p>	<p>坂路部掘削、盛土 <u>119m</u> 県道部掘削、盛土 <u>145m</u> // 舗装撤去 <u>110m</u> // L型側溝 <u>50m</u> <u>じゃかご工 5m</u> 【全体進捗率37%】</p>
---	--	---	---

平成19年新潟県中越沖地震被害状況(第4報)をホームページに掲載しています
<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

_____ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

<p>【問い合わせ先】 国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020 副所長 杉本 利英 河川環境課長 稲川 貢</p>
--

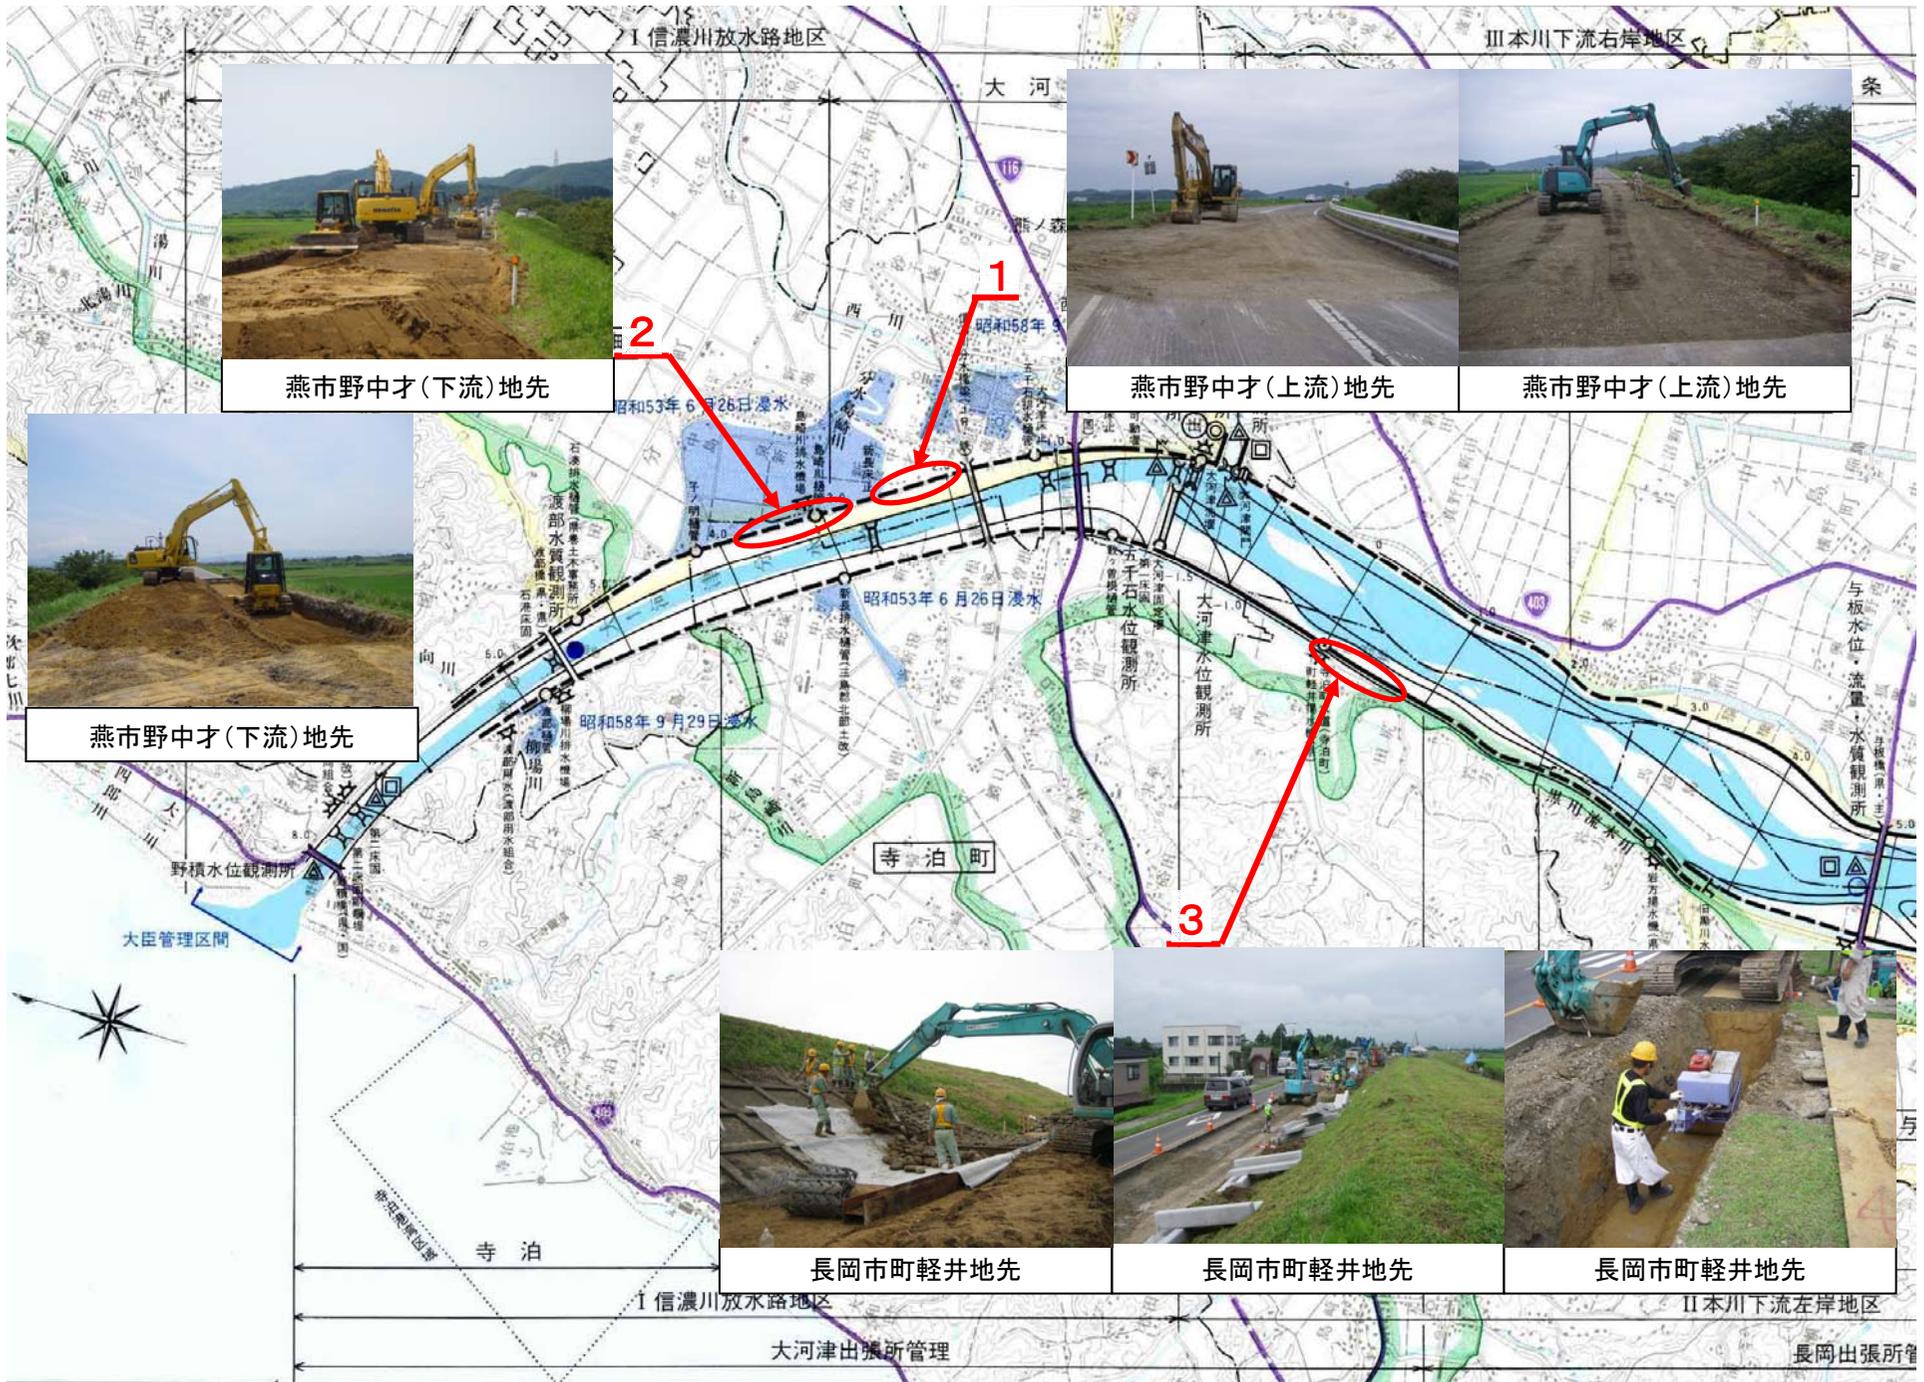

燕市野中才(下流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(下流)地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先
