

国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月23日
9時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について（第19報） 緊急災害復旧工事の実施状況（No.9）

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防及び堤防護岸に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事に着手しました。復旧内容は、堤防に亀裂が入り緩んだ部分の土砂を一時的に掘削除去し、再び築堤盛土（締固め）を行うと共に、新たに堤防護岸に沈下亀裂が生じた部分はジャカゴを設置します。工事は24時間体制で実施し、全箇所を10日間で完了させる予定です。（緊急災害復旧工事の実施状況は表-1のとおり）

町軽井地先の堤防護岸は、亀裂が発生した部分をジャカゴにより覆う工事が完了し、応急復旧が完了しました。残る工事は築堤盛土と舗装復旧です。

野中才地先は、上下流とも築堤盛土が完了し、大河津分水路燕市側はすべて堤防の機能が回復しました。残る工事は道路の舗装復旧だけになりました。

表－1 緊急災害復旧工事の実施状況（23日 9：00現在）


工事箇所		工事の概要	進捗状況
1	^{のなかさい} 燕市野中才地先(上流) (大河津分水路燕市側)	工事延長335m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去 1,020m ² (完了) 掘削、築堤盛土 168m(完了) 舗装復旧準備工 【全体進捗率67%】
2	^{のなかさい} 燕市野中才地先(下流) (大河津分水路燕市側)	工事延長590m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去 828m ² (完了) 掘削、築堤盛土 258m(完了) 舗装復旧(路盤工) 【全体進捗率50%】
3	^{まちがるい} 長岡市町軽井地先 (信濃川旧寺泊町側)	工事延長350m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧、縁石撤去復旧 堤防護岸沈下亀裂箇所にじ ゃかご設置 (県道は片側交互通行)	坂路部掘削、盛土 119m 県道部掘削、盛土 220m " 舗装撤去 280m " L型側溝 100m " 舗装復旧 100m じゃかご工 30m(損傷部 応急復旧完了) 【全体進捗率48%】

平成19年新潟県中越沖地震被害状況(第6報)をホームページに掲載しています
<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

_____ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

【問い合わせ先】 国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020 副所長 杉本 利英 調査第二課長 柳 正市

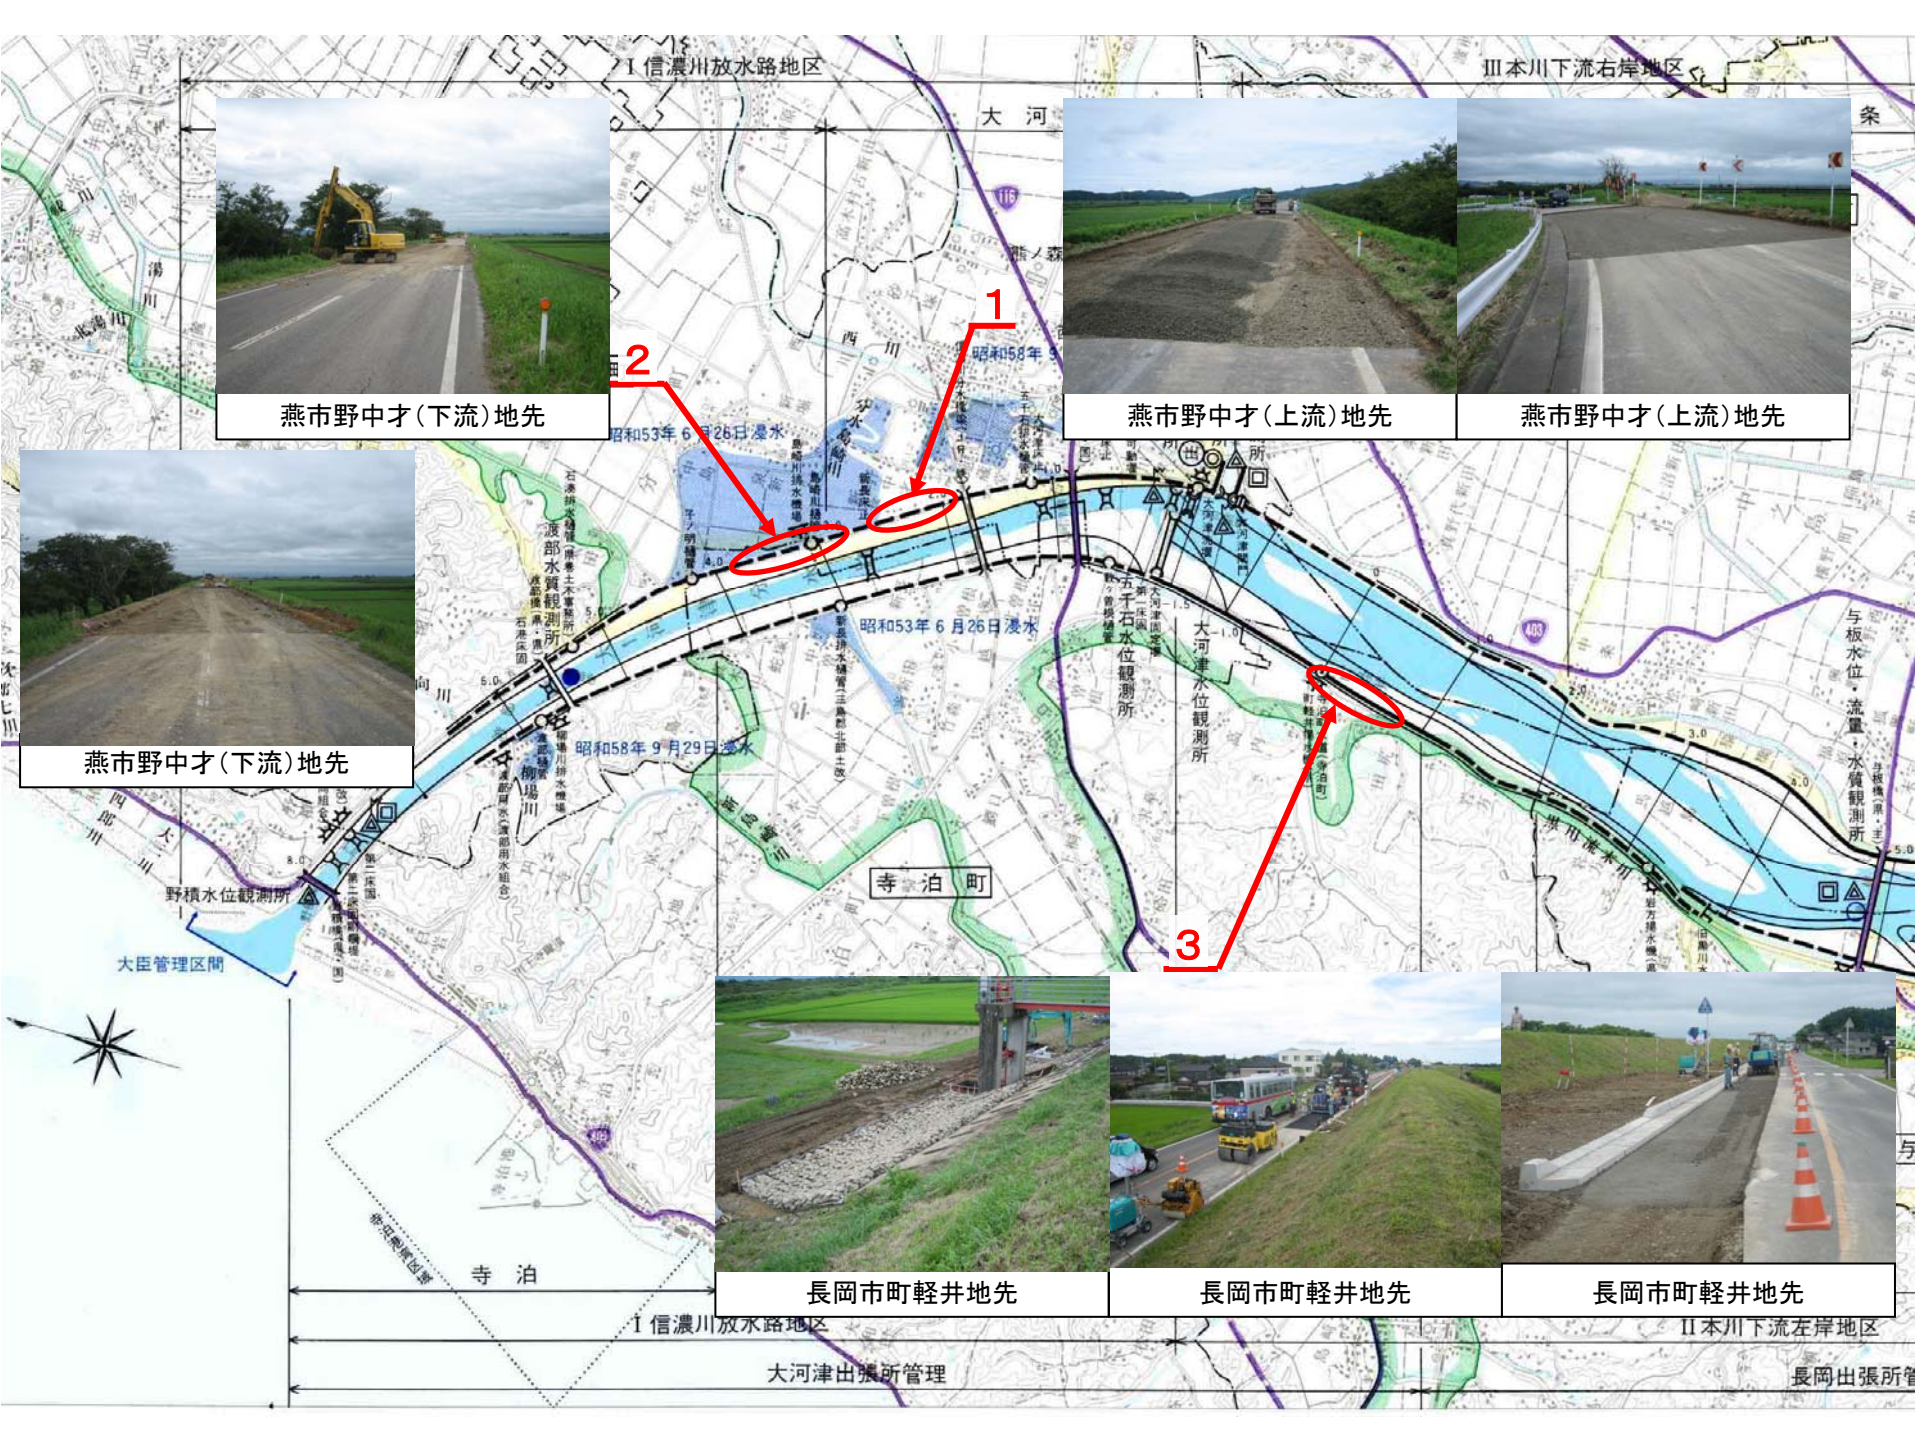

燕市野中才(下流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(下流)地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先

I 信濃川放水路地区

II 本川下流左岸地区

大河津出張所管理

長岡出張所管
