

かとうせきかいらんぼん 可動堰回覧板

平成22年2月1日号 (No.55)
国土交通省北陸地方整備局
信濃川河川事務所大河津出張所
TEL 0256-97-2121
E-mail shinano@hrr.mlit.go.jp

回覧



当初の暖冬予報に反し大雪に見まわっておりますが、工事業者の努力により可動堰関連工事は順調に進んでおります。今回は可動堰に関連した4つの工事の進捗状況についてお知らせします。

可動堰本体工事の進捗状況

現在、右岸側の堰柱2基(S6、S7堰柱)及び右岸魚道のコンクリート工事が最盛期を迎えています。


S6、S7堰柱については、11月1日号でお知らせしたとおり昨年末に底版部の3,000m³を超えるコンクリート大量打設を行いました。その後堰柱部(高さ約13m)の施工に移り、先月末には2回目のコンクリート打設が終了しました。現在、3回目のコンクリート打設に向けて鉄筋の組立を行っています。3月末には最終となる4回目のコンクリート打設を行う予定です。また、右岸魚道についても順次鉄筋の組立・コンクリート打設を行っています。

これにより、6月末には7基の堰柱及び左右岸魚道が全て完成し、新しい可動堰の全景が分水路の中に姿を現します。

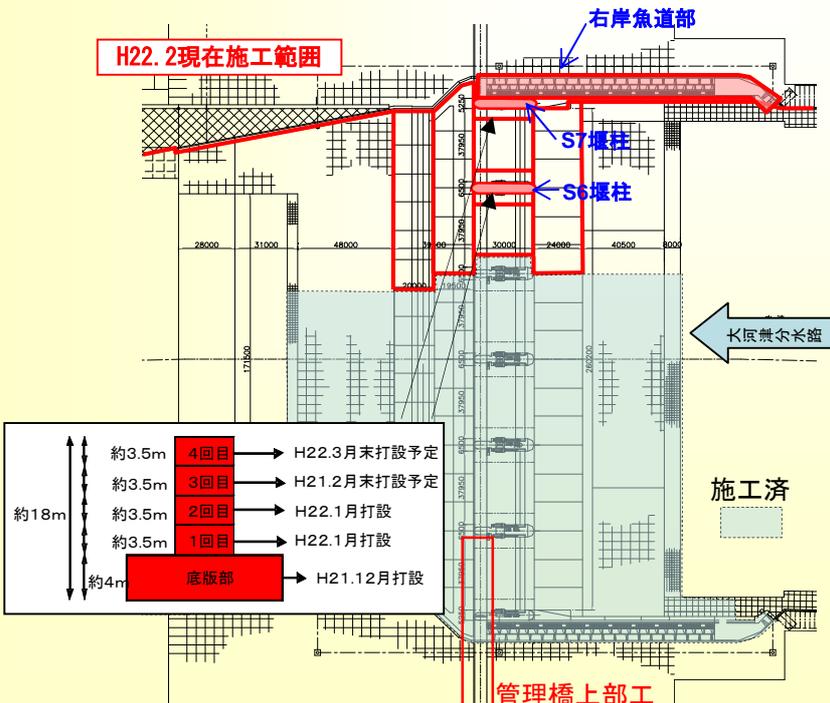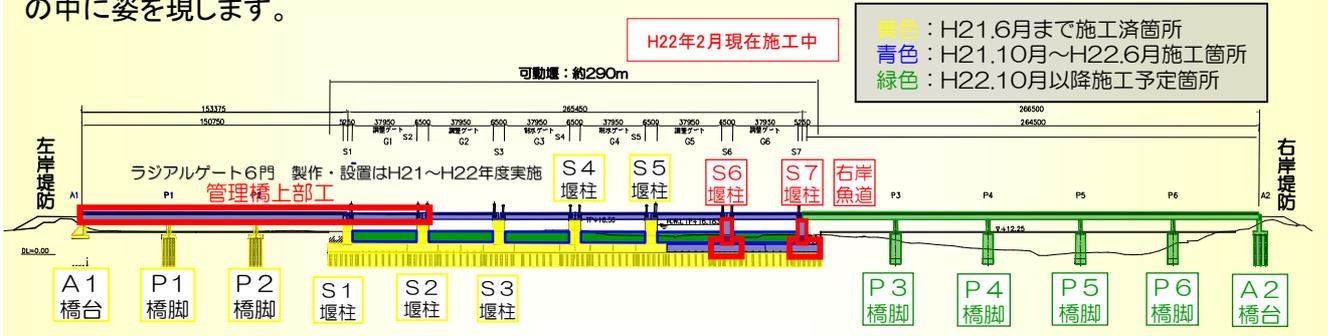


可動堰ゲート設備工事の進捗状況

現在、ゲートが開閉する中心部の「基礎材」とゲートを円滑に開閉するためゲート両端の堰柱に取り付ける「戸当り」等の設置工事を行っており、6月末には7基全ての堰柱について設置が完了し、出水期後の10月からゲート本体の設置を開始する予定です。

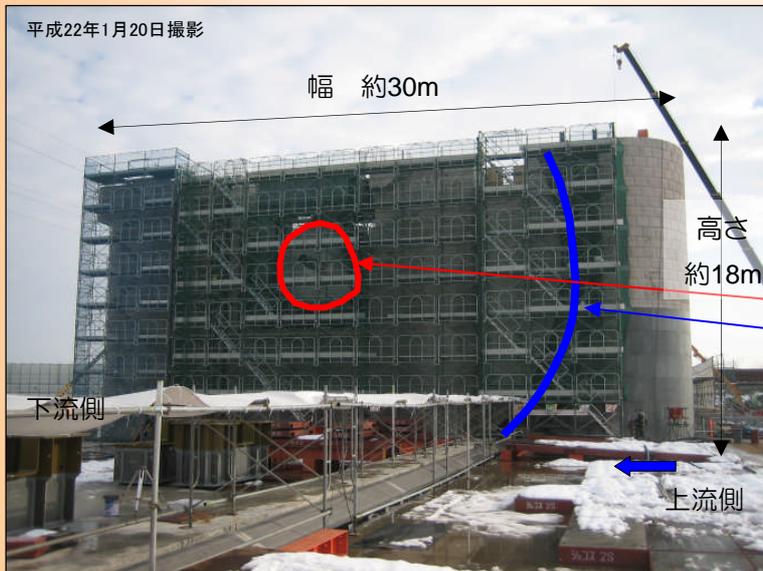


「基礎材」及び「戸当り(側部・底部)」が設置されています。

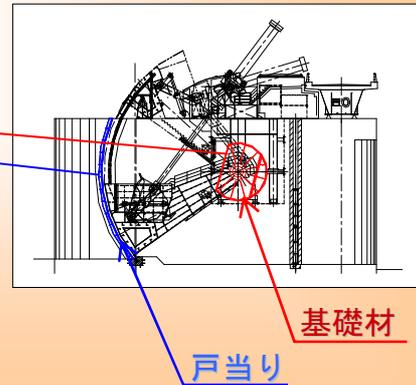

可動堰管理橋上部工事の進捗状況

現在、橋桁の架設工事を行っています。先月までに左岸部A1橋台からS1堰柱までの3径間とS1堰柱からS2堰柱の1径間の架設が完了しました。今後は順次残りの橋桁の架設を行い、6月末にはS7堰柱までの架設工事が完了する予定です。

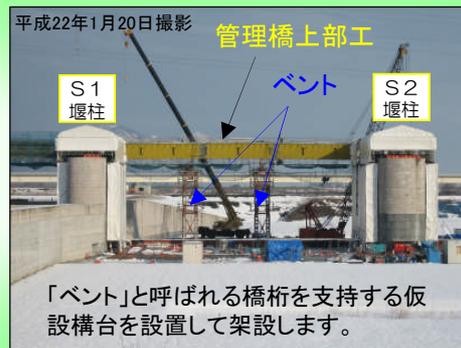

「ベント」と呼ばれる橋桁を支持する仮設構台を設置して架設します。

可動堰上流では冬のにぎわい

今年も可動堰上流には北からの越冬のため数多くの野鳥が訪れて賑やかになっています。双眼鏡を片手にバードウォッチングなどいかがでしょうか。珍しい鳥もみられるかも。



大河津可動堰情報館ホームページから、毎月1日には可動堰回覧板の最新号をご覧頂けます。また、バックナンバーも合わせてご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeiki/>」です。

『可動堰なんでも電話』を開設し、みなさんからのご意見・ご質問などをお待ちしております。
0258-32-3134 (平日 AM9:00~PM4:00)

工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ Tel 0256-97-2121(建設監督官在所)
大河津出張所 :大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等
建設監督官(可動堰改築担当):大河津可動堰改築事業に関する工事監督等

信濃川河川事務所

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

大河津可動堰情報館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeiki/>

信濃川大河津資料館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ohkouzu/index.html>
