


能登半島地震に伴う国道8号・18号の災害復旧工事



能登半島地震に伴う国道8号・18号の災害復旧工事

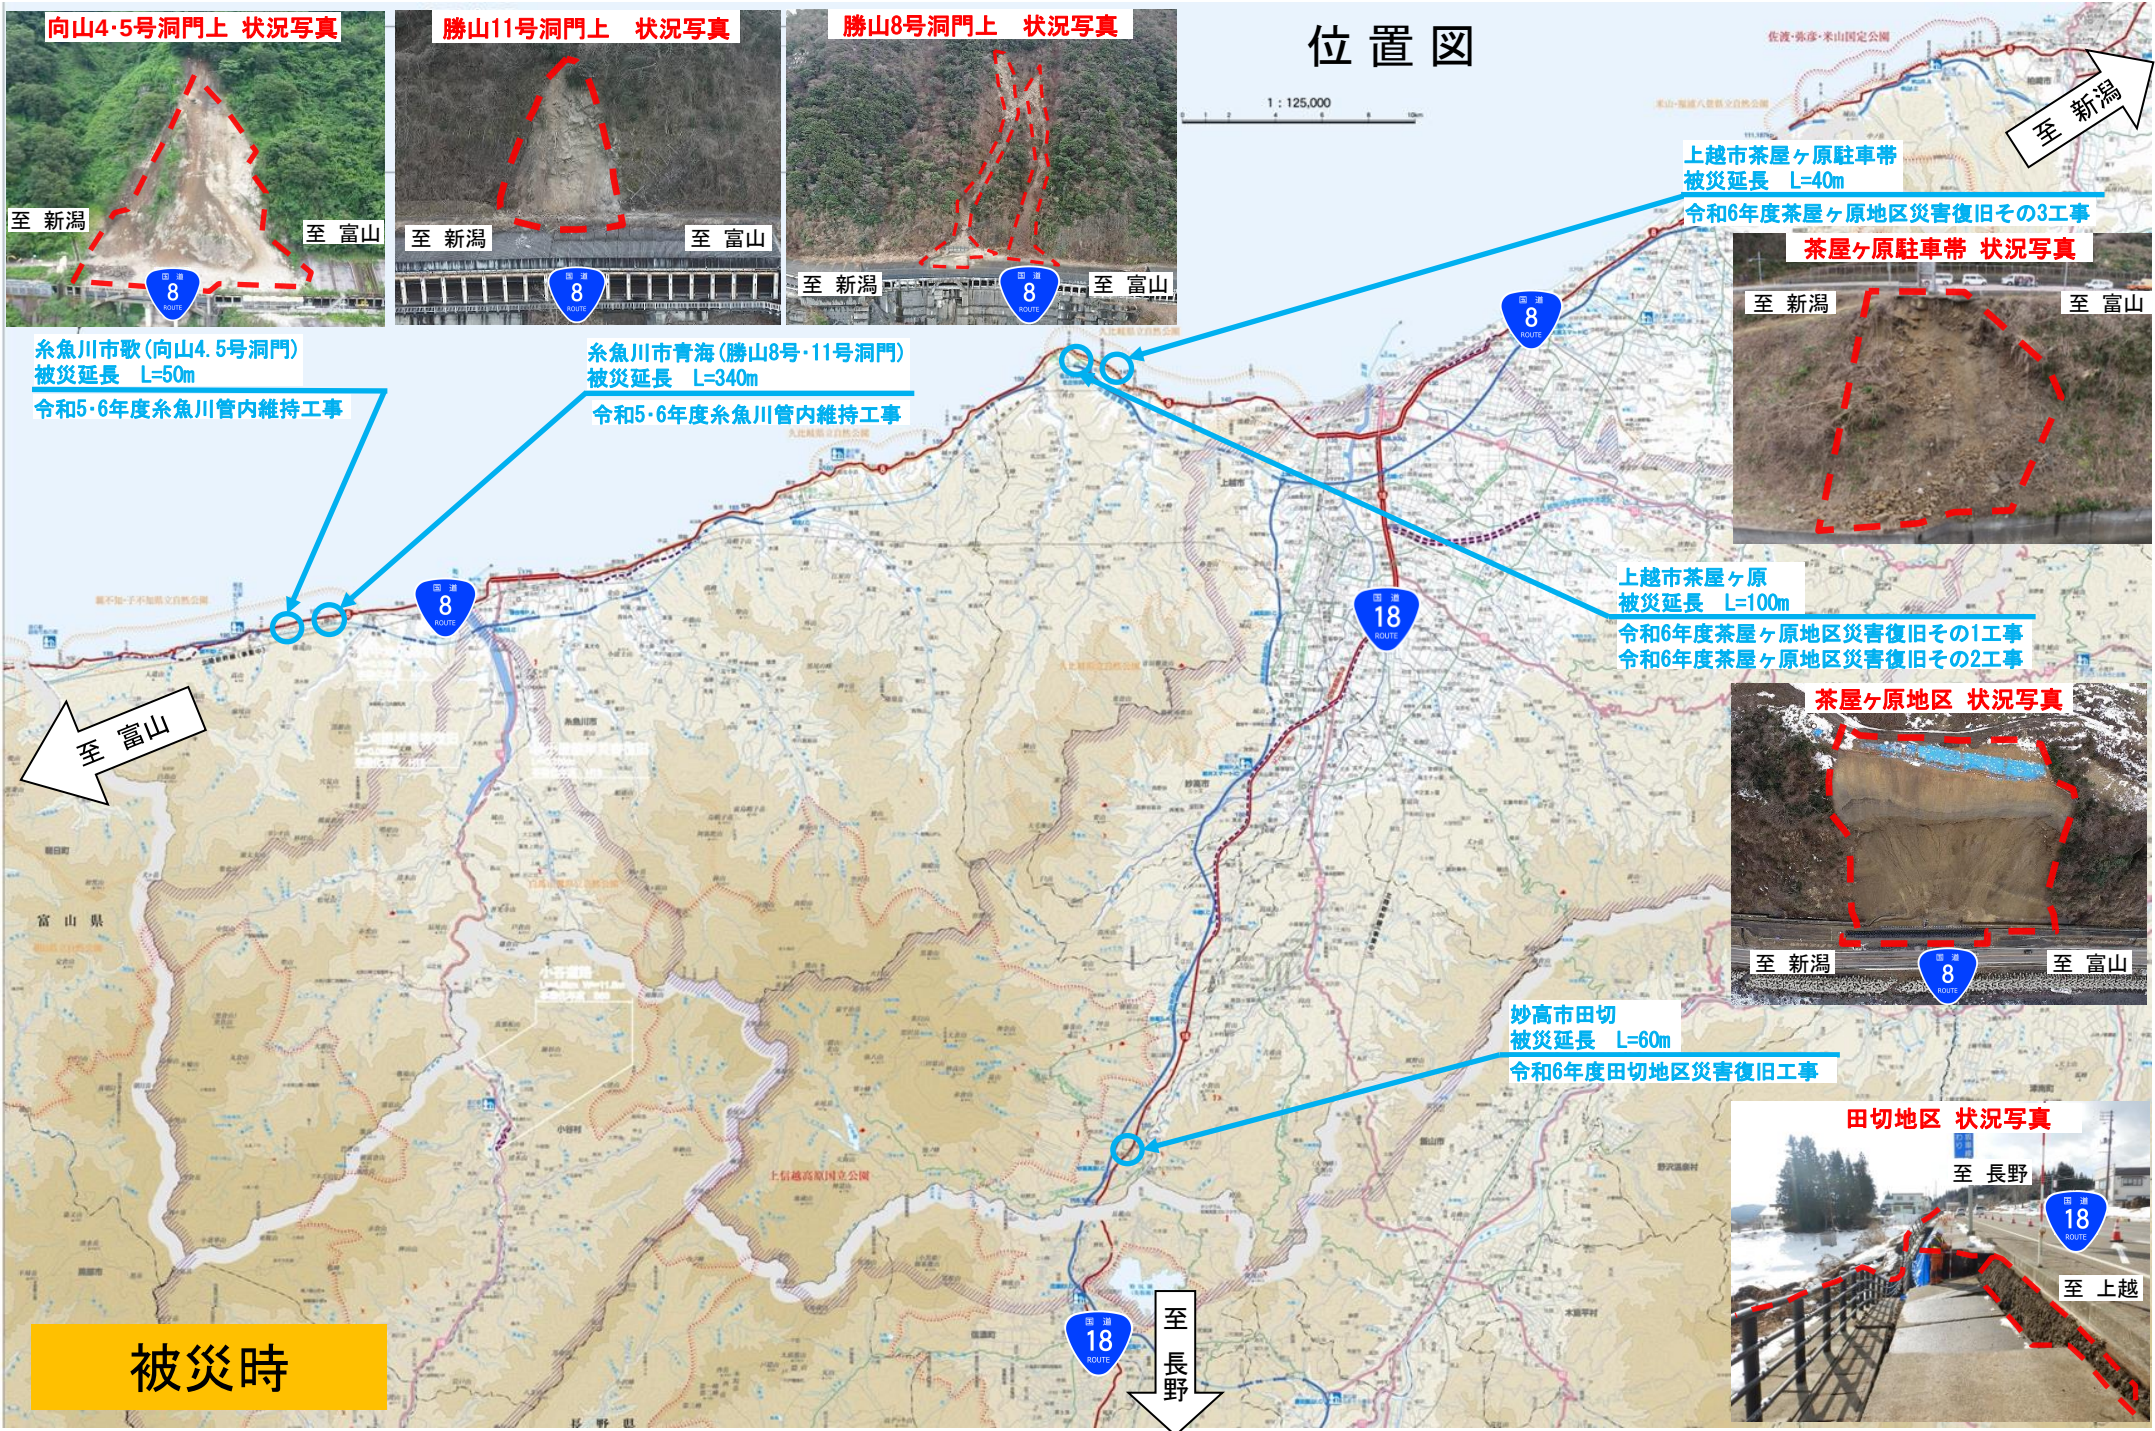


位置図

1 : 125,000




上越市茶屋ヶ原駐車帯
被災延長 L=40m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事

茶屋ヶ原駐車帯 進捗写真

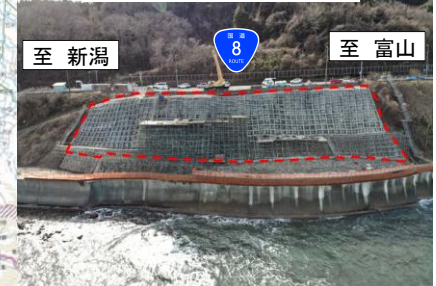

上越市茶屋ヶ原
被災延長 L=100m
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事

茶屋ヶ原地区 進捗写真

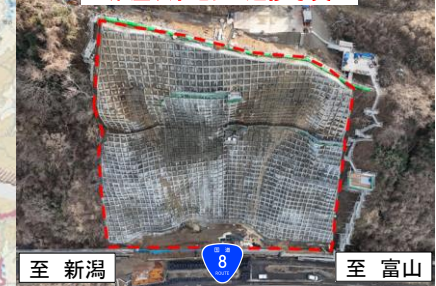

妙高市田切
被災延長 L=60m
令和6年度田切地区災害復旧工事

田切地区 復旧完了写真



糸魚川市歌(向山4・5号洞門)
被災延長 L=50m
令和5・6年度糸魚川管内維持工事

糸魚川市青海(勝山8号・11号洞門)
被災延長 L=340m
令和5・6年度糸魚川管内維持工事


至 富山

至 長野

令和7年2月3日現在

国道8号 上越市茶屋ヶ原

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
〈工期：R6.6.7～R7.3.25, 施工者：田中産業(株)〉
主な工事：法枠工3500m² 進捗率 64.0 %
- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事
〈工期：R6.6.11～R7.3.25, 施工者：坂井建設(株)〉
主な工事：法枠工3600m² 進捗率 64.0 %

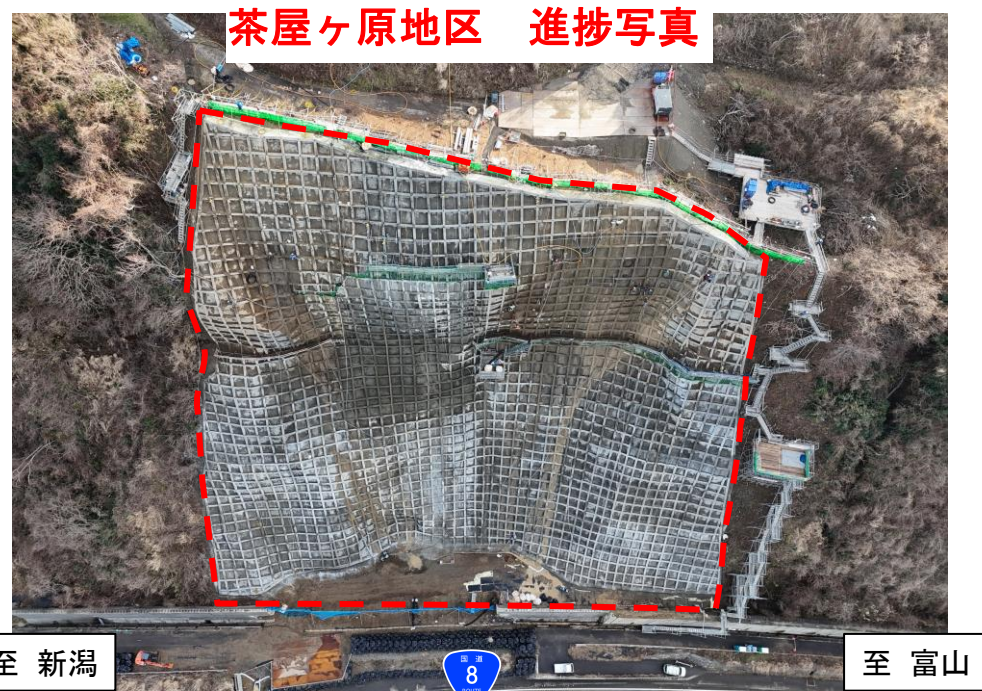

交通規制：冬期間は、信号機による片側交互通行規制を中止します。

国道8号 上越市茶屋ヶ原駐車帯

- 令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その3工事
〈工期：R6.6.12～R7.3.31,
施工者：武江・大陽経常建設共同企業体〉
主な工事：法枠工1900m² 進捗率68.0%




終日駐車帯の封鎖を行っております。

国道18号 妙高市田切

- 令和6年度田切地区災害復旧工事
〈工期：R6.6.12～R6.12.27, 施工者：(株)野本組〉
主な工事：掘削工1720m³、路体盛土1430m³、
地盤改良 1式、排水構造物工 1式
法面工 1式、防護柵 1式、舗装工 1式
進捗率 100.0% (復旧完了)

田切地区 復旧完了写真

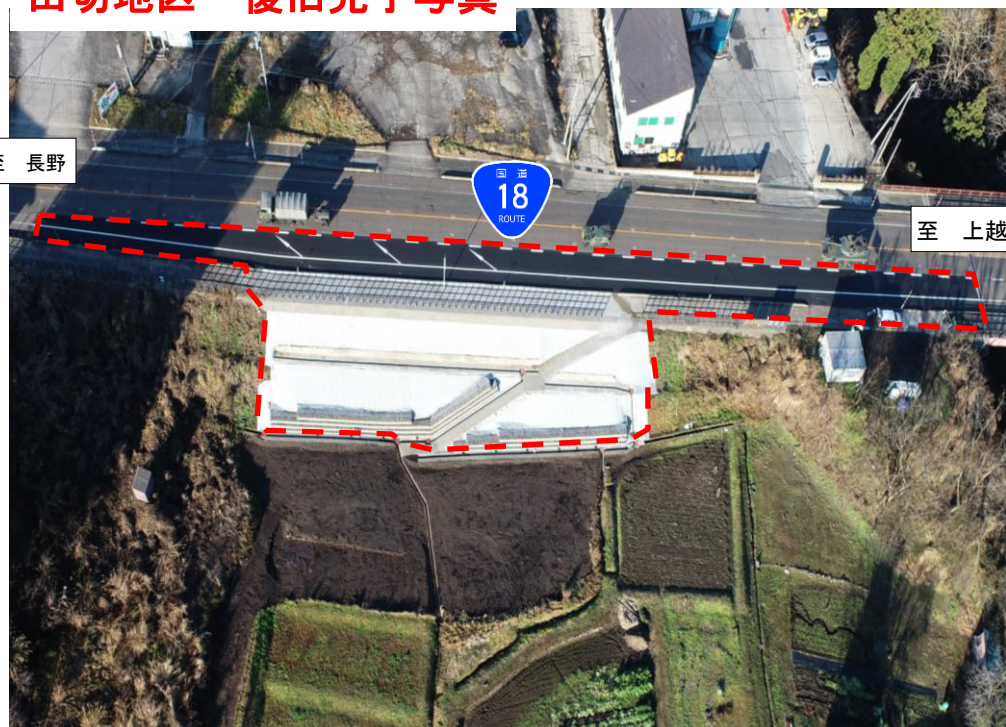

国道8号 糸魚川市歌(向山4・5号洞門)

- 令和5・6年度糸魚川管内維持工事
〈工期：R5.4.1～R7.3.31, 施工者：笠原建設(株)〉
主な工事：洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去、法面応急処理
応急復旧進捗率 100.0%
(応急復旧完了)

向山4・5号洞門上 応急復旧完了写真



国道8号 糸魚川市青海(勝山11号洞門)

- 令和5・6年度糸魚川管内維持工事
〈工期：R5.4.1～R7.3.31, 施工者：笠原建設(株)〉
主な工事：洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去、法面応急処理
応急復旧進捗率 100.0%
(応急復旧完了)

勝山11号洞門上 応急完了写真



国道8号 糸魚川市青海(勝山8号洞門)

- 令和5・6年度糸魚川管内維持工事
〈工期：R5.4.1～R7.3.31, 施工者：笠原建設(株)〉
主な工事：洞門上の応急復旧工事
崩落土砂撤去
応急復旧進捗率 100.0%
(応急復旧完了)

勝山8号洞門上 応急復旧完了写真

