

工事現場の安全対策にかかる創意工夫


整理番号：19

分類	第2章第1節3.狭い作業空間での機械施工に関する安全確保
事例名称	笠コンクリートの中詰コン打設方法

対策の概要

笠コンクリートの中詰コン打設において、バックホーにテイラーズバケットを取付けることにより、作業の効率化に努めた。通常のバケットと違い、作業員によるバケットのすぐ近くでのスコップ作業も不要となり、安全作業に寄与した。

常盤護岸下流その2工事

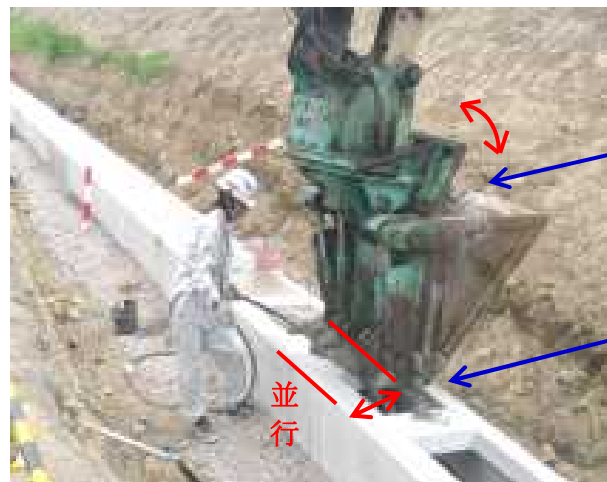

バケット取付部が 360°
回転可能笠コンと並行
に生コンを投入できる

先が開き、生コンの投
入量が調節できる。

並行
