

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日 時	令和6年1月4日 18時30分
-----------------------	--------------------

件 名	令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について（第9報）
-----	-----------------------------------

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	令和6年1月4日15時00分現在 令和6年1月1日令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について ○輪島市、珠洲市、能登町へのアクセス道路の啓開作業が完了し、大型車両の通行が可能に <u>別紙1</u> ○石川県能登地方等で展開しているTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動等を展開 <u>別紙2・3</u>
------	--

北陸地方整備局

ホームページ

URL：<https://www.hrr.mlit.go.jp/>



X(旧 Twitter)



問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL（代表）025-280-8880 所 属 氏 名 企画部 企画課長 西村 雄喬
--------	--

令和6年能登半島地震 能登半島 輪島市、珠洲市、能登町へのアクセス道路(大型車)

別紙1

- ・輪島市、珠洲市、能登町内へのアクセス道路において、石川県の要請により、北陸地方整備局 と(一社)日本建設業連合会で車幅拡幅等の啓開作業を行っていましたが、作業が完了し大型車の通行が可能となりました。
- ・通行にあたっては、現地の指示に従い通行願います。





【河川調査班】河川の施設等の被災状況等を調査しています。

【砂防調査班】斜面崩壊状況等を調査しています。



【河川調査班】石川県志賀町甘田



【河川調査班】石川県中能登町金丸



【河川調査班】石川県志賀町東小室



【河川調査班】石川県志賀町広地




【砂防調査班】石川県七尾市熊淵町水上町



【砂防調査班】石川県能登町字宮地

【道路調査班】道路のクラックや段差、土砂崩壊状況等を調査しています。

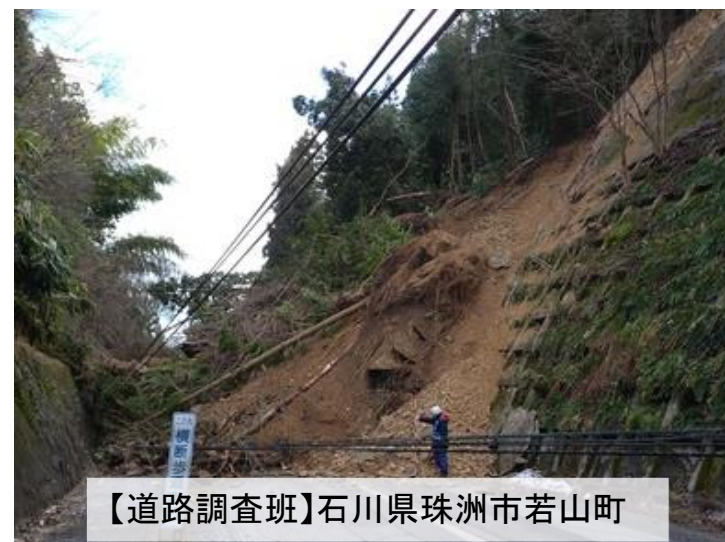



■TEC-FORCEとして51班、179名を派遣

1月4日 15時時点

派遣先		調査内容	派遣人数		調査箇所数	自治体ごとの合計	
						班	人数
石川県	石川県能登地方 (1月2日～)	ヘリ調査	2班	4名	石川県能登地方	3班	6名
		被災状況調査 car-Sat(※)	1班	2名	石川県能登地方		
	石川県 (1月3日～)	被災状況(砂防)	1班	4名	調整中	1班	4名
	輪島市 (1月3日～)	道路啓開	1班	2名	七尾輪島線	12班	42名
		道路調査	2班	4名	調整中		
		被災状況(河川)	1班	4名	調整中		
		被災状況(砂防)	6班 (内、中部地整5班20名)	24名	調整中		
		被災状況(港湾)	2班	8名	輪島港		
	珠洲市 (1月2日～)	道路啓開	(1班) ※輪島市と同	(2名)	七尾輪島線	7班	24名
		道路調査	2班	4名	調整中		
		被災状況(道路)	2班	8名	調整中		
		被災状況(河川)	1班	4名	調整中		
		被災状況(砂防)	1班	4名	調整中		
		被災状況(港湾)	1班	4名	飯田港		
	穴水町 (1月3日～)	被災状況(河川)	1班	4名	調整中	4班	15名
		被災状況(砂防)	2班 (関東地整)	8名	調整中		
		応急危険度判定	1班	3名	調整中		



派遣先		調査内容	派遣人数		調査箇所数	自治体ごとの合計	
						班	人数
石川県	能登町 (1月3日～)	道路調査	2班	2名	調整中	8班	26名
		被災状況(河川)	1班	4名	調整中		
		被災状況(砂防)	4班	16名	調整中		
		被災状況(港湾)	1班	4名	小木・宇出津港		
	七尾市 (1月3日～)	被災状況調査	2班 (中部地整)	8名	調整中	3班	12名
		被災状況(砂防)	2班 (関東地整)	8名	調整中		
		被災状況(港湾)	1班	4名	調整中		
	志賀町 (1月2日～)	被災状況(道路)	4班 (関東地整2班8名 中部地整2班8名)	16名	調整中	5班	19名
		被災状況(河川)	1班	4名	調整中		
		被災状況(砂防)	1班 (関東地整)	4名	調整中		
		応急危険度判定	1班 (関東地整)	3名	調整中		
	中能登町 (1月3日～)	被災状況(道路)	1班 (関東地整)	4名	調整中	8班	31名
		被災状況(河川)	1班	4名	調整中		
		応急危険度判定	1班 (関東地整)	3名	調整中		
	かほく市 (1月4日～)	被災状況調査(道路)	1班 (中部地整)	4名	調整中	1班	4名
						51班	179名

※1 このほか、北陸地方整備局(新潟県新潟市)に、総合司令班として東北地方整備局から2名、関東地方整備局から2名、中部地方整備局から4名を派遣

※2 今後、必要に応じて追加の調査を実施する可能性もあり。



■TEC—FORCE(応急対策班)を派遣。給水活動・照明車による監視活動に対応。


派遣先		調査内容	派遣人数	
石川県	石川県能登地方	被災状況(河川)	2班	8名

■災害対策機械を1月2日から派遣し、照明・給水の支援を実施中。

派遣先		派遣機械の種類	派遣台数
新潟県	新潟市 (1月2日～)	照明車	1台
	上越市 (1月3日～)	照明車	2台
富山県	氷見市 (1月2日～)	給水車	1台
石川県	輪島市 (1月2日～)	照明車	3台
		衛星通信車	1台
	珠洲市 (1月3日～)	照明車	1台
	穴水町 (1月3日～)	照明車	3台
	能登町 (1月3日～)	照明車	1台
	七尾市 (1月2日～)	照明車	2台
		排水ポンプ車	1台
	かほく市 (1月2日～)	給水車	1台
合計			17台

※協力業者34名の派遣協力あり。

※今後、必要に応じて追加の機械を派遣する可能性もあり。

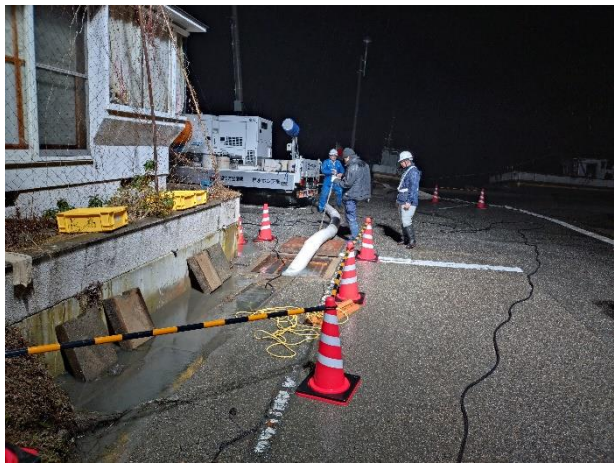

排水ポンプ車稼働



照明車稼働

北陸地方整備局管内の各事務所から被災地に向けて飲料水、非常食、ブルーシート等の物資支援を行いました。



富山河川国道事務所から氷見市へ



高田河川国道事務所※



信濃川河川事務所※



新潟国道事務所※



長岡国道事務所※



金沢河川国道事務所から被災地へ

※新潟県内事務所からの支援物資は、金沢河川国道事務所へ輸送し、その後被災地へ届けられます。

北陸地方整備局対応状況（第9報）

令和6年1月4日 15時00分現在

1. 北陸地方整備局の災害対応状況

令和6年能登半島地震に対する被害を警戒し、1月1日16時10分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

2. 北陸地方整備局の防災体制状況

1月4日 15時00分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

3. 北陸地方整備局管内 総括情報

1) 人的被害

■石川県：死者 78名（七尾市5名、輪島市 44名、珠洲市23名、羽咋市1名、志賀町1名、穴水町2名、能登町2名）

行方不明者 80名

重傷170名（珠洲市軽傷含む）（輪島市9名、珠洲市145名、志賀町2名、穴水町5名、能登町9名）

軽傷153名（金沢市9名、七尾市3名、小松市1名、輪島市42名、羽咋市1名、白山市1名、野々市市1名、志賀町53名、中能登町1名、穴水町23名、能登町 25名）

■富山県：重傷3名（富山市2名、射水市1名）

軽傷 34名（富山市14名、高岡市3名、魚津市2名、氷見市6名、黒部市5名、砺波市1名、小矢部市2名、射水市1名）

■新潟県：重傷1名（見附市1名）

軽傷25名（新潟市8名、長岡市4名、三条市1名、柏崎市2名、糸魚川市4名、五泉市1名、上越市5名）

2) 物的被害

■石川県：

・住宅・非住宅被害 多数

（輪島市多数、珠洲市多数、能登町多数、金沢市 47件、七尾市 129件、加賀市 46件、羽咋市15件、野々市市2件、川北町2件、志賀町71件、宝達志水町1件、中能登町33件、穴水町17件、）

■富山県：

・住宅・非住宅被害 57件

（魚津市 7件、氷見市3件、黒部市 7件、砺波市3件、小矢部市11件、上市町1件、入善町1件、朝日町15件）

■新潟県：

・住宅・非住宅被害 4 4 7 件

(新潟市 1 1 2 件、長岡市 2 件、十日町市 1 件、燕市 1 4 件、
糸魚川市 1 9 7 件、妙高市 3 件、五泉市 2 5 件、
上越市 8 8 件、佐渡市 2 件、出雲崎町 2 件、津南町 1 件)

3) 港湾

○現時点での被害状況等

・新潟西港（管理者）

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・新潟西港（直轄）

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・新潟東港（直轄）

点検完了。異常なし。

・両津港

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・岩船港

点検完了。異常なし。

・二見港

点検完了。異常なし。

・小木港（新潟県）

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・赤泊港

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・寺泊港

点検完了。異常なし。

・柏崎港

点検完了。異常なし。

・直江津港

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・姫川港

点検完了。異常なし。

・魚津港

点検完了。異常なし。

・伏木富山港（富山地区）

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

・伏木富山港（新湊地区）

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

< 国有港湾施設 >

点検完了。被災箇所への復旧は今後調整。

< 補助施設 >

臨港道路西埋立 1 号線に隆起・沈下多数（通行止め中）（1/2 15:00 時点）。

・伏木富山港（伏木地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

＜国有港湾施設＞

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

＜補助施設＞

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・ 輪島港

ヘリによる被害状況調査で、マリンタウン岸壁（-7.5m）の岸壁法線にズレあり（延長 220m の中央部あたり）、法線の極端な出入りは無いと思われる。岸壁背後に大きな段差（1.5m 以上）あり。

防波堤の被害は見当たらない。（直轄）

1/3 TEC-FORCE（国総研・金沢港）輪島港へ移動し、19:00 マリンタウン岸壁を確認、損傷大、日没のため 1/4 も調査予定。

1/4 14 時頃 TEC-FORCE による調査開始。（直轄）

1/4 輪島港岸壁応急復旧着手（海翔丸到着（1/5 夕刻）前完了目標）

・ 飯田港

防波堤沈下・倒壊、岸壁、物揚場エプロン段差、臨港道路ひび割れ・陥没（管理者）

ヘリによる被害状況調査

東防波堤中央部でケーソンの倒壊及び水没。先端函の標識は健在。中央の物揚場（-4.0m）背後で沈下及びひび割れが発生。

資材等の散乱も確認。東側の物揚場（-4.0m）前面の泊地で船舶の転覆や乗り上げ有り。岸壁には特に被害は見当たらない。油膜は特に見当たらない。

船だまり防波堤（港内）が倒壊している模様。（直轄）

・ 宇出津港

ヘリによる被害状況調査

いやさか広場近くの船着場で沈下及びひび割れ。

南第 2 防波堤背後の物揚場（-4.0m）でエプロンひび割れ。南防波堤背後の物揚場（-4.0m）でエプロンの沈下。（直轄）

1/3 14:40 TEC-FORCE（金沢港）調査完了

・ 小木港（石川県）

道路が寸断しており、現地に行けないため、状況不明。（管理者）

ヘリによる被害状況調査 物揚場（-3.5m）でエプロンのひび割れ。物揚場（-3.5m）で沈下及びエプロンのひび割れ。小木地区港内で油膜を確認。

（直轄）1/4 TEC-FORCE（金沢港）調査予定

・ 穴水港

ヘリによる被害状況調査

物揚場（-4.0m） 2 バースでエプロン沈下。物揚場（-4.0m）で岸壁前出し及び沈下。穴水宝山マリーナでエプロン沈下及び液状化。乗用車がエプロン陥没箇所転落。マリーナ側護岸（遊歩道）背後に土砂崩れ。（直轄）

・ 滝港

ヘリによる被害状況調査

物揚場エプロン陥没あり。

物揚場背後の埠頭用地 土砂の吹き出しあり。（液状化の可能性）、排水口

付近に損傷確認。

物揚場法線 変状は見られない。

護岸背後駐車場 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)、エプロンに陥没あり。(直轄)

- ・金沢港

戸水 (-10m)、無量寺 (-7.5m) は被害ありのため使用不可。

御供田 1 号 (-10m) 背後ふ頭に陥没あり。

ガントリークレーン 1、2 号機 点検が必要なため利用不可 (管理者)

点検の結果、ガントリークレーンの使用は可能。岸壁の利用可否について

は、1/4 の TEC-FORCE の調査結果を基に判断 (直轄)

ヘリによる被害状況調査

戸水埠頭 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)

無量寺岸壁 (-7.5m) 岸壁上に亀裂確認。

大野防波堤 特に被害は見当たらない。

無量寺岸壁 (-10m 耐震) 利用可能。

御供田コンテナターミナル 特に被害は見当たらない。

金石地区 特に被害は見当たらない。(直轄)

1/4 TEC-FORCE (金沢港) 調査予定

- ・七尾港

七尾出張所庁舎周囲で液状化発生 (職員による目視)

矢田新 (-7.5m) 及び物揚場のエプロン及び栈橋に沈下あり。

大田岸壁変状 野積場・荷捌場の舗装沈下 (管理者)

1/3 11:00 TEC-FORCE (国総研・金沢港) 矢田新岸壁 (-7.5m) 調査、亀裂・差段差あり、給水船であれば着岸可能。ただし条件あり。

①慎重に接岸すること。②栈橋の上部工の上には、重い物をのせないこと。

エプロン (15~20m ぐらい岸壁法線から後ろ) なら OK。

船に車両を横付けは NG。1/4 TEC-FORCE (金沢港) 調査予定

- ・福浦港

物揚場背後ふ頭に段差あり。臨港道路にひび割れあり。(管理者)

- ・塩屋港

特に被害は見当たらない。(管理者)

- ・半ノ浦港、和倉港 (管理者；七尾市)

1/4 TEC-FORCE (敦賀港) 調査予定

1/4 和倉港 (七尾市) 護岸調査着手 (七尾市要請対応) (点検終了未定)

- ・敦賀港

点検完了。異常なし。

- ・福井港

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・和田港

点検完了。異常なし。

- ・内浦港

点検完了。異常なし。

- ・鷹巣港
点検完了。異常なし。

4) 下水道

○石川県

- ・処理場
全 56 箇所（被害無:28 箇所、機能確保済:7 点検中:21）
- ・ポンプ場
全 52 箇所（被害無:29 箇所、機能確保済:7 点検中:16）
- ・管路施設
11 市町村で管路の被害が確認され応急復旧または点検中

○新潟県

- ・処理場
全 83 箇所（被害無:80 箇所、機能確保済:3）
- ・ポンプ場 被害なし
- ・管路施設
3 市町村で管路の被害が確認されたが、流下機能に影響なし（1 市で点検中）

○富山県

- ・処理場
全 29 箇所（被害無:25 箇所、機能確保済:4）
- ・ポンプ場 被害なし
- ・管路施設
3 市で管路の被害が確認されたが、流下機能に影響なし（10 市町村で点検中）

4. 幹線道路の被害状況

1) 高速道路（通行止めなし）

2) 直轄国道（2 路線、3 箇所）

- ・ R 8 上越市茶屋ヶ原（上下） 土砂崩落 通行止
- ・ R 4 7 0 高岡 I C～七尾 I C（上下） 通行止
※七尾城山 I C～高岡 I C間の上り線（七尾方向）においては緊急車両に限り通行可
- ・ R 4 7 0 穴水 I C～のと三井 I C（上下） 通行止

3) 補助国道（3 路線、2 9 箇所）

<新潟県：>

- ・被災の箇所なし

<富山県：2 路線、3 箇所>

<石川県：2 路線、2 6 箇所>

4) 都道府県道等（7 5 路線、9 7 箇所）

<新潟県：2 6 路線、2 7 箇所>

<富山県：9 路線、9 箇所>

<石川県：4 0 路線、6 1 箇所>

5. 河川関係等の被害状況

1) 直轄

(直轄河川)

・石川県

○震度5強

手取川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

梯川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・富山県

○震度5強

黒部川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

常願寺川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

神通川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

小矢部川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所

庄川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
堤防天端の亀裂1カ所

・新潟県

○震度6弱

信濃川下流：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤体の沈下3カ所、堤防天端の亀裂4カ所、
堤防法面の亀裂1カ所

信濃川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所

○震度5強

関川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 護岸損傷1カ所、舗装クラック1カ所、
特殊堤損傷1カ所

姫川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

○震度5弱

阿賀野川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・長野県

○震度5弱

千曲川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

(直轄ダム)

・石川県

○震度4

手取川ダム 1次点検完了 異常なし

・富山県

○震度4

宇奈月ダム 1次点検完了 異常なし

・新潟県

○震度5強

三国川ダム 1次・2次点検完了 異常なし

○震度 4

大石ダム 1 次点検完了 異常なし

・山形県

○震度 4

横川ダム 1 次点検完了 異常なし

(直轄砂防)

- ・立山砂防事務所：点検対象市町村数 2 市町、点検完了 異常なし
- ・神通川水系砂防事務所：点検対象市町村数 2 市、点検完了 異常なし
- ・阿賀野川河川事務所：点検対象市町村数 1 町、点検完了 異常なし

(直轄海岸)

- ・石川県：石川海岸 CCTV カメラによる点検完了 異常無し、
巡視完了 異常なし
- ・富山県：下新川海岸 CCTV カメラによる点検完了 異常無し、
巡視完了 異常なし
- ・新潟県：新潟海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常無し、
巡視完了 異常なし

2) 都道府県

(補助河川)

- ・石川県：点検対象 6 2 水系 2 1 2 河川、点検中 2 7 河川で護岸の沈下等あり
- ・富山県：点検対象 1 4 水系 2 8 河川、点検完了 8 河川で護岸の沈下等あり
- ・新潟県：点検対象 4 5 水系 2 9 6 河川、点検完了 6 河川で護岸の沈下等あり
- ・長野県：点検対象 1 水系 2 河川、点検完了 異常なし
- ・岐阜県：点検対象 1 水系 1 河川、点検完了 異常なし

(補助ダム)

- ・石川県：点検対象 1 1 ダム 点検完了 9 ダム 被害なし、
点検中 2 ダム (貯水池周辺斜面法面崩落、天端舗装クラック等あり)
- ・富山県：点検対象 1 6 ダム 点検完了 1 6 ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象 1 8 ダム 点検完了 1 8 ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象 8 ダム 点検完了 8 ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし

(利水ダム)

- ・石川県：点検対象 1 0 ダム 点検完了 1 0 ダム 被害なし
- ・富山県：点検対象 3 7 ダム 点検完了 3 7 ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象 3 9 ダム 点検完了 3 9 ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象 8 ダム 点検完了 8 ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象 1 1 ダム 点検完了 被害なし
- ・福島県：点検対象 1 8 ダム 点検完了 被害なし
- ・山形県：点検対象 1 ダム 点検完了 被害なし

(補助砂防)

- ・石川県：点検対象市町村数 15市町、点検中
- ・富山県：点検対象市町村数 12市町、点検中
- ・新潟県：点検対象市町村数 28市町村、点検完了28市町村 施設異常なし

(補助海岸)

- ・石川県：25海岸 10海岸点検完了。1か所天端被覆工沈下あり。
その他異常なし。その他順次点検予定。
- ・富山県：7海岸 7海岸点検完了。異常なし。
- ・新潟県：27海岸 27海岸点検完了。異常なし。

6. 自治体支援の状況

1) ホットライン

- ・震度5弱以上を観測した37市14町3村とのホットライン確立済み
- ・支援要請調整中

2) リエゾン

派遣日	派遣先	任務	派遣人数	内訳	派遣状況
1月1日 ～	石川県 富山県 新潟県 長岡市 七尾市 穴水町 中能登町 志賀町 輪島市 珠洲市 能登町	リエゾン (情報連絡員)	石川県 3名 富山県 1名 新潟県 1名 長岡市 1名 七尾市 2名 穴水町 2名 中能登町 2名 志賀町 2名 輪島市 3名 珠洲市 4名 能登町 2名 計21名	本局 3名 本局 1名 本局 1名 信濃川河川事務所 1名 本局 2名 本局 2名 本局 2名 本局 2名 本局 2名 新潟技術調査事務所 1名 本局 3名 新潟技術調査事務所 1名 本局 2名	派遣中 一時帰還 派遣中 一時帰還 派遣中 派遣中 派遣中 派遣中 派遣中 派遣中 派遣中 派遣中 派遣中

※ほか、防災エキスパート3名を派遣（七尾市、穴水町、中能登町、能登町）

※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの

3) TEC-FORCE

○TEC-FORCE 先遣隊

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月2日	北陸地方整備局	被災状況調査支援		中部地方整備局 4名	支援中
1月2日	北陸地方整備局	被災状況調査支援		関東地方整備局 2名	支援中
1月4日	北陸地方整備局	被災状況調査支援		東北地方整備局 2名	支援中

○防災ヘリ・car-SAT 関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月2日	石川県能登地方	被災状況調査 (道路)(ヘリ調査)	防災ヘリ (あおぞら号)	本局 1名 富山河川国道事務所 1名	活動終了
1月2日	石川県能登地方	被災状況調査 (河川・港湾)(ヘリ調査)	防災ヘリ (みちのく号)	本局 3名	活動終了
1月2日	石川県能登地方	被災状況調査 (港湾)(ヘリ調査)	防災ヘリ (ほくりく号)	本局 1名	活動終了
1月4日	石川県能登地方	被災状況調査(道路)(ヘリ調査)	防災ヘリ(ほくりく号)	本局 2名	調査中
1月4日	石川県能登地方	被災状況調査(河川)(ヘリ調査)	防災ヘリ(みちのく号)	利賀ダム工事事務所 2名	活動終了
1月2日 ～ 1月4日	石川県能登地方	被災状況調査 (道路)	Car-SAT(※)	本局 1名 金沢河川国道事務所 1名	調査中

※car-SAT：移動型衛星通信設備。移動中のカメラで撮影した映像を通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステム

○道路関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月2日	石川県珠洲市	被災状況調査 (道路)		長岡国道事務所 4名	派遣中
1月2日	石川県輪島市、 珠洲市	道路啓開		金沢河川国道事務所 2名	調査中
1月3日	石川県珠洲市	道路調査		本局 2名	調査中
1月3日	石川県珠洲市	道路調査		金沢河川国道事務所 2名	調査中
1月3日	石川県輪島市	道路調査		本局 2名	調査中
1月3日	石川県輪島市	道路調査		金沢河川国道事務所 2名	調査中

1月3日	石川県能登町	道路調査		富山河川国道事務所 1名	調査中
1月3日	石川県能登市	道路調査		富山河川国道事務所 1名	調査中
1月3日	石川県珠洲市	被災状況調査 (道路)		新潟国道事務所 4名	派遣中
1月3日	石川県志賀町	被災状況調査 (道路)		関東地方整備局 8名	調査中
1月3日	石川県中能登町	被災状況調査 (道路)		関東地方整備局 4名	調査中
1月4日	石川県中能登町	被災状況調査 (道路)		中部地方整備局 4名	調査中
1月4日	石川県志賀町	被災状況調査 (道路)		中部地方整備局 8名	調査中
1月4日	石川県七尾市	被災状況調査 (道路)		中部地方整備局 8名	調査中

○港湾関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月3日	七尾港、輪島港	被災状況調査 (港湾)		国土技術政策総合研究所 1名 金沢港湾・空港整備事務所 3名	帰還済
1月3日	珠洲市（飯田港）	被災状況調査 (港湾)		本省 2名 金沢港湾・空港整備事務所 2名	帰還済
1月3日	輪島市	被災状況調査 (港湾)		中部地方整備局 2名 金沢港湾・空港整備事務所 2名	帰還済
1月3日	小木港、宇出津港	被災状況調査 (港湾)		本局 1名 金沢港湾・空港整備事務所 3名	帰還済
1月3日	石川県庁	港湾管理者との調整（港湾）		本省 1名	支援中
1月3日	北陸地方整備局	「海翔丸」対応調整（港湾）		九州地方整備局 3名	支援中
1月3日	石川県	給水支援（港湾）		九州地方整備局 浚渫兼油回収船「海翔丸」 1船	1月5日到着予定
1月4日	和倉港、半ノ浦港	被災状況調査 (港湾)		敦賀港湾事務所 4名	調査中

1月4日	金沢港	被災状況調査 (港湾)		本省 2名 国土技術政策総合研究所 1名 港湾空港技術研究所 1名 本局 1名	調査中
1月4日	輪島港	被災状況調査 (港湾)		金沢港湾・空港整備事務 所 4名	調査中
1月4日	七尾港	物資支援 (港湾)		敦賀港湾事務所 1名	支援済

○河川関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月2日	石川県志賀町	被災状況調査 (河川)		黒部河川事務所 4名	調査中
1月3日	石川県穴水町	被災状況調査 (河川)		千曲川河川事務所 4名	調査中
1月3日	石川県珠洲市	被災状況調査 (河川)		羽越河川国道事務所 3名 信濃川下流河川事務所 1名	調査中
1月3日	石川県輪島市	被災状況調査 (河川)		金沢河川国道事務所 4名	調査中
1月3日	石川県能登町	被災状況調査 (河川)		信濃川河川事務所 4名	派遣中
1月3日	石川県中能登町	被災状況調査 (河川)		阿賀野川河川事務所 2名 阿賀川河川事務所 2名	調査中
1月3日	石川県能登町	被災状況調査 (砂防)		本局 4名	調査中
1月3日	石川県能登町	被災状況調査 (砂防)		本局 4名	調査中
1月3日	石川県能登町	被災状況調査 (砂防)		松本砂防事務所 4名	調査中
1月3日	石川県能登町	被災状況調査 (砂防)		立山砂防事務所 4名	調査中
1月3日	石川県庁	被災状況調査 (砂防)		湯沢砂防事務所 4名	調査中
1月3日	石川県珠洲市	被災状況調査 (砂防)		飯豊山系砂防事務所 4名	調査中
1月3日	石川県輪島市	被災状況調査 (砂防)		神通川水系砂防事務所 4 名	調査中
1月3日	石川県志賀町、 穴水町	被災状況調査 (砂防)		関東地方整備局 20名	調査中

1月3日	石川県中能登町	被災状況調査 (砂防)		中部地方整備局 20名	調査中
------	---------	----------------	--	-------------	-----

○建物関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月3日	石川県穴水市	応急危険度判定		本局 3名	調査中
1月4日	石川県志賀町	応急危険度判定		関東地方整備局 3名	調査中
1月4日	石川県中能登町	応急危険度判定		関東地方整備局 3名	調査中

○応急対策関係

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
1月4日～ 1月11日	石川県	応急対策		本局 2名 新潟国道事務所 1名 北陸技術事務所 1名	派遣中
1月4日～ 1月11日	石川県	応急対策		信濃川下流事務所 2名 長岡国道事務所 1名 信濃川河川事務所 1名	派遣中

4) 災害対策機械

派遣日	派遣先	機械名	台数	人員	活動状況
1月2日 ～ 1月3日	石川県かほく市 (かほく市役所)	給水車	1台	協力業者 3名 ※1月4日より、中部地方整備局から派遣の車両に引き継ぎ予定	活動中
1月2日 ～ 1月3日	富山県氷見市 (氷見市教育文化センター)	給水車	1台	協力業者 2名 ※1月4日より、中部地方整備局から派遣の車両に引き継ぎ予定	活動中
1月3日	新潟県新潟市西区	照明車	1台	信濃川下流河川事務所 1名 別途、協力業者 2名	現地待機
1月3日	石川県輪島市三井町本江 石川県穴水町北七海	照明車	4台	協力業者 2社 8名	現地待機
1月3日	新潟県上越市茶屋ヶ原	照明車	2台	協力業者 4名	現地待機
1月3日	石川県七尾市石崎町	照明車 排水ポンプ車	1台 1台	協力業者 3名	活動中
1月3日	石川県七尾市 (七尾市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	派遣中
1月3日	石川県珠洲市 (珠洲市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	派遣中

1月3日	石川県輪島市 (輪島市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	派遣中
1月3日	石川県能登町 (能登町役場)	照明車	1台	協力業者 2名	派遣中
1月3日	石川県穴水町 (穴水町役場)	照明車	1台	協力業者 2名	現地待機
1月4日	石川県輪島市 (輪島市役所)	衛星通信車	1台	北陸地方整備局 1名 別途、協力業者 2名	<u>現地待機</u>

7. 防災ヘリ

(ほくりく号)

1月2日 7:35～10:20、11:15～13:00

新潟県・富山県の被災状況調査（港湾）を実施

1月3日 石川県の被災状況調査（河川）は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 13:20～調査中

石川県の被災状況調査（道路）を実施中

(みちのく号)

1月2日 9:52～12:32、13:39～16:20

石川県の被災状況調査（河川・港湾）を実施

1月3日 石川県の被災状況調査（道路）は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 11:13～13:38

石川県の被災状況調査（河川）を実施

(あおぞら号)

1月2日 10:05～12:21、13:32～15:08

石川県の被災状況調査（道路）を実施。関東地方整備局に帰還

8. 物資支援

○石川県

・輪島市：ブルーシート 400枚、土嚢袋 800袋、トラロープ 200m、飲料水

(北陸港湾空港建設協会連合会より)【1/3 到着】

食料 714食、ブルーシート 20枚、簡易トイレ 800個

(中部地方整備局より)【1/3 到着】

仮設トイレ 30台

(日本建設業連合会 北陸支部より)【1/5 出発】

・志賀町：ブルーシート 770枚

(金沢河川国道事務所より)【1/3 到着】

・穴水町：ブルーシート 300枚

(金沢河川国道事務所より)【1/3 到着】

- ・ 珠洲市：ブルーシート 1000 枚、飲料水（500ml）2000 本
 （日本埋立浚渫協会北陸支部）【1/3 到着】
食料 246 食、ブルーシート 80 枚
（金沢港湾・空港整備事務所より）【1/3 到着】
仮設トイレ 17 台
（日本建設業連合会 北陸支部）【移動中】
- ・ 能登町：ブルーシート 400 枚
 （金沢河川国道事務所より）【1/3 到着】
- ・ 七尾市：飲料水（500ml）504 本、食料 294 食、トイレットペーパー 192 ロール
（敦賀港湾事務所より）【1/4 到着】
ブルーシート 300 枚
（金沢河川国道事務所）【輸送中】
- ・ 中能登町：ブルーシート 445 枚、防災シート 81 枚
（金沢河川国道事務所）【輸送中】

○富山県

- ・ 氷見市：飲料水（500ml）480 本
 （富山河川国道事務所より）【1/2 到着】
- ・ 高岡市：ブルーシート 500 枚
 （富山河川国道事務所より）【1/3 到着】
- ・ 魚津市：ブルーシート 100 枚
 （富山河川国道事務所より）【1/3 到着】

9. 関係団体による支援

- ・ 石川県建設業協会の協力により、孤立している七尾市中島町河内地区の町道の道路啓開作業に着手予定

10. その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

URL : <https://www.hrr.mlit.go.jp/>

X(旧 Twitter)

