

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日 時	令和6年1月10日 12時00分
-----------------------	---------------------

件 名	令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について（第19報）
-----	------------------------------------

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------



発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	令和6年1月10日9時00分現在 令和6年1月1日令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について ○大規模な崩落等により通行不能となっている国道249号等の道路啓開活動を展開・継続 ○引き続き、石川県能登地方等におけるTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動等を展開 ※最新の作業状況等について、以下のX（旧 Twitter）に投稿しています。
------	---

北陸地方整備局 ホームページ URL : https://www.hrr.mlit.go.jp/		X(旧 Twitter)	
--	---	--------------	---

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL（代表）025-280-8880 所 属 氏 名 企画部 企画課長 西村 雄喬
--------	--

道路啓開の進捗状況(国道249号 輪島市門前町浦上付近) 国土交通省

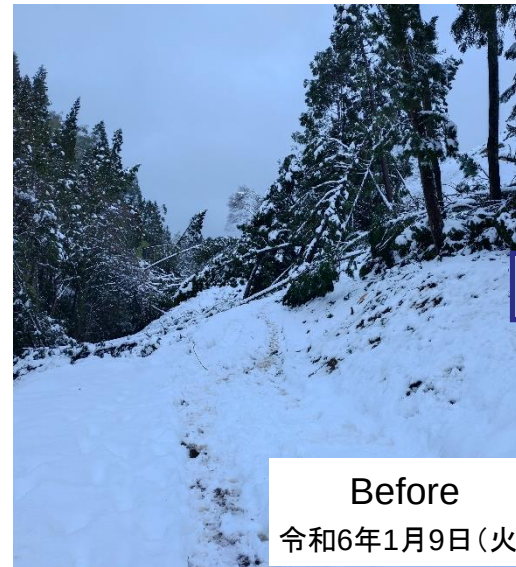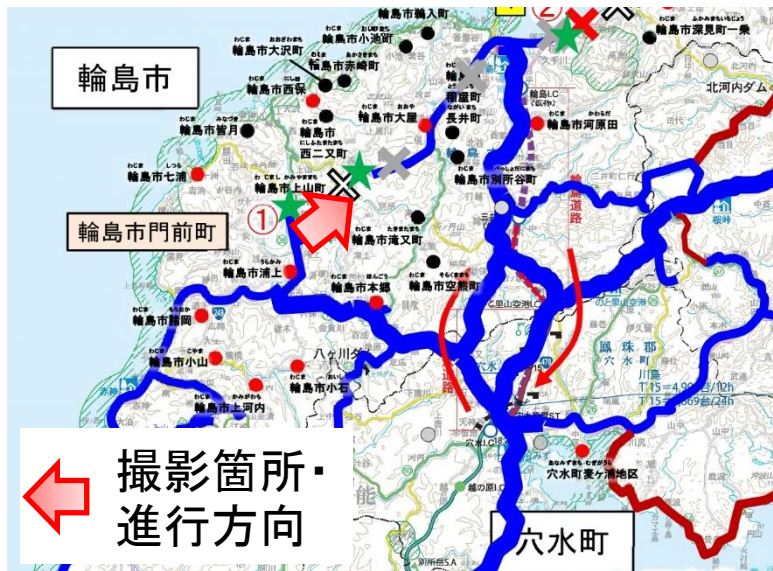

<本日の作業予定>
○道路上の倒木、崩落土砂除去
○引き続き輪島市街地方面へ啓開前進

<昨日の実績>
○倒木、崩落土砂除去を実施

前日の活動状況



令和6年能登半島地震(最大震度7)による土砂災害発生状況

令和6年1月9日 6時00分時点

土砂災害発生件数

53件※1

【被害状況】

人的被害：死者：23名
安否不明者：2名
負傷者：2名

家屋被害：全壊：11戸
半壊：1戸
一部損壊：2戸

(いずれも土砂災害による被害と判明した箇所のみ)

石川県	32件
新潟県	11件
富山県	10件

※1:都道府県から土砂災害発生箇所として報告された件数

①石川県輪島市熊野町



※河道閉塞対策の支援のためTEC-FORCEによる調査実施中

②石川県輪島市市ノ瀬町



※河道閉塞対策の支援のためTEC-FORCEによる調査実施中


すずし にえまち

③石川県珠洲市仁江町

【道の駅す塩田村の西側】

死者：9名
負傷者：2名

撮影：アジア航測(株)・朝日航洋(株)

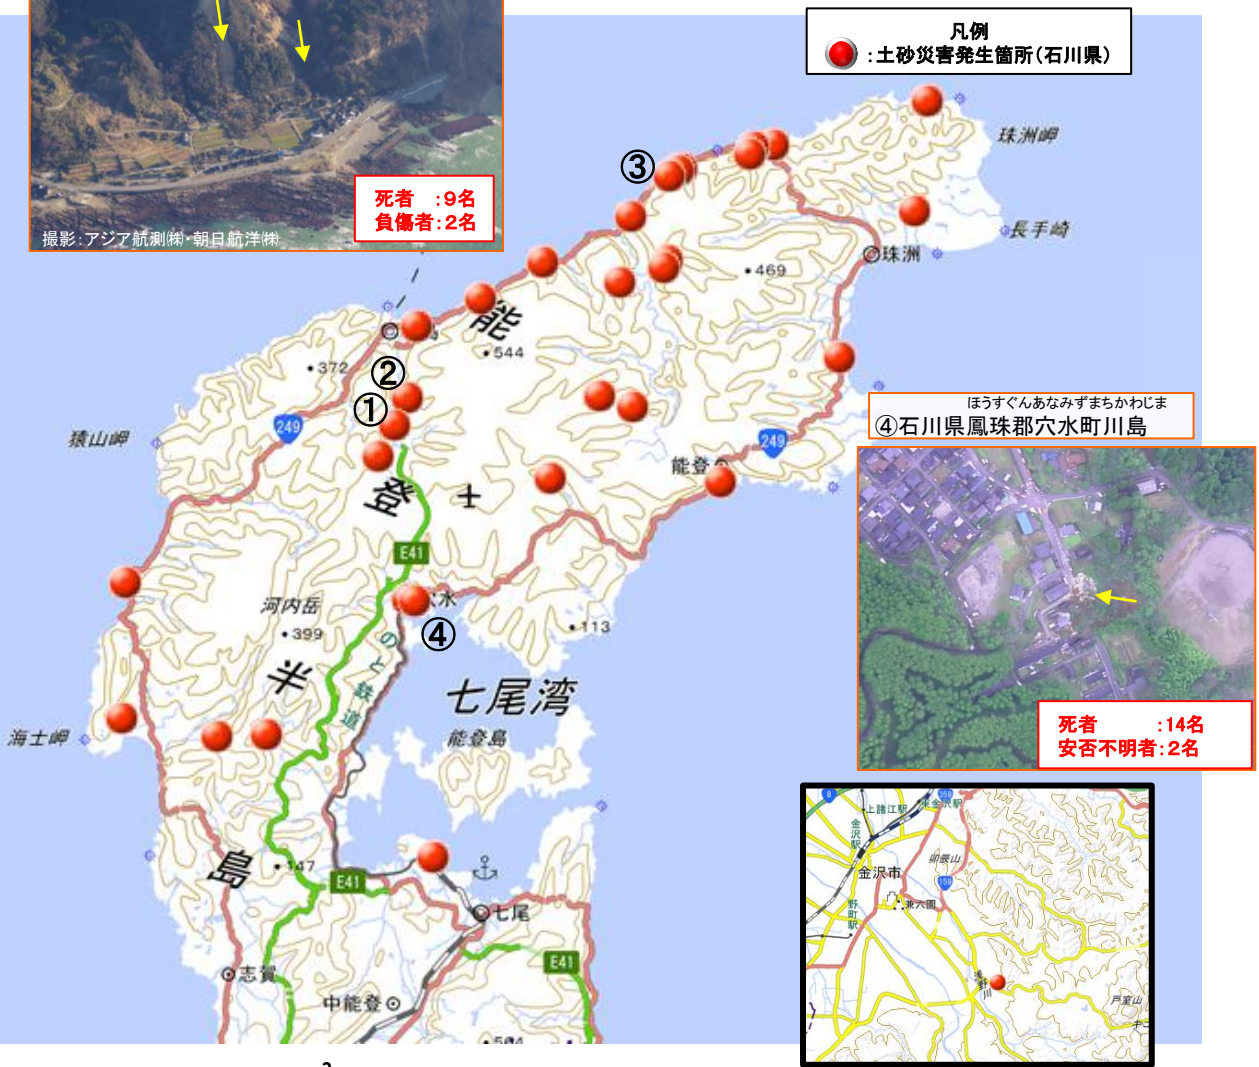

ほうすぐんあなみずまかわじま

④石川県鳳珠郡穴水町川島

死者：14名
安否不明者：2名

※これは速報値であり、今後数値等が変わる可能性があります。



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 被災状況調査班(道路) 活動状況～【東北地方整備局】

1月9日(火)の活動状況

<当日の活動内容>

- 被災状況調査5班で穴水町内の現地調査を実施。(残り1班は調査結果のとりまとめを実施)
- 本日は、80路線の状況調査を実施。(箇所の詳細は今後対応)



【被災状況調査】路面クラック(穴水町字山中)



【被災現況調査】路面の段差確認(穴水町内)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～【関東地方整備局】

1月9日(火)の活動状況

<当日の活動内容>

- ・被害状況調査(輪島市、穴水町、七尾市)

※志賀町は交通事情により未調査

<翌日の活動予定>

- ・被害状況調査(輪島市、穴水町、七尾市)



位置図(調査箇所)



被害状況調査(石川県七尾市中島町小牧)



被害状況調査(石川県輪島市稲舟町)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月9日(火)現地調査概要

河川調査班第1班～第7班により、
2市4町(輪島市、珠洲市、志賀町、
中能登町、穴水町、能登町)で被災
箇所での現地調査及び資料作成等
を実施を実施

1月10日(水)の予定

被災箇所の現地調査を実施



第3班 志賀町被災状況調査



第5班 中能登町資料作成状況



第3班 志賀町資料作成状況



第3班 志賀町被災状況打合せ



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 被災状況調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月9日(火)の活動状況

・当日の活動内容

輪島港及び七尾港の被災状況調査

・翌日の活動予定


飯田港、輪島港、小木港、宇出津港
七尾港、

・その他特記事項

特になし



輪島港 被災状況調査

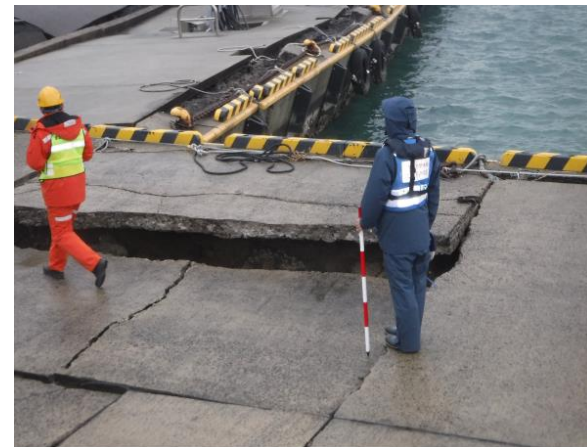

輪島港 被災状況調査



調査箇所: 輪島港、七尾港



七尾港 被災状況調査



七尾港 被災状況調査



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 建築物応急危険度判定班 活動状況～【関東・北陸地方整備局】

1月9日(火)の活動状況
被災建築物の応急危険度判定を実施
(判定実施箇所:穴水町・新潟市)



判定実施箇所: 石川県穴水町・新潟県新潟市



応急危険度判定の様子①
(石川県穴水町)



応急危険度判定の様子②
(石川県穴水町)



応急危険度判定の様子③
(石川県穴水町)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 応急対策班(給水支援) 活動状況～【東北地方整備局】

1月9日(火)の活動状況

田鶴浜コミュニティセンターにおいて、自衛隊第7師団災害派遣隊と協働により、
仮設入浴施設を支援

<当日の活動内容>

- 給水支援: 田鶴浜コミュニティセンターにて給水活動(自衛隊が設営する入浴施設への給水)
①班14:25～14:55 ②班14:50～15:20



給水活動状況

仮設入浴施設(自衛隊設営)

北陸地方整備局対応状況（第19報）

令和6年1月10日9時00分現在

1. 北陸地方整備局の災害対応状況

令和6年能登半島地震に対する被害を警戒し、1月1日16時10分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

2. 北陸地方整備局の防災体制状況

1月10日9時00分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

3. 北陸地方整備局管内 総括情報

1) 人的被害

- 石川県：死者202名（七尾市5名、輪島市81名、珠洲市91名、
羽咋市1名、志賀町2名、穴水町20名、能登町2名）
行方不明者 102名（七尾市1名、輪島市86名、珠洲市15名）
重傷173名（珠洲市軽傷含む）（輪島市9名、珠洲市145名、
志賀町3名、中能登町1名、穴水町5名、能登町10名）
軽傷392名（金沢市9名、七尾市3名、小松市1名、輪島市42名、
羽咋市7名、白山市2名、野々市市1名、津幡町1名、
志賀町75名、中能登町1名、穴水町225名、
能登町25名）
- 富山県：重傷 3名（富山市2名、射水市1名）
軽傷38名（富山市14名、高岡市3名、魚津市2名、氷見市9名、
黒部市5名、砺波市1名、小矢部市2名、射水市2名）
- 新潟県：重傷5名（新潟市1名、長岡市1名、見附市2名、上越市1名）
軽傷43名（新潟市20名、長岡市4名、三条市3名、柏崎市3名、
小千谷市3名、糸魚川市4名、五泉市1名、上越市5名）

2) 物的被害

- 石川県：
 - ・住宅・非住宅被害 多数
（輪島市多数、珠洲市多数、かほく市多数、能登町多数、
内灘町多数、金沢市5件、七尾市359件、加賀市134件、
羽咋市15件、野々市市9件、川北町2件、志賀町71件、
宝達志水町1件、中能登町47件、穴水町1000件）

■富山県：

・住宅・非住宅被害 9 7 4 件

(高岡市 3 1 7 件、魚津市 1 4 件、氷見市 2 0 5 件、
滑川市 1 8 件、黒部市 7 件、砺波市 1 1 件、
小矢部市 3 1 6 件、南砺市 4 件、上市町 1 7 件、立山町 6 件、
入善町 1 5 件、朝日町 4 4 件)

■新潟県：

・住宅・非住宅被害 1, 0 3 0 件

(長岡市 2 件、三条市 6 9 件、柏崎市 6 5 件、新発田市 4 件、
小千谷市 8 件、十日町市 1 3 件、燕市 1 6 7 件、
糸魚川市 1 9 7 件、妙高市 7 件、五泉市 2 8 件、
上越市 3 7 4 件、佐渡市 8 5 件、聖籠町 1 件、阿賀町 8 件、
出雲崎町 1 件、津南町 1 件)

3) 港湾

○現時点での被害状況等

- ・新潟西港（管理者）
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・新潟西港（直轄）
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・新潟東港（直轄）
点検完了。異常なし。
- ・両津港
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・岩船港
点検完了。異常なし。
- ・二見港
点検完了。異常なし。
- ・小木港（新潟県）
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・赤泊港
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・寺泊港
点検完了。異常なし。
- ・柏崎港
点検完了。異常なし。
- ・直江津港
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・姫川港
点検完了。異常なし。

- ・魚津港

点検完了。北地区の荷さばき地、野積場、駐車場、ふ頭内道路、臨港道路の舗装亀裂、段差、土砂噴出。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・伏木富山港（富山地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・伏木富山港（新湊地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

ガントリークレーン 2 基のうち 1 基（NC-1）使用不可（1 基による荷役は可能）。

＜国有港湾施設＞

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・伏木富山港（伏木地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

＜国有港湾施設＞

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

＜補助施設＞

伏木港大橋及び接続する陸橋（左岸側）（通行止め中）

- ・輪島港

1/3 TEC-FORCE（国総研等）調査結果、水平変位約 2 m だが利用は可能。海保調査の結果前面水深の地盤隆起あり。

1/4 輪島港岸壁応急復旧（仮設道路築造）着手、完了。

1/8 マリントウン岸壁防舷材 1 基脱落、設置に向け準備中

1/9 空気式防舷材（4 基）は 1/10 陸送により輪島港運搬予定。設置場所設置方法等は検討中。

- ・飯田港

1/3 TEC-FORCE（港空研等）調査結果、岸壁（-5m）：大きな変位、沈下あり。

利用不可。岸壁（-4.5m）：海側への残留変位あり。背後との段差あり。小型船の係留のみ利用可能。水域の航路啓開が必要。

1/8 岸壁（-4.5m）応急復旧中。1/9 完了

1/9 1/11～13 に飯田地区全体で深浅測量を実施予定。

- ・宇出津港

へりによる被害状況調査

いやさか広場近くの船着場で沈下及びひび割れ。

南第 2 防波堤背後の物揚場（-4.0m）でエプロンひび割れ。南防波堤背後の物揚場（-4.0m）でエプロンの沈下。（直轄）

1/3 14:40 TEC-FORCE 調査完了

- ・小木港（石川県）

1/5 TEC-FORCE（金沢港湾）調査、岸壁（-5m）：はらみ、隆起、沈下あり、利用不可

- ・穴水港

へりによる被害状況調査

物揚場（-4.0m） 2 バースでエプロン沈下。物揚場（-4.0m）で岸壁前出し及び沈下。穴水宝山マリーナでエプロン沈下及び液状化。乗用車がエプロン陥没箇所転落。マリーナ側護岸（遊歩道）背後に土砂崩れ。（直轄）

- ・ 滝港

ヘリによる被害状況調査

物揚場エプロン陥没あり。

物揚場背後の埠頭用地 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)、排水口付近に損傷確認。

物揚場法線 変状は見られない。

護岸背後駐車場 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)、エプロンに陥没あり。(直轄)

- ・ 金沢港

1/4 TEC-FORCE (港空研等) 調査結果、御供田 1、2 号岸壁(-10m)：海側への大きな変位、利用不可。戸水岸壁(-10m)：岸壁はらみ出し等、利用不可。

- ・ 七尾港

1/3 TEC-FORCE (国総研等) 矢田新さん橋 (第一西) (-7.5m) 調査結果、岸壁エプロン及び栈橋に沈下あり、条件付で利用可能。

1/5 TEC-FORCE (国総研等) 矢田新岸壁 (第二東) 調査結果、条件付で利用可能。

- ・ 福浦港

物揚場背後ふ頭に段差あり。臨港道路にひび割れあり。(管理者)

- ・ 塩屋港

特に被害は見当たらない。(管理者)

- ・ 和倉港 (管理者；七尾市)

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

1/4 TEC-FORCE (敦賀港) 調査完了。

- ・ 半ノ浦港 (管理者；七尾市)

1/5 TEC-FORCE (敦賀港) 調査完了。

- ・ 福井港海岸

点検完了。異常なし。

- ・ 敦賀港

点検完了。異常なし。

- ・ 福井港

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・ 和田港

点検完了。異常なし。

- ・ 内浦港

点検完了。異常なし。

- ・ 鷹巣港

点検完了。異常なし。

4) 下水道

○石川県

- ・ 処理場

全 57 箇所 (被害無:33 箇所、機能確保済:18 機能停止 (流入汚水なし):6)

- ・ポンプ場

全 52 箇所（被害無:38 箇所、機能確保済:10 機能停止（流入汚水なし）:4）

- ・管路施設

点検対象 18 市町村（被害無:1 市町村、点検中:17 市町村）

○富山県

- ・処理場

全 29 箇所（被害無:25 箇所、機能確保済:4）

- ・ポンプ場 被害なし

- ・管路施設

点検対象 13 市町村（被害無:6 市町村、点検中:7 市町村）

○新潟県

- ・処理場

全 83 箇所（被害無:79 箇所、機能確保済:4）

- ・ポンプ場 被害なし

- ・管路施設

点検対象 28 市町村（被害無:24 市町村、機能確保済:3 市町村、点検中:1 市町村）

4. 幹線道路の被害状況

1) 高速道路（通行止めなし）

2) 直轄国道（2 路線、3 箇所）

- ・ R 8 上越市茶屋ヶ原（上下） 土砂崩落 通行止

- ・ R 4 7 0 七尾 I C ～七尾城山 I C（上下） 通行止

※1 月 10 日 10:00 に通行止め解除

- ・ R 4 7 0 のと三井 I C ～穴水 I C（上下） 通行止

3) 補助国道（3 路線、2 8 箇所）

＜新潟県：＞

- ・被災の箇所なし

＜富山県：2 路線、3 箇所＞

＜石川県：2 路線、2 5 箇所＞

4) 都道府県道等（6 5 路線、8 9 箇所）

＜新潟県：2 4 路線、2 4 箇所＞

＜富山県：5 路線、5 箇所＞

＜石川県：3 6 路線、6 0 箇所＞

国道 2 4 9 号等において、大規模な崩落等を多数確認。日本建設業連合会の協力を得て、道路啓開を実施中

5. 河川関係等の被害状況

1) 直轄

(直轄河川)

・石川県

○震度5強

手取川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

梯川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・富山県

○震度5強

常願寺川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

神通川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

小矢部川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所

庄川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
堤防天端の亀裂1カ所

○震度5弱

黒部川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・新潟県

○震度6弱

信濃川下流：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤体の沈下3カ所、堤防天端の亀裂4カ所、
堤防法面の亀裂1カ所

信濃川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所

○震度5強

関川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 護岸損傷1カ所、舗装クラック1カ所、
特殊堤損傷1カ所

姫川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

○震度5弱

阿賀野川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・長野県

○震度5弱

千曲川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

(直轄ダム)

・石川県

○震度4

手取川ダム 1次点検完了 異常なし

・富山県

○震度4

宇奈月ダム 1次点検完了 異常なし

- ・新潟県
 - 震度 5 強
 - 三国川ダム 1 次・2 次点検完了 異常なし
 - 震度 4
 - 大石ダム 1 次点検完了 異常なし
- ・山形県
 - 震度 4
 - 横川ダム 1 次点検完了 異常なし

(直轄砂防)

- ・立山砂防事務所：点検対象市町村数 2 市町、点検完了 異常なし
- ・神通川水系砂防事務所：点検対象市町村数 2 市、点検完了 異常なし
- ・阿賀野川河川事務所：点検対象市町村数 1 町、点検完了 異常なし

(直轄海岸)

- ・石川県：石川海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、
巡視完了 異常なし
- ・富山県：下新川海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、
巡視完了 異常なし
- ・新潟県：新潟海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、
巡視完了 異常なし

2) 都道府県

(補助河川)

- ・石川県：点検対象 6 2 水系 2 1 2 河川、点検中 6 5 河川で護岸の沈下・河道閉塞等あり
- ・富山県：点検対象 1 4 水系 2 8 河川、点検完了 1 2 河川で護岸の沈下等あり
- ・新潟県：点検対象 4 5 水系 2 9 6 河川、点検完了 9 河川で護岸の沈下等あり
- ・長野県：点検対象 1 水系 2 河川、点検完了 異常なし
- ・岐阜県：点検対象 1 水系 1 河川、点検完了 異常なし

(補助ダム)

- ・石川県：点検対象 1 1 ダム 点検完了 1 1 ダム うち 9 ダム 被害なし、
うち 2 ダム 損傷あり（北河内ダム：貯水池周辺斜面小規模崩落、ダム堤内のポンプ故障、小屋ダム：ダム天端舗装に一部クラック、ダム堤体表面被覆の一部変状等）
- ・富山県：点検対象 1 6 ダム 点検完了 1 6 ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象 1 8 ダム 点検完了 1 8 ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象 8 ダム 点検完了 8 ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし

(利水ダム)

- ・石川県：点検対象 10 ダム 点検完了 10 ダム 被害なし
- ・富山県：点検対象 37 ダム 点検完了 37 ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象 39 ダム 点検完了 39 ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象 8 ダム 点検完了 8 ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象 11 ダム 点検完了 11 ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象 18 ダム 点検完了 18 ダム 被害なし
- ・山形県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし

(補助砂防)

- ・石川県：点検対象市町村数 15 市町、点検中
- ・富山県：点検対象市町村数 12 市町、点検完了 12 市町 施設異常なし
- ・新潟県：点検対象市町村数 28 市町村、点検完了 28 市町村 施設異常なし

(補助海岸)

- ・石川県：25 海岸 17 海岸点検完了。
4 海岸で天端被覆工沈下、護岸被災等あり。
その他異常なし。その他順次点検予定。
- ・富山県：7 海岸 7 海岸点検完了。異常なし。
- ・新潟県：27 海岸 27 海岸点検完了。異常なし。

6. 自治体支援の状況

1) ホットライン

- ・震度 5 弱以上を観測した 37 市 14 町 3 村とのホットライン確立済み
- ・支援要請調整中

2) リエゾン・TEC-FORCE

- ・令和 6 年 1 月 10 日 9 時現在、127 班 413 人を派遣中。
詳細は別表のとおり

3) 災害対策機械

派遣日	派遣先	機械名	台数	人員	活動状況
1 月 2 日～ 1 月 4 日	石川県かほく市 (かほく市役所)	給水車	1 台	協力業者 3 名 ※1 月 4 日より、中部地方整備局から派遣の車両による支援	活動終了
1 月 4 日～	石川県かほく市 (かほく市役所)	給水車	1 台	中部地方整備局 1 名 協力業者 4 名	活動終了
1 月 2 日～ 1 月 4 日	富山県氷見市 (氷見市教育文化センター)	給水車	1 台	協力業者 2 名 ※1 月 4 日より、中部地方整備局から派遣の車両による支援	活動終了

1月4日～	富山県氷見市 (氷見ふれあいスポーツセンター他)	給水車	1台	中部地方整備局 1名 協力業者 4名	活動中
1月4日～	石川県珠洲市	給水車	4台	関東地方整備局 3名 協力業者 4社 10名	活動中
1月4日	石川県七尾市	給水車	1台	近畿地方整備局 1名 協力業者 3名	活動終了
1月5日～	石川県中能登町	給水車	2台	近畿地方整備局 2名 協力業者 2社 7名	活動中
1月5日～	石川県能登町	給水車	6台	協力業者 6社 11名	活動中
1月6日～	石川県志賀町	給水車	1台	中国地方整備局 2名 協力業者 3名	活動中
1月4日	新潟県上越市茶屋ヶ原	照明車	2台	協力業者 4名	現地待機
1月4日～	石川県七尾市石崎町	照明車 排水ポンプ車	1台 1台	協力業者 3名	活動中
1月4日～ 1月5日	石川県七尾市中島町河内	照明車	1台	協力業者 2社 4名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県珠洲市 (珠洲市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県輪島市 (輪島市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県能登町 (能登町役場)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県穴水町 (穴水町役場)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日	石川県中能登町 (中能登町役場)	照明車	1台	協力業者 1名	活動終了
1月4日～	石川県志賀町 (志賀町役場)	照明車	1台	関東地方整備局 2名 協力業者 1名	現地待機
1月5日～	石川県輪島市 (国道249号道路啓開)	照明車	9台	協力業者 9社	活動中
1月7日～	石川県輪島市 (国道249号道路啓開)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	活動中
1月4日	石川県珠洲市 (輪島市役所)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月5日～	石川県穴水町 (穴水町役場)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	活動中
1月2日～	石川県輪島市、珠洲市	Car-SAT	1台	北陸地方整備局 2名	活動中
1月5日～	石川県輪島市、珠洲市	Car-SAT	2台	中部地方整備局 2名 関東地方整備局 2名	活動中

1月6日～	石川県珠洲市	照明車 (電源供給)	5台	中国地方整備局	活動中
1月7日～	石川県輪島市	照明車 (電源供給)	<u>6</u> 台	関東地方整備局	活動中

4) 可搬式浄水装置による給水支援

- ・可搬式浄水装置2台(水資源機構が保有)を派遣(石川県珠洲市)
生活用水給水開始、飲料の水質検査中(1月5日～)

7. 防災ヘリ

(ほくりく号)

1月2日 7:35～10:20、11:15～13:00

新潟県・富山県の被災状況調査(港湾)を実施

1月3日 石川県の被災状況調査(河川)は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 13:20～15:55

石川県の被災状況調査(道路)を実施

1月5日 9:22～12:00、13:30～16:15

石川県の被災状況調査(河川)を実施

1月9日 10:20～11:20

石川県の被災状況調査(道路)を実施

(みちのく号)

1月2日 9:52～12:32、13:39～16:20

石川県の被災状況調査(河川・港湾)を実施

1月3日 石川県の被災状況調査(道路)は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 11:13～13:38

石川県の被災状況調査(河川)を実施

1月5日 11:43～14:15

石川県の被災状況調査(道路)を実施。東北地方整備局に帰還

(あおぞら号)

1月2日 10:05～12:21、13:32～15:08

石川県の被災状況調査(道路)を実施。関東地方整備局に帰還

8. 物資支援

令和6年1月9日12:00時点に各自治体に提供された数量

※1月1日～1月9日12時時点の物資・資材支援の集計で速報値であり、今後変わる場合があります。

■支援物資提供者

- ・北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、九州地方整備局
- ・村上市
- ・国立研究開発法人 土木研究所
- ・一般社団法人 日本建設業連合会
- ・一般社団法人 石川県建設業協会
- ・一般社団法人 長野県建設業協会
- ・一般社団法人 日本埋立浚渫協会
- ・北陸港湾空港建設協会連合会
- ・イオン株式会社

■支援内容 ※（ ）は前回報告からの増分

①石川県

<珠洲市>

飲料水 (0.5ℓ)	3,536 本 (0 本)	ブルーシート	3,300 枚 (0 枚)	
飲料水 (1.5ℓ)	2,184 本 (0 本)	土嚢袋	15,490 個 (0 個)	
飲料水 (2.0ℓ)	2,144 本 (0 本)	トラロープ	1,000m (0m)	
給水袋	277 個 (0 個)	簡易トイレ袋	2,100 袋 (0 袋)	
食料	2,630 食 (0 食)	仮設トイレ	46 台 (0 台)	
カイロ	90 個 (0 個)			等

<輪島市>

飲料水 (0.5ℓ)	12,400 本 (0 本)	ブルーシート	2,260 枚 (0 枚)	
飲料水 (1.5ℓ)	1,312 本 (0 本)	土嚢袋	800 個 (0 個)	
飲料水 (2.0ℓ)	598 本 (0 本)	トラロープ	200m (0m)	
給水袋	<u>1,290 個 (900 個)</u>	投光器	10 台 (0 台)	
食料	13,894 食 (0 食)	仮設トイレ	10 個 (0 個)	
カイロ	900 個 (0 個)	簡易トイレ	900 個 (0 個)	
衛生用品	3,200 個 (0 個)	非常用トイレ	300 個 (0 個)	等

<能登町>

飲料水 (0.5ℓ)	1,200 本 (0 本)	ブルーシート	830 枚 (0 枚)	
飲料水 (1.5ℓ)	294 本 (0 本)	投光器	5 台 (0 台)	
飲料水 (2.0ℓ)	360 本 (0 本)	簡易トイレ	50 個 (0 個)	
食料	692 食 (0 食)	カラーコーン	300 個 (0 個)	
カイロ	60 個 (0 個)	バリケード	100 本 (0 本)	等

<七尾市>

飲料水 (0.5ℓ)	504 本 (0 本)	ブルーシート	500 枚 (0 枚)	
食料(食)	294 食 (0 食)	カラーコーン	500 個 (0 個)	
カイロ	2,000 個 (0 個)	投光器	10 台 (0 台)	等

<中能登町>

ブルーシート 645 枚 (0 枚)
 防災シート 81 枚 (0 枚)

土嚢袋 400 袋 (0 枚)

等

<穴水町>

飲料水 (0.5ℓ) 5,216 本 (0 本)
 飲料水 (1.5ℓ) 126 本 (0 本)
 飲料水 (2.0ℓ) 144 本 (0 本)
 食料 835 食 (0 食)
 仮設トイレ 12 個 (0 個)

ブルーシート 610 枚 (0 枚)
 投光器 5 台 (0 台)
 簡易トイレ 3,800 個 (0 個)
 カイロ 150 個 (0 個)

<宝達志水町>

ブルーシート 850 枚 (0 枚)

<志賀町>

ブルーシート 772 枚 (0 枚)
 マスク 30,000 枚 (0 枚)
 ウエットティッシュ 1,944 箱 (0 箱)

トラロープ 200m (0m)
 アルコール 300ℓ (0ℓ)
 土嚢袋 2,600 袋 (0 袋)

<羽咋市>

土嚢袋 5,528 袋 (0 袋)

ブルーシート 100 枚 (100 枚)

<内灘町>

土嚢袋 5,000 袋 (5,000 袋)
白シート 16 枚 (16 枚)

ブルーシート 1,011 枚 (1,011 枚)
カラーコーン 100 個 (100 個)

②富山県

<氷見市>

飲料水 (0.5ℓ) 1,080 本 (480 本)
カラーコーン 100 個 (100 個)

ブルーシート 500 枚 (500 枚)
土嚢袋 1,000 袋 (1,000 袋)

<高岡市>

ブルーシート 437 枚 (0 枚)

土嚢袋 10,000 袋 (0 袋)

<魚津市>

ブルーシート 100 枚 (0 枚)

<射水市>

カラーコーン 100 個 (100 個)
コーンウエイト 60 個 (60 個)

コーンバー 50 個 (50 個)
常温合材 50 袋 (50 袋)

9. 関係団体による支援

- ・石川県建設業協会の協力により、孤立している七尾市中島町河内地区の町道の道路啓開作業を展開（1月5日8:40作業完了⇒9:00孤立解消）
- ・日本埋立浚渫協会北陸支部及び中部支部により、珠洲市への支援物資輸送に着手。搬入完了
- ・九州地方整備局浚渫兼油回収船「海翔丸」で支援物資を輸送し七尾港に到着。日本埋立浚渫協会北陸支部が輪島市への陸上輸送を実施（1月5日物資の搬入完了）
- ・国道249号において、大規模な崩落等を多数確認。日本建設業連合会の協力を得て、道路啓開を実施または準備中
- ・建設電気技術協会北陸支部へ電気通信施設の応急対策を要請。
- ・日本埋立浚渫協会に緊急復旧を要請
 - 1/4～1/5 輪島港マリンタウン岸壁(-7.5m)背後の仮設道路築造完了
- ・海洋調査協会に被災した港湾の測量調査を要請
 - 1/8 七尾港 大田岸壁調査予定、以降その他港湾を調査予定
- ・日本潜水協会に入出港時に支障となる障害物の潜水調査を要請
 - 1/8 飯田港 岸壁(-4.5m)前面潜水調査完了
 - 1/9 輪島港 マリンタウン岸壁(-7.5m)前面潜水調査完了
 - 1/10 小木港 岸壁(-4.5m)前面潜水調査予定
- ・北陸港湾空港建設協会連合会に輪島市へ支援物資輸送を要請
- ・「フェリー栗国」（宮城県延岡進行1/9出港）が1月10日金沢港入港予定。金沢港で資機材積み込み後、輪島港入港予定。

※その他、物資支援に関与を受けた機関については「8. 物資支援」を参照

10. その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

URL : <https://www.hrr.mlit.go.jp/>



X(旧 Twitter)



TEC-FORCE派遣状況

【別表】

令和6年1月10日_0900時点

区分	所属	派遣先	班数	人数
本省班	本省	石川県庁	1	5
先遣隊（総合司令班）	東北地整		2	6
	関東地整		1	4
	中部地整		1	4
	近畿地整		1	3
	中国地整		1	4
	国総研		1	1
リエゾン	本局	新潟県庁	-	-
	本局	石川県庁	1	7
	本局	富山県庁	-	-
	信濃川	長岡市	-	-
	本局	志賀町	1	1
	本局	穴水町	1	1
	本局	七尾市	1	1
	本局	輪島市	1	2
	新潟技調	輪島市	-	-
	港湾空港部	輪島市	1	1
	港湾空港部	珠洲市	1	1
	本局	珠洲市	1	3
	新潟技調	珠洲市	-	-
	新潟港湾	珠洲市	-	-
	本局	中能登町	1	1
	本局	能登町	1	1
道路啓開班	本局	道路啓開支援センター (能登空港 多目的広場)	1	2
	本局、長国、金沢河 国、富山河国	輪島市、珠洲市	4	8
道路調査班（市道）	新国	-	-	-
	長国	-	-	-
	関東地整	志賀町	5	20
	関東地整	中能登町	-	-
	中部地整	七尾市	5	20
	中部地整	志賀町	-	-
	中部地整	かほく市	-	-
	東北地整	穴水町	6	24
	近畿地整	珠洲市	6	24
	中国地整	輪島市	5	21
	中国地整	能登町	1	4
砂防調査班	本局	能登町	2	8
	本局	輪島市	-	-
	湯沢	石川県庁	1	4

区分	所属	派遣先	班数	人数
	湯沢	能登町	1	4
	立山	能登町	1	4
	飯豊	珠洲市	1	4
	飯豊	輪島市	1	4
	松本	能登町	1	4
	松本		1	4
	神通	輪島市	1	4
	神通	能登町	-	-
	東北地整	珠洲市	5	20
	関東地整	七尾市	1	4
	関東地整	志賀町	1	4
	関東地整	穴水町	1	4
	関東地整	輪島市	3	12
	中部地整	輪島市	4	16
	近畿地整	輪島市	5	20
	中国地整	能登町	3	12
河川調査班	羽越+信下	珠洲市	1	4
	信濃川	能登町	1	4
	利賀	志賀町	1	4
	千曲	穴水町	1	4
	阿賀野川+阿賀川	中能登町	1	4
	金沢河国、黒部	輪島市	2	6
港湾調査班	金沢港湾 本省 港空研 中部地整	輪島港、七尾港	3	13
	敦賀港湾	七尾市	-	-
被災地支援班（港湾） 海翔丸にて支援物資輸送	九州地整	七尾湾	-	-
建築物応急危険度判定班	本省	珠洲市	1	3
	関東地整	輪島市	2	6
	中部地整	珠洲市	1	3
	近畿地整	珠洲市	1	3
	本局	新潟市	1	3
応急対策班（散水車・照明車）	本局、新国、北技	富山BC	1	4
	信濃川、信下、長国	富山BC	1	4
	富山河国	氷見市	-	-
	富山河国	かほく市	-	-
	東北地整（散水車）	七尾市	2	4
	関東地整（散水車）	珠洲市	1	2
	中部地整（散水車）	氷見市	1	1
	中部地整（散水車）	かほく市	1	1
	近畿地整（散水車）	中能登町	2	4
	中国地整（散水車）	志賀町、能登町	1	2

区分	所属	派遣先	班数	人数
	関東地整（照明車）	志賀町、輪島市	1	2
	中部地整（照明車）	珠洲市	1	2
	中国地整（照明車）	珠洲市	2	2
水道支援班	北海道		1	2
	東北地整		1	2
	関東地整		1	4
	中部地整		1	2
	近畿地整		1	2
	中国地整		1	2
	四国地整		1	2
電源支援班	関東地整	輪島市	1	4
	関東地整	富山BC	1	1
	中国地整	珠洲市	1	2
ヘリサット		河川、道路	2	2
衛星通信車（CAR-SAT）	松本砂防	珠洲市	1	1
	中部地整	輪島市門前町	1	1
	関東地整	輪島市	1	2
			127	413
