

平成19年新潟県中越沖地震被災状況


(第7報) [平成19年7月23日 19:00 現在]

町軽井緊急災害復旧工事の切り返し盛土作業状況



緊急復旧工事で河川 堤防の機能を回復！

堤防の亀裂が確認された燕市野中才地先では、上下流とも盛土が完了し、河川堤防の機能を回復しました。また、長岡市寺泊町軽井地先では堤防護岸のじゃかご工と堤防の亀裂部分の切り返し盛土を施工中です。

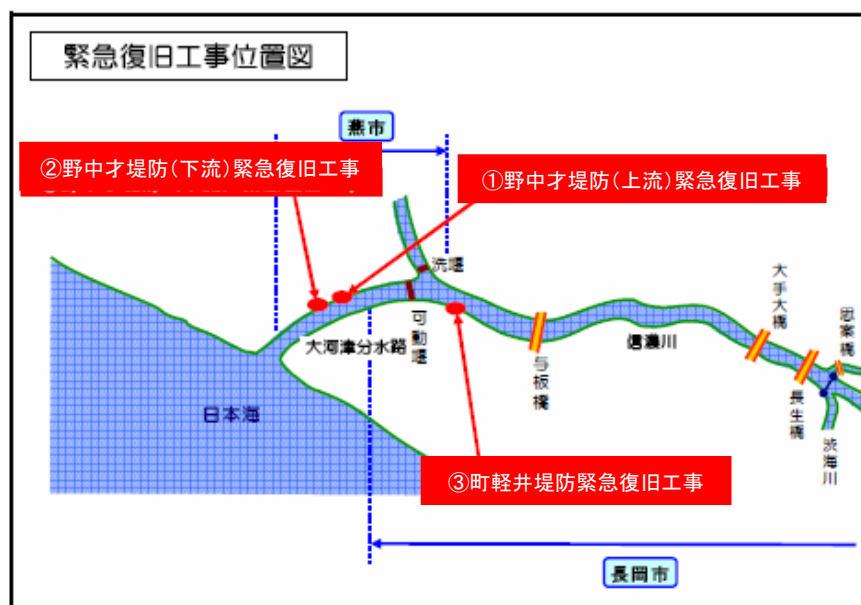

のなかさい

①野中才堤防(上流)緊急復旧工事


上層路盤工が完了しました。引き続き、舗装の復旧を実施します。

○23日までの実施状況:

アスファルト舗装(基層)

○24日実施予定:

アスファルト舗装(基層)

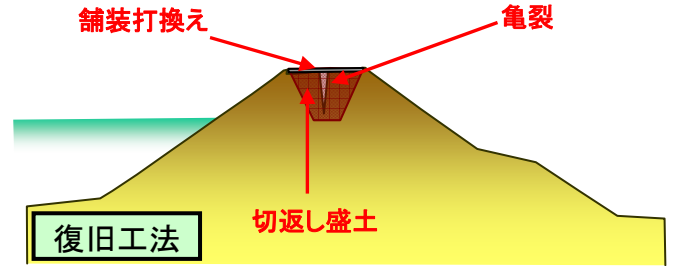

※切返し盛土: 亀裂により空洞となっている部分を一度掘削し、再度念入りに締固めを行います。



亀裂状況: ピンが全て入ってしまうため、亀裂の深さは100cm以上あります。



亀裂の部分を含め掘削しているところです。



掘削、埋戻し、路盤整正の後、舗装復旧しているところです。

のなかさい

②野中才堤防(下流)緊急復旧工事

築堤盛土が完了し、堤防の機能が回復しました。引き続き、路盤の整正を実施します。

○23日までの実施状況:

下層路盤工

○24日実施予定:

上層路盤工

復旧工法

※ 工法は、野中才堤防(上流)緊急復旧工事と同じです。



石灰で、亀裂を確認し、掘削しているところです。



掘削後、盛土を完了したところです。




盛土完了後、路盤整正しているところです。

まちかるい
③町軽井堤防緊急復旧工事

堤防護岸の亀裂が発生した部分については、じゃかごにより覆う工事が完了しました。
 一方、堤防の亀裂箇所では切り返し盛土を施工中です。

- 23日までの実施状況：
 県道部掘削、盛土260m
 県道部舗装撤去280m
 県道部L型側溝100m
 ○24日実施予定：
 県道切り返し盛土



亀裂が入ったところまで掘削が完了し、再度念入りに締固めを行っているところです。




掘削後、埋戻し、締固めを修正しているところです。



100m区間で舗装が完了しました。

- 23日までの実施状況：
 じゃかご工30m
 (損傷部完了・引き続き上段部を施工)
 ○24日実施予定：
 じゃかご工(上段部)

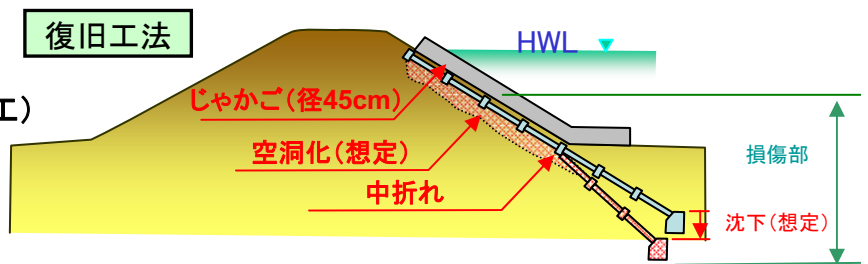

高水護岸の中折れ部分です。沈下により、護岸に開きができています。



敷き均した後、じゃかご工を行います。じゃかご工は、鉄製の網の中に石を詰める応急復旧工法です。



堤防護岸の損傷部へのじゃかご設置を完了しました。引き続き上段部を施工中です。

長岡市与板町岩方地先において大きな亀裂を発見

本日、長岡市与板町岩方地先の河川敷において田面に大きな亀裂が発見されました。亀裂は延長約800m、幅50cm程度、深さ1.0m程度です。



本日の作業状況

■23日の対応

月日	主な動き
7月23日	<p>～ 引き続き、長岡市寺泊町軽井地先、燕市野中才(上・下流)の3箇所にて緊急復旧工事を実施</p> <ul style="list-style-type: none">○長岡市寺泊町軽井地先でボーリング調査を引き続き実施○ヘリコプターによる上空からの調査を実施○与板橋下流の堤防点検実施 <p>○記者発表第19報「緊急災害復旧工事の実施状況」(9:00発表) ○記者発表第20報「緊急災害復旧工事の実施状況」(18:00発表)</p>

■16日～22日の対応

※内容を確認されたい方は、事務所HPをご覧ください。

アドレス<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/info.html>

■信濃川・大河津分水路 被災概要図を事務所HPに掲載しました。

問い合わせ先

国土交通省北陸地方整備局
信濃川河川事務所
TEL(0258)32-3020(代表)
<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>
