




関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所
〈第18号〉 令和 2年 8月

「関川砂防通信」第18号をお届けします。

- 現在、主に3件の砂防工事を推進しています。
- 工事の進捗状況は次ページに掲載しています。
- 次号は9月中旬に発行する予定です。

飯豊山系砂防事務所管内図

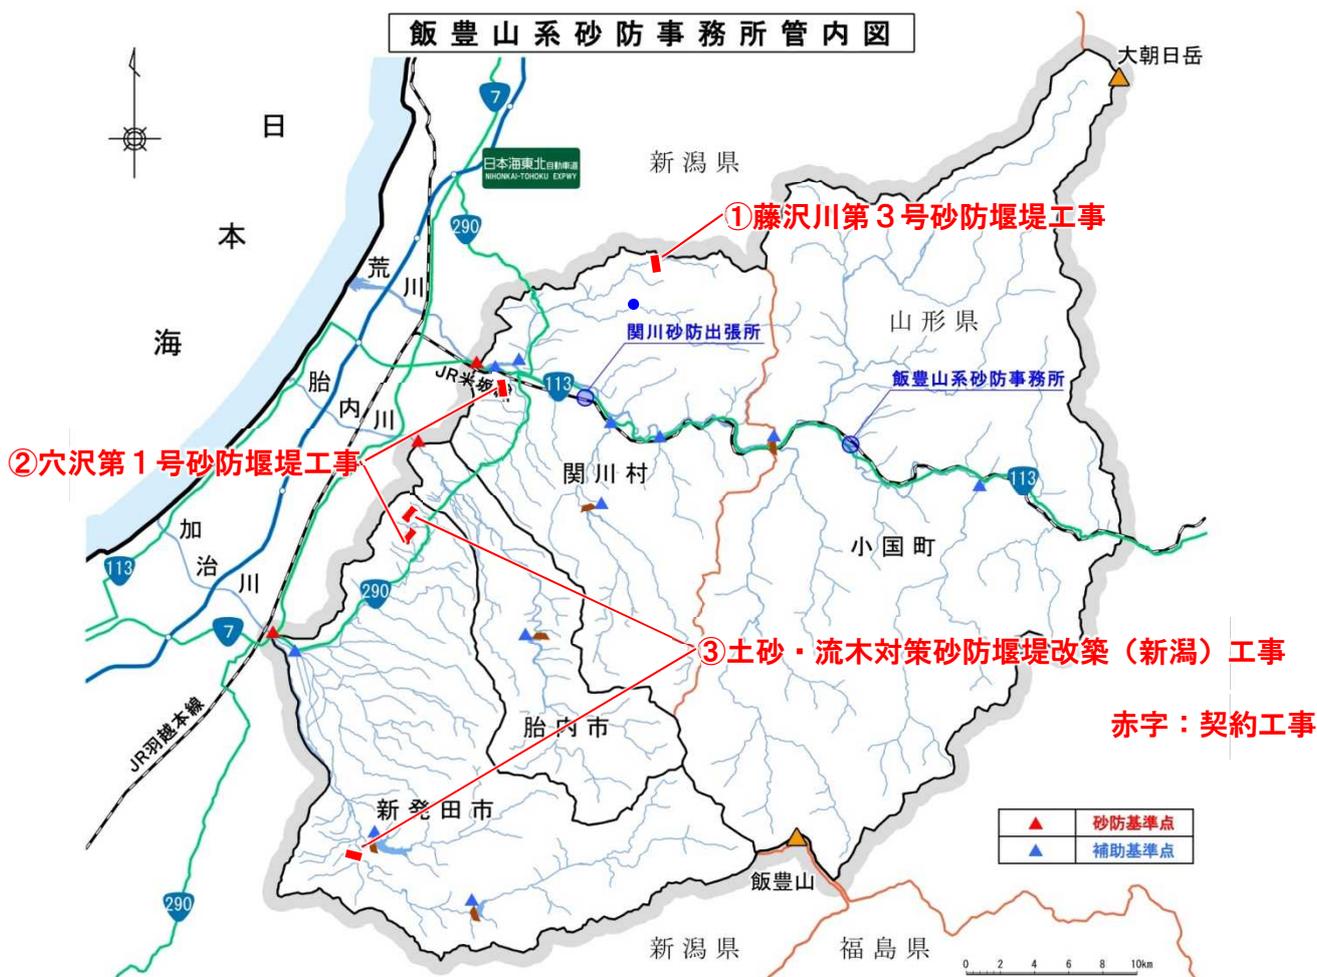

番号	工事名	受注者名	全体工期	主な内容
①	藤沢川第3号砂防堰堤工事	(株)加藤組	H31. 3. 26~R 2. 8. 31	砂防堰堤(藤沢川)
②	穴沢第1号砂防堰堤工事	(株)伊藤組	R 2. 3. 20~R 2. 12. 23	砂防堰堤(穴沢、下土沢)
③	土砂・流木対策砂防堰堤改築(新潟)工事	新発田建設(株)	R 2. 6. 23~R 2. 12. 20	砂防堰堤(日光沢、杉ノ沢)

発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2


TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025



① 藤沢川第3号砂防堰堤工事 : (株)加藤組

【緊急3カ年対策】

岩船郡関川村中東地先の藤沢川において、第3号砂防堰堤を整備しています。

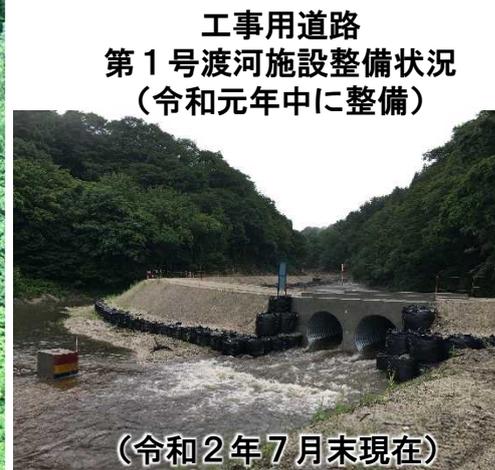

現在、準備(工事用道路等)工事をしています。

工事用道路
第2号渡河施設整備状況
(令和2年春に整備)



工事用道路
第3号渡河施設整備状況
(現在整備中)



工事用道路
第4号渡河施設整備状況
(現在整備中)



【緊急3カ年対策】とは

近年激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している状況から、総理大臣からの指示を受け、とりまとめられた「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」等を踏まえ、特に緊急に実施すべき対策として、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が、閣議決定されました。

国土交通省では、所管する分野において、総点検の結果や得られた教訓等を踏まえ、ソフト・ハードの両面から集中的に取り組んでいます。

<国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo01_hh_000028.html>

② 穴沢砂防第1号砂防堰堤工事 : (株)伊藤組

新発田市下中山地先の穴沢において、第1号砂防堰堤を整備しています。また、岩船郡関川村下土沢地先の下土沢砂防堰堤の補強対策を整備します。

穴沢第1号砂防堰堤

【緊急3カ年対策】



本堰堤下流（前庭保護工）を整備し、堰堤を完成させます。

下土沢砂防堰堤

【緊急3カ年対策】



堰堤上流でワイヤーネットにより補強します。
(令和2年7月末現在)



堰堤までの工事用道路を整備します。

③土砂・流木対策砂防堰堤改築（新潟）工事 : 新発田建設（株）

新発田市下中山地先の加治川水系坂井川支溪日光沢において、砂防堰堤の管理用道路を整備しています。また、新発田市上赤谷地先（杉ノ沢）において、砂防堰堤2基を整備しています。

日光沢砂防堰堤



（令和2年7月末現在）

本堰堤の右岸袖上に管理用道路を整備し、堰堤を完成させます。

杉ノ沢砂防堰堤

第1号砂防堰堤



（令和2年7月末現在）

本堰堤の下流の流末などを整備し、堰堤を完成させます。

第2号砂防堰堤



本堰堤の下流の前庭保護工、流末などを整備し、堰堤を完成させます。
