



【通行止め情報(第8報)】 かたかけ 国道41号(富山市片掛地区)

○通行止めしている区間の早期開放を図るため、当面、応急組立橋による復旧を進めています。復旧完了は、5月下旬になる見通しとなりましたので、お知らせします。

※前報からの更新情報はアンダーライン

● 通行止め情報(令和2年4月22日(水)14:00現在)

1. 令和2年4月10日(金)14時00分通行止め実施(別紙1)

- ・通行止め区間(約2.7km) :

いのたに

猪谷地区(国道360号交差点) ～ ほそいり 片掛地区(「道の駅」細入)

※迂回路なし ※人的、通行車両被害なし ※孤立集落なし

- ・被災規模 幅:約20m、斜面長さ:約40m

2. 対応状況

- ・路面変状監視用の伸縮計(3箇所)設置完了。
- ・2箇所目のボーリング(深さ22m)掘進が完了し、地盤変状計測機器の設置完了。(計2箇所で観測開始)
- ・現在、当面の対策として、応急組立橋による国道の復旧を実施中。
(別紙2)

3. 今後の予定

- ・地盤変状の観測を継続しつつ、委員会で今後の対応方針を検討。
- ・応急組立橋による復旧完了は、5月下旬となる見通し。
(通行止め解除の詳細な日時については、後日、お知らせします。)

お問い合わせ先


■ 調査第二課長 たかた 高田 ひでかず 英和 TEL : 076-443-4717 (直通)
FAX : 076-443-4718



国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所
TEL : 076-443-4701(代)(夜間・休日)


おくだしんまち
〒930-0837 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

● 位置図

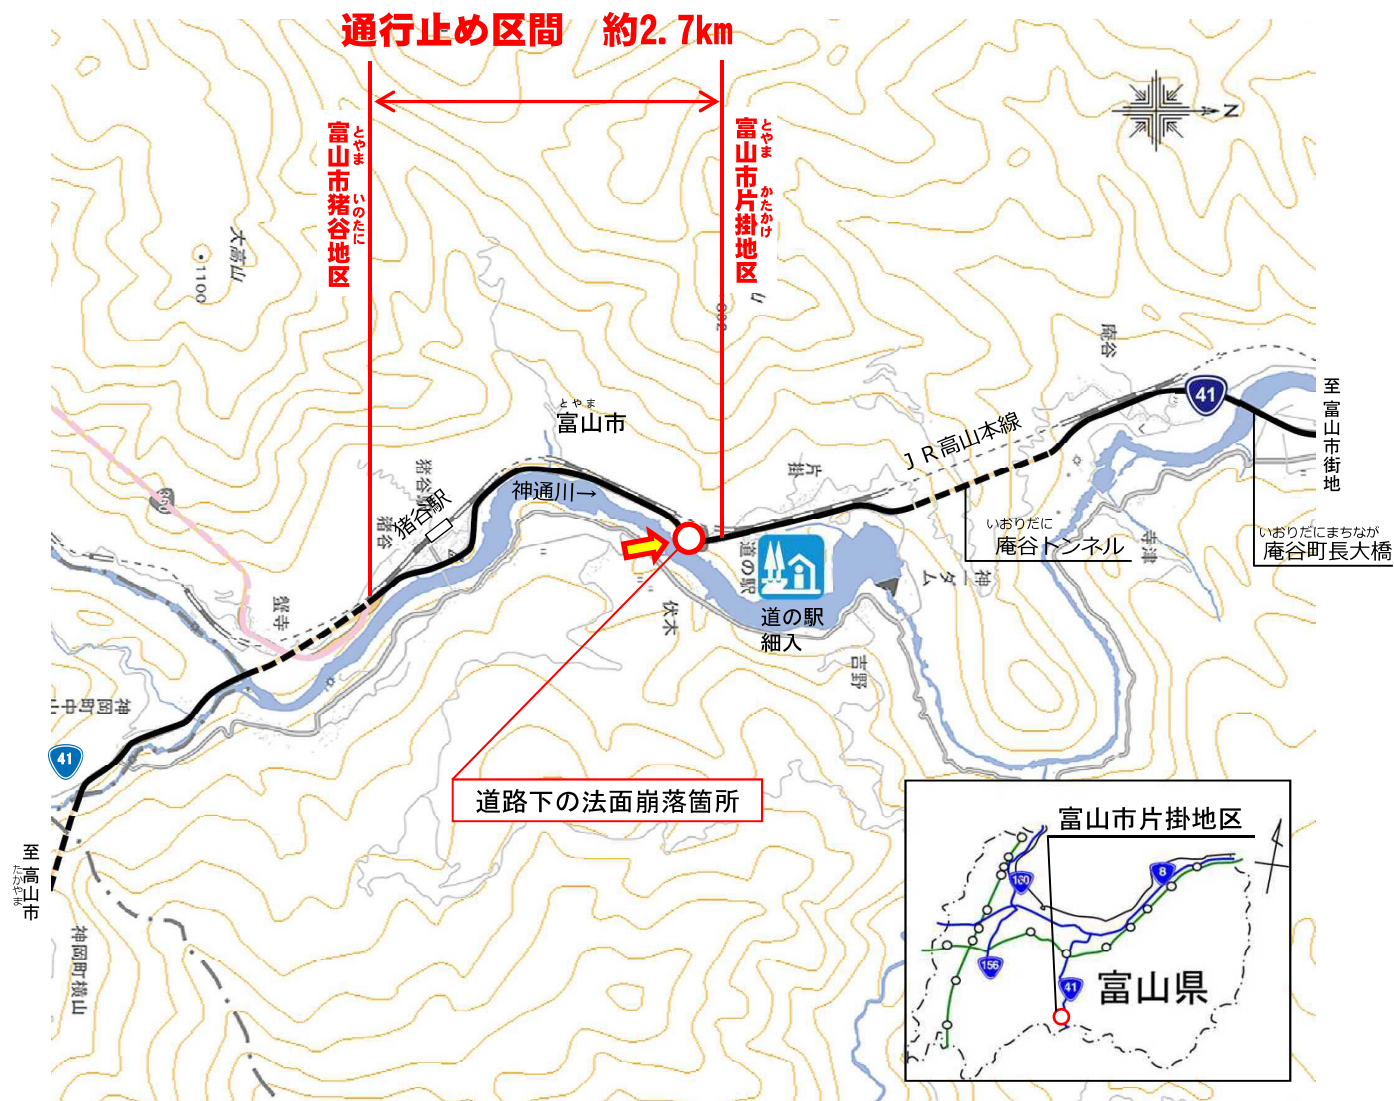

● 被災状況(撮影:令和2年4月10日)

● 通行止めの状況(富山市街地側)

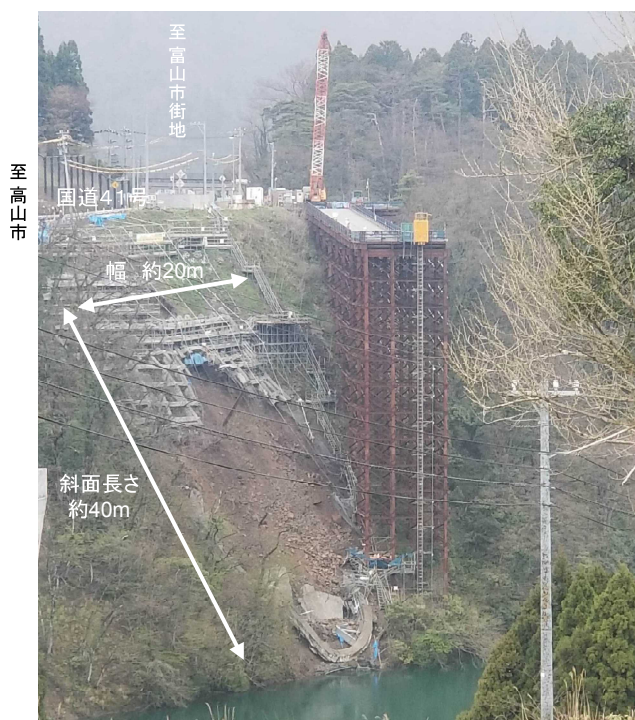

「道の駅」細入から岐阜県側を望む

対岸より全景写真(➡ 撮影方向)

● 応急復旧イメージ

別紙2

