一級河川　姫川

国土交通省 高田かわこく 河川国道事務所

工 事 名：令和元年度西中護岸工事
場　　所：新潟県糸魚川市西中地先
工　　期：Ｒ1年8月23日～Ｒ２年5月29日　（１２月27日 現在進捗率57.6%）

株式会社 谷村建設

ブロック製作ヤード

西 中 護 岸

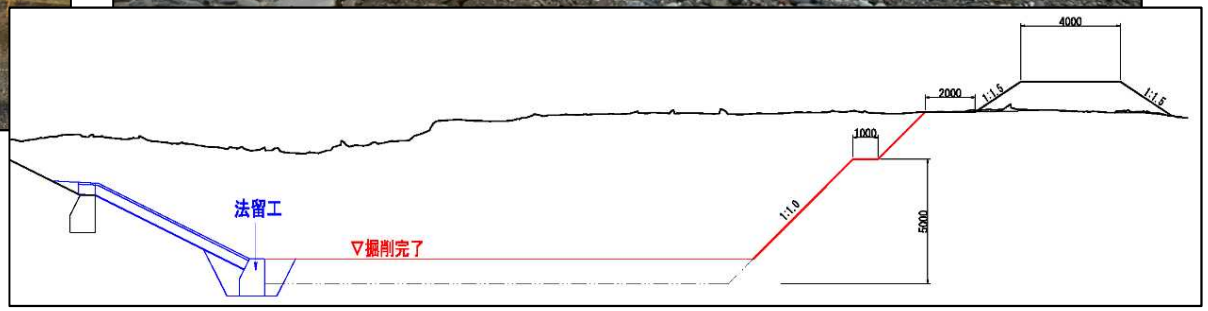

株式会社 谷村建設
現場代理人 黒坂さん

～ 作業状況 ～

ブロック製作ヤードでは、12月26日に最終打設（279個）を完了しました。250個を超えるブロックの羅列は爽快です。年をまたぎ脱型・片付け作業を行い、搬出時期（3月下旬）まで存置します。

護岸工事では、法留工に向けての掘削が完了しました。長期休暇となるため、一時的に水替工を停止させて掘削部は水の中へと沈めます。年明けに再稼働し、本格的な護岸工の開始となります。
