だいげんたさぼうかいらんばん

大源太砂防回覧板

令和2年7月号（№42）
国土交通省北陸地方整備局　湯沢砂防事務所
佐藤工業株式会社　　大源太砂防堰堤作業所
（担当：横川　℡ 025－775－7948）

1. 補強工事の進捗について

【コンクリート堰堤工】

６月２３日に２回目の『岩盤検査』を行い、左右岩部の岩盤状況が堰堤基礎として相応しいと判断され、コンクリートを順次打設しています。６月末で、堤高１８mのうちの１０mを構築しました。

打設割付図

右岸より新堰堤を望む

左岸よりコンクリート打設状況

2. 工事工程

７月の実施工程は以下のとおりです。

【コンクリート堰堤工】

堤高１４mまで構築後、３回目の『岩盤検査』として新堰堤袖部（左右岸の両端部）の確認を行います。岩盤検査終了後、順次コンクリート打設を行い堰堤を構築していきます。 今月は、堤高１８mのうち、１５mの高さまでを予定しています。

１５mより上部については、景観に配慮した構造物とするため、７月中旬より準備作業（資材搬入等）を行います。

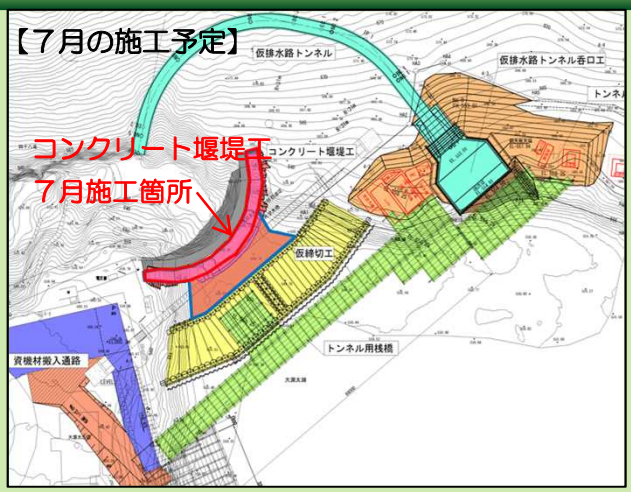

工　種	7月の工事工程																															備　考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
コンクリート堰堤工	架台組立、残存型枠設置、木製型枠組立、コンクリート打設																									岩盤検査						

3. 鮎釣りが解禁されます。

今年も、７月１０日（金）に鮎釣りが解禁されます。多くの釣人が、魚野川や大源太川に訪れ、太公望となって釣りを楽しまれます。大物が釣れるといいですね。

魚野川で鮎釣りを楽しむ釣り人

魚野川で鮎釣りを楽しむ釣り人

4. 大源太キャニオンキャンプ場の営業が開始されます。

新型コロナウイルスによる政府の緊急事態宣言ならびに新潟県、湯沢町からの営業自粛要請を受け休業していました大源太キャニオンキャンプ場が、緊急事態の解除を受けて７月１日より営業開始致しました。

グランピングサイト、常設テント、持込テントサイト、日帰りバーベキュー、クラフト体験の営業を行っています（ピザ焼き体験、隣接レストランの営業は今シーズンは行っていません）。カヤックツアーは半日の体験となっています。

新たな生活様式の中、たまには外で羽を伸ばしてみることも良いかもしれませんね。

来場の際は、大源太湖を周遊し（１周４０分程度）、工事現場も覗いてみて下さい。

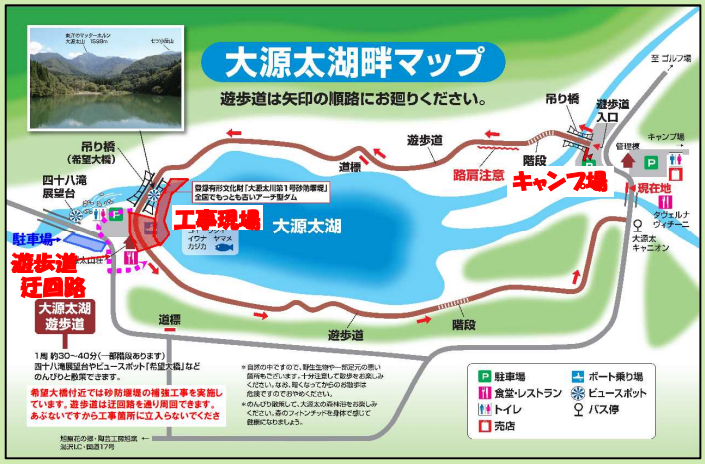

大源太キャニオンキャンプ場

カヤックツアー

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第１号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。
アドレスは「http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/」です。

工事に関するお問い合わせ	国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官）	TEL	025(784)2264
	佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所	TEL	025(775)7948
