（様式3-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	福島潟における浚渫工事
実施主体	新潟県新潟地域振興局地域整備部

福島潟において、鋭意潟内の浚渫、築堤工事を進めています。

R5実施　浚渫工　V=2,600m3

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局地域整備部

令和４年度も引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

新潟地域整備部管内
新井郷川分水路【新潟市　北区】

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	福島潟における築堤工事
実施主体	新潟県新潟地域振興局地域整備部

福島潟において、鋭意築堤、潟の掘削工事を進めています。

R3実施　築堤　380m　盛土　4,500m3

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事・伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局地域整備部

令和３年度は「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

新潟地域整備部管内
新井郷川分水路【新潟市　北区】

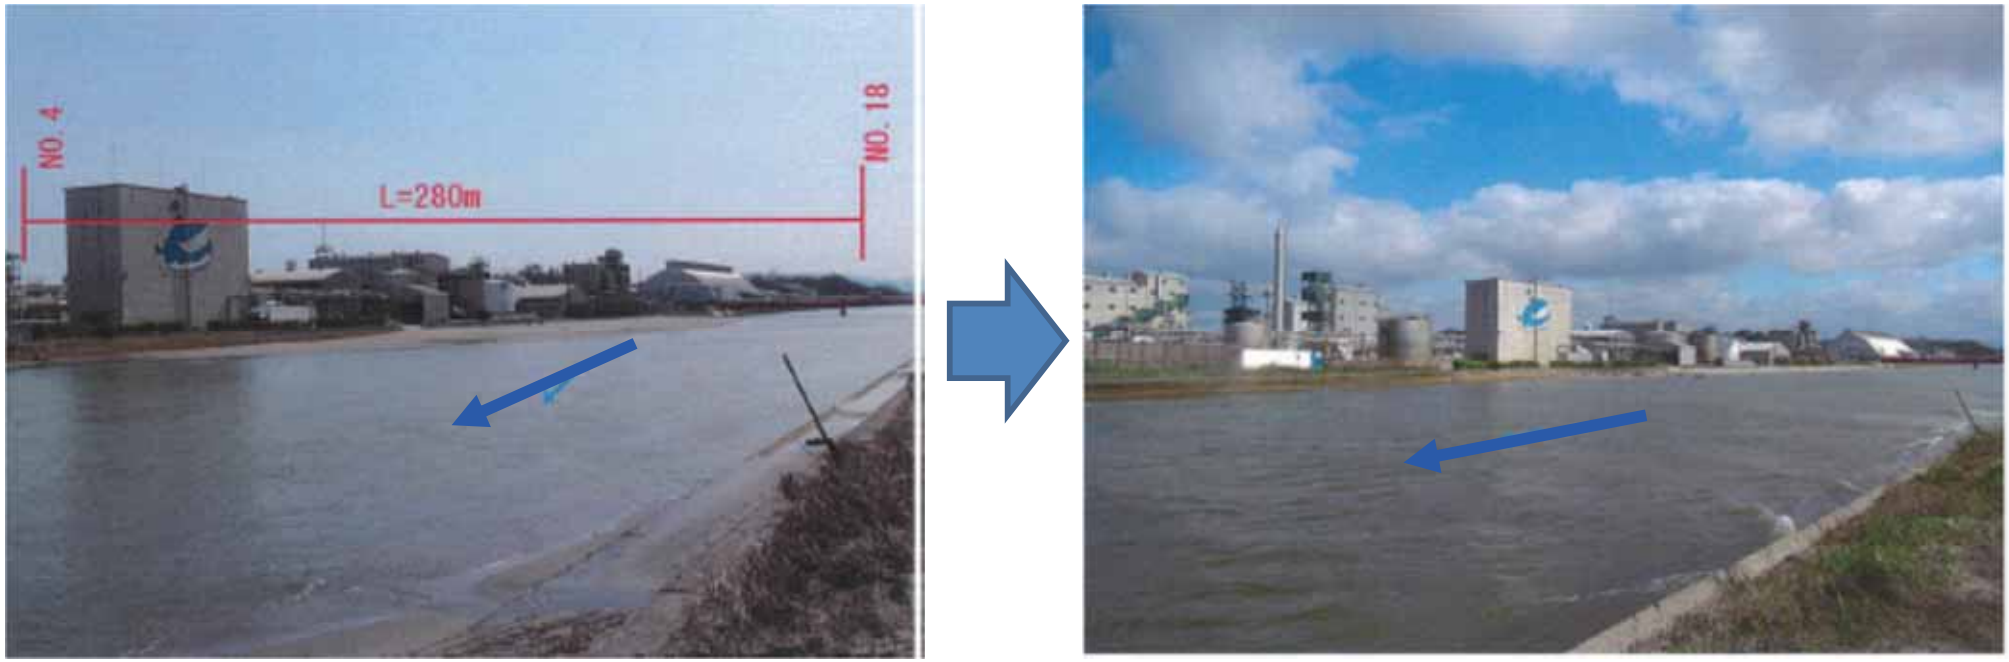

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	洪水氾濫対策
実施内容	桑山川で県営湛水防除事業による排水機場新設工事を実施
実施主体	新潟県

洪水時に早出川から桑山川へ逆流が発生し、田んぼが水につかる被害が発生しているため、排水機場を新設し、被害を防止することを目的として工事を行っています。

【実施概要】

工　　期　平成29年度～令和6年度

受益面積　110.7ha

主要工事　排水機場工　N=1ヶ所

（排水ポンプφ1000mm（2.3m3/s）×2台）

排水樋門工　N=1ヶ所

湛水状況　令和元年６月30日撮影

新設排水ポンプ

工事中　令和６年１月29日撮影

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	⑥流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	間伐等の森林整備の実施
実施主体	新潟県新潟地域振興局（津川地区振興事務所を含む）

〇水源かん養や土砂災害防止などの森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、民有林において森林組合等が実施する森林整備に対して支援を行った。
〇本流域を所管する新潟地域振興局及び同局津川地区振興事務所において、令和5年度にそれぞれ約56ha・約111haの森林整備の実施を見込んでいる。

人工造林（再造林）

下刈り

間伐

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	⑥ 流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	森林の復旧
実施主体	新潟県新潟地域振興局（津川地区振興事務所を含む）

【実施概要】

森林を維持・造成する基盤となる治山施設の整備（治山ダム）、過密状態で保水機能が低下したスギ林の間伐及び幼齢木の成長を阻害する雑草を除去する下刈りを実施し、森林の有する雨水貯留機能の向上を図った。

R5年度治山対策実績
- 治山ダム：１基
- 森林整備：5.07ha

森林整備（間伐）の状況

森林整備（下刈り）の状況

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①洪水氾濫対策
実施内容	桑山川の工事を実施
実施主体	新潟県新潟地域振興局農林振興部

平成29年度～令和5年度（予定）で県営湛水防除事業による排水機場新設工事を実施

（新津東部2期地区で整備された排水機場）

平成23年7月29日撮影：洪水時（湛水状況）

平常時（無湛水状況）

水門ゲート据付

〇令和5年度実施計画
- 排水機場建屋　1.0式
- ポンプ製作、据付　1.0式
- 土木工事　1.0式　他

〇令和4年度までの進捗率
- 57%（事業費ベース）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	⑥流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	森林の復旧
実施主体	新潟県新潟地域振興局農林振興部

【実施概要】

森林を維持・造成する基盤となる治山施設の整備（治山ダム）、過密状態で保水機能が低下したスギ林の間伐及び幼齢木の成長を阻害する雑草を除去する下刈りを実施し、森林の有する雨水貯留機能の向上を図った。

R4年度治山対策実績
- 治山ダム：３基
- 森林整備：5.40ha

森林整備（間伐）の状況

森林整備（下刈り）の状況

（様式２-取組概要）

カテゴリー	⑥　流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	森林の復旧
実施主体	新潟県新潟地域振興局

【実施概要】
　森林を維持・造成する基盤となる治山施設の整備（治山ダム）、過密状態で保水機能が低下したスギ林の間伐及び幼齢木の成長を阻害する雑草を除去する下刈りを実施し、森林の有する雨水貯留機能の向上を図った。

R3年度治山対策実績
- 治山ダム：３ 基
- 森林整備：10.41 ha

森林整備（間伐）の状況

森林整備（下刈り）の状況

（様式3-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局新津地域整備部

令和５年度も引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

新津地域整備部管内

早出川【五泉市】

早出川支川
大沢川【五泉市】

早出川支川
風越川【五泉市】

このほか、早出川支川の新江川、尾白川で河床掘削や伐木を実施。【五泉市】

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局新津地域整備部

令和４年度も引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

新津地域整備部管内

早出川
【五泉市】

早出川支川
尾白川
【五泉市】

このほか、早出川支川 仙見川で河床掘削を実施。【五泉市】

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局新津地域整備部

令和３年度は「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

新津地域整備部管内　早出川【五泉市】

このほか、早出川支川の不動堂川、三兵川で河床掘削を実施。【五泉市】

（様式3-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	阿賀野川の工事を実施
実施主体	新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所

阿賀野川水系阿賀野川圏域河川整備計画（平成29年2月）に基づき、築堤工事を実施。
令和5(2023)年12月に釣浜地区が完了。

【実施概要】（釣浜地区全体）

・延長 L=690m　・築堤(ICT施工含む) V=47,690m3　・連節ブロック A=7,280m2　・樋門 N=2基

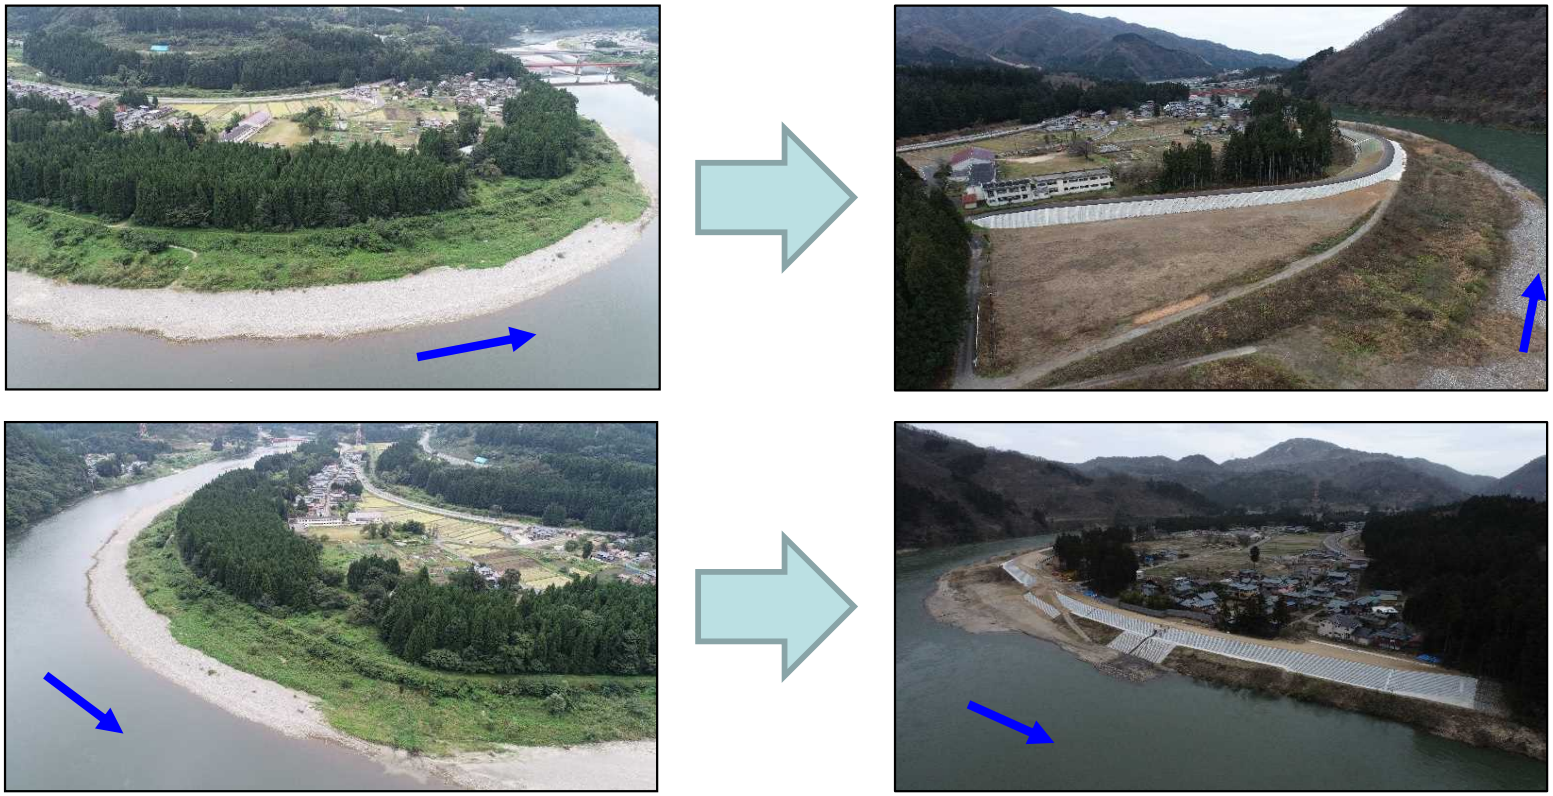

2020年10月撮影　　2023年12月撮影

（様式3-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所

令和５年度も引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

阿賀野川【阿賀町】
支川　谷沢川

2022年6月撮影

2023年4月撮影

阿賀野川【阿賀町】
支川　中村川

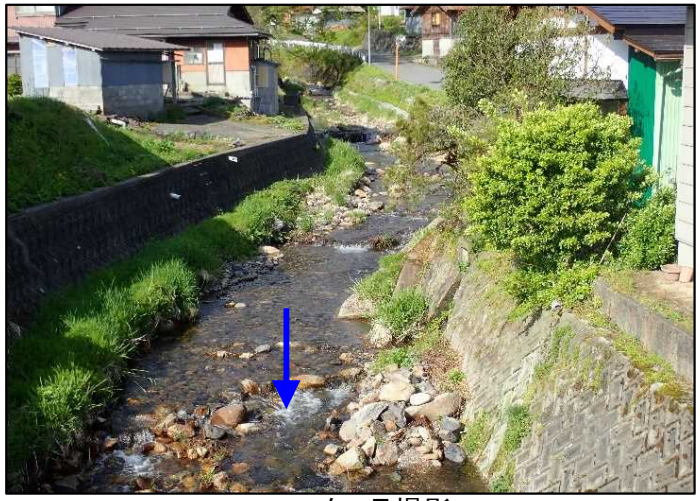

2023年4月撮影

2023年7月撮影

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所

令和４年度も引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

阿賀野川【阿賀町】
支川　常浪川

2022年10月撮影

2022年12月撮影

阿賀野川【阿賀町】
支川　中村川

2022年4月撮影

2022年6月撮影

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	⑥流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	間伐等の森林整備の実施
実施主体	新潟県新潟地域振興局（津川地区振興事務所を含む）

【実施概要】
〇土砂災害防止や水源かん養等の森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るため、森林組合等が民有林で実施する森林整備に対して支援を行いました。
〇流域内に管内を有する新潟地域振興局および同振興局津川地区振興事務所管内においては、令和４年度にそれぞれ約55ha・約101haの森林整備の実施が見込まれています。

人工造林（再造林）

除伐

間伐

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所

令和３年度は「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」に引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

阿賀野川【阿賀町】
前田川との合流点

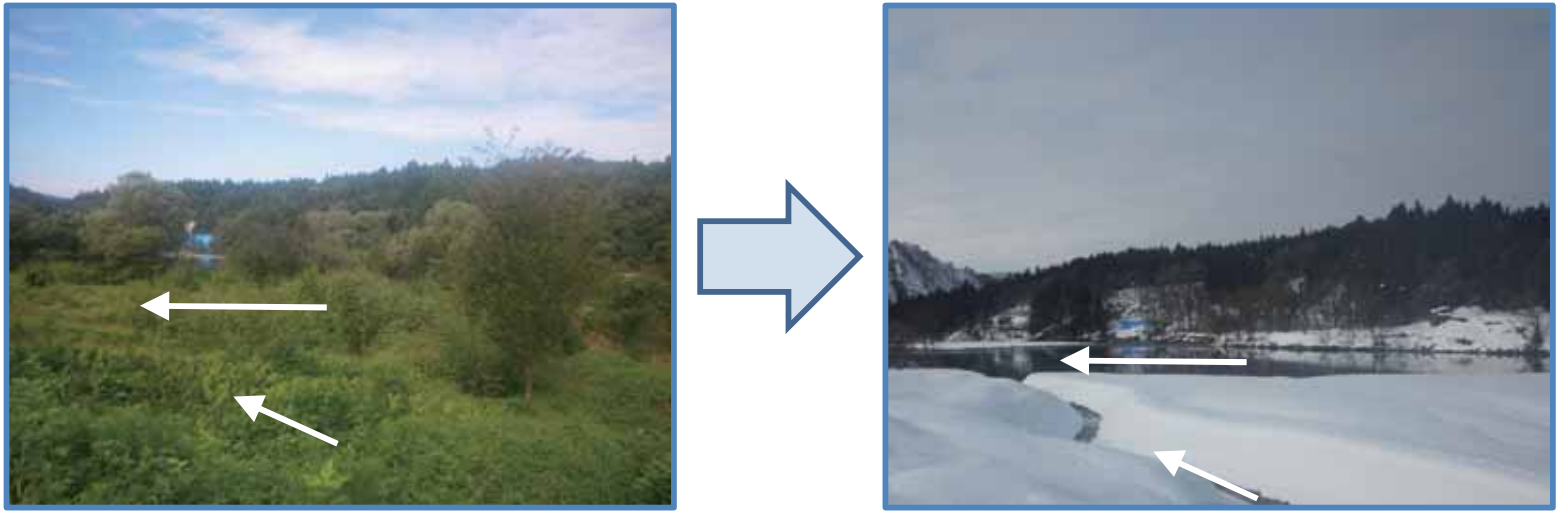

阿賀野川【阿賀町】
中村川との合流点

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	⑥　流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	間伐等の森林整備の実施
実施主体	新潟県

【実施概要】
〇土砂災害防止や水源かん養等の森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るため、森林組合等が民有林で実施する森林整備に対して支援を行いました。
〇流域内に管内を有する新潟地域振興局および同振興局津川地区振興事務所管内においては、令和３年度にそれぞれ約126ha・143haの森林整備の実施が見込まれています。

人工造林

除伐

間伐

（様式3-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	新郷川圏域河川における河道拡幅、護岸整備の実施
実施主体	新潟県新発田地域振興局地域整備部

河川整備計画に基づき新郷川圏域河川の河道拡幅及び護岸整備工事を実施しています。

駒林川の河道拡幅及び護岸整備

荒川川と福島潟の合流点処理（築堤・護岸整備）

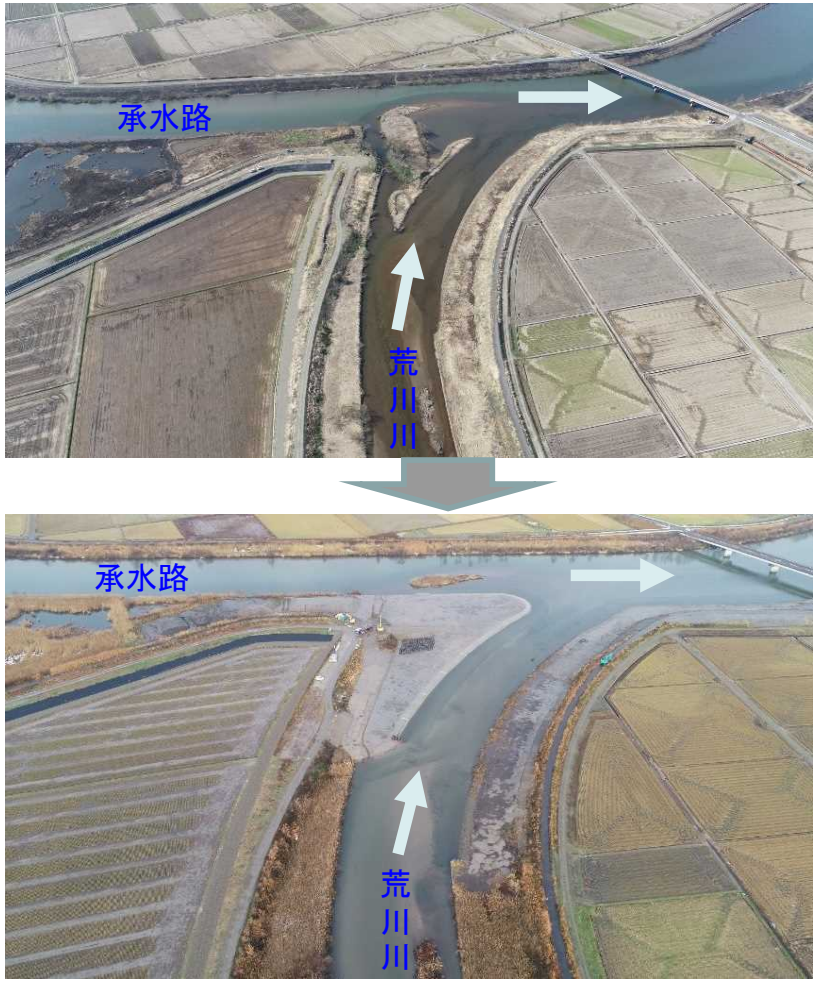

（様式3-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新発田地域振興局地域整備部

緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施しています。

都辺田川【阿賀野市】

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①洪水氾濫対策
実施内容	福島潟における築堤･潟掘削工事の実施
実施主体	新潟県新発田地域振興局地域整備部

福島潟において、湖岸提の築堤工事、潟の掘削工事を進めています。

R4実施　築堤 L=190m　盛土 V=6,400m3
掘削土量 V=16,000m3

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	①洪水氾濫対策
実施内容	緊急浚渫事業債を活用した河床掘削工事･伐木業務委託等
実施主体	新潟県新発田地域振興局地域整備部

令和４年度も引き続き、緊急浚渫推進事業債を活用した河道掘削工事・伐木業務委託等を実施。

荒川川【新発田市】

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	潟掘削工事の実施
実施主体	新潟県新発田地域振興局地域整備部

R2～R3年度
掘削範囲

福島潟において、鎖意築堤、
潟の掘削工事を進めています。

R3　掘削土量
V=60,000m3

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	安野川・大荒川の工事を実施
実施主体	新潟県新発田地域振興局農村整備部

平成１０年度～令和１１年度（予定）で県営湛水防除事業による河川拡幅工事を実施

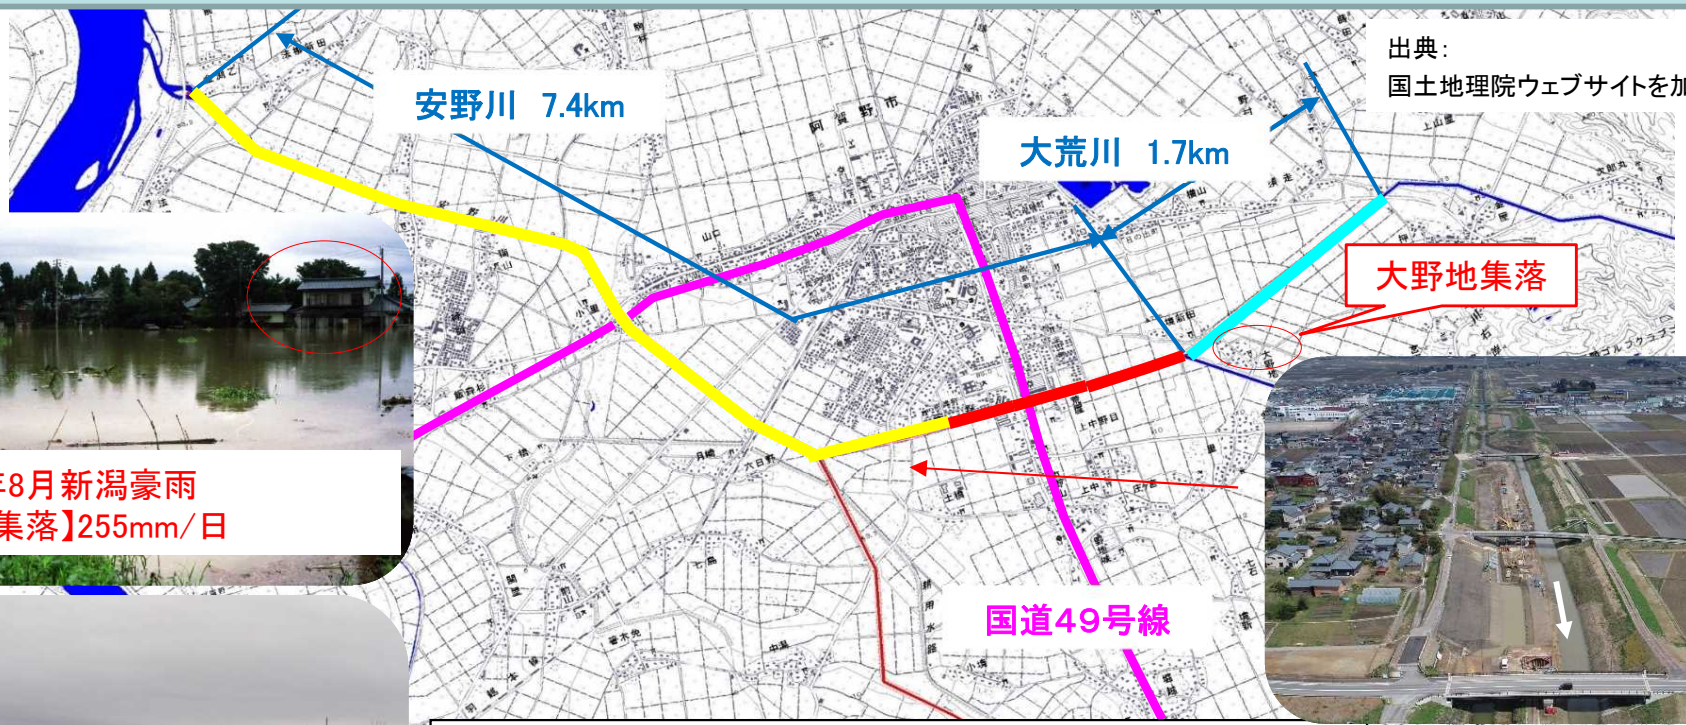

出典：
国土地理院ウェブサイトを加工して作成

平成10年8月新潟豪雨
【大野地集落】255mm/日

平成23年7月新潟・福島豪雨
【大野地集落】164mm/日

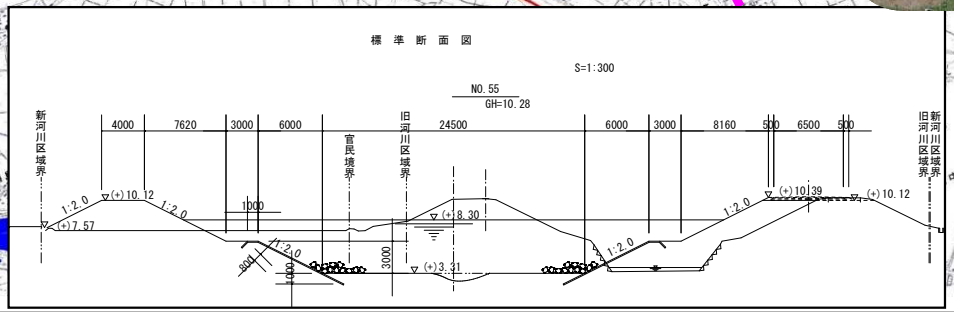

凡　例	
	工事完了
	工事中
	工事予定

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	①　洪水氾濫対策
実施内容	塚田川の工事を実施
実施主体	新潟県新発田地域振興局農村整備部

平成21年度～令和9年度（予定）で県営かんがい排水事業による河川拡幅工事を実施

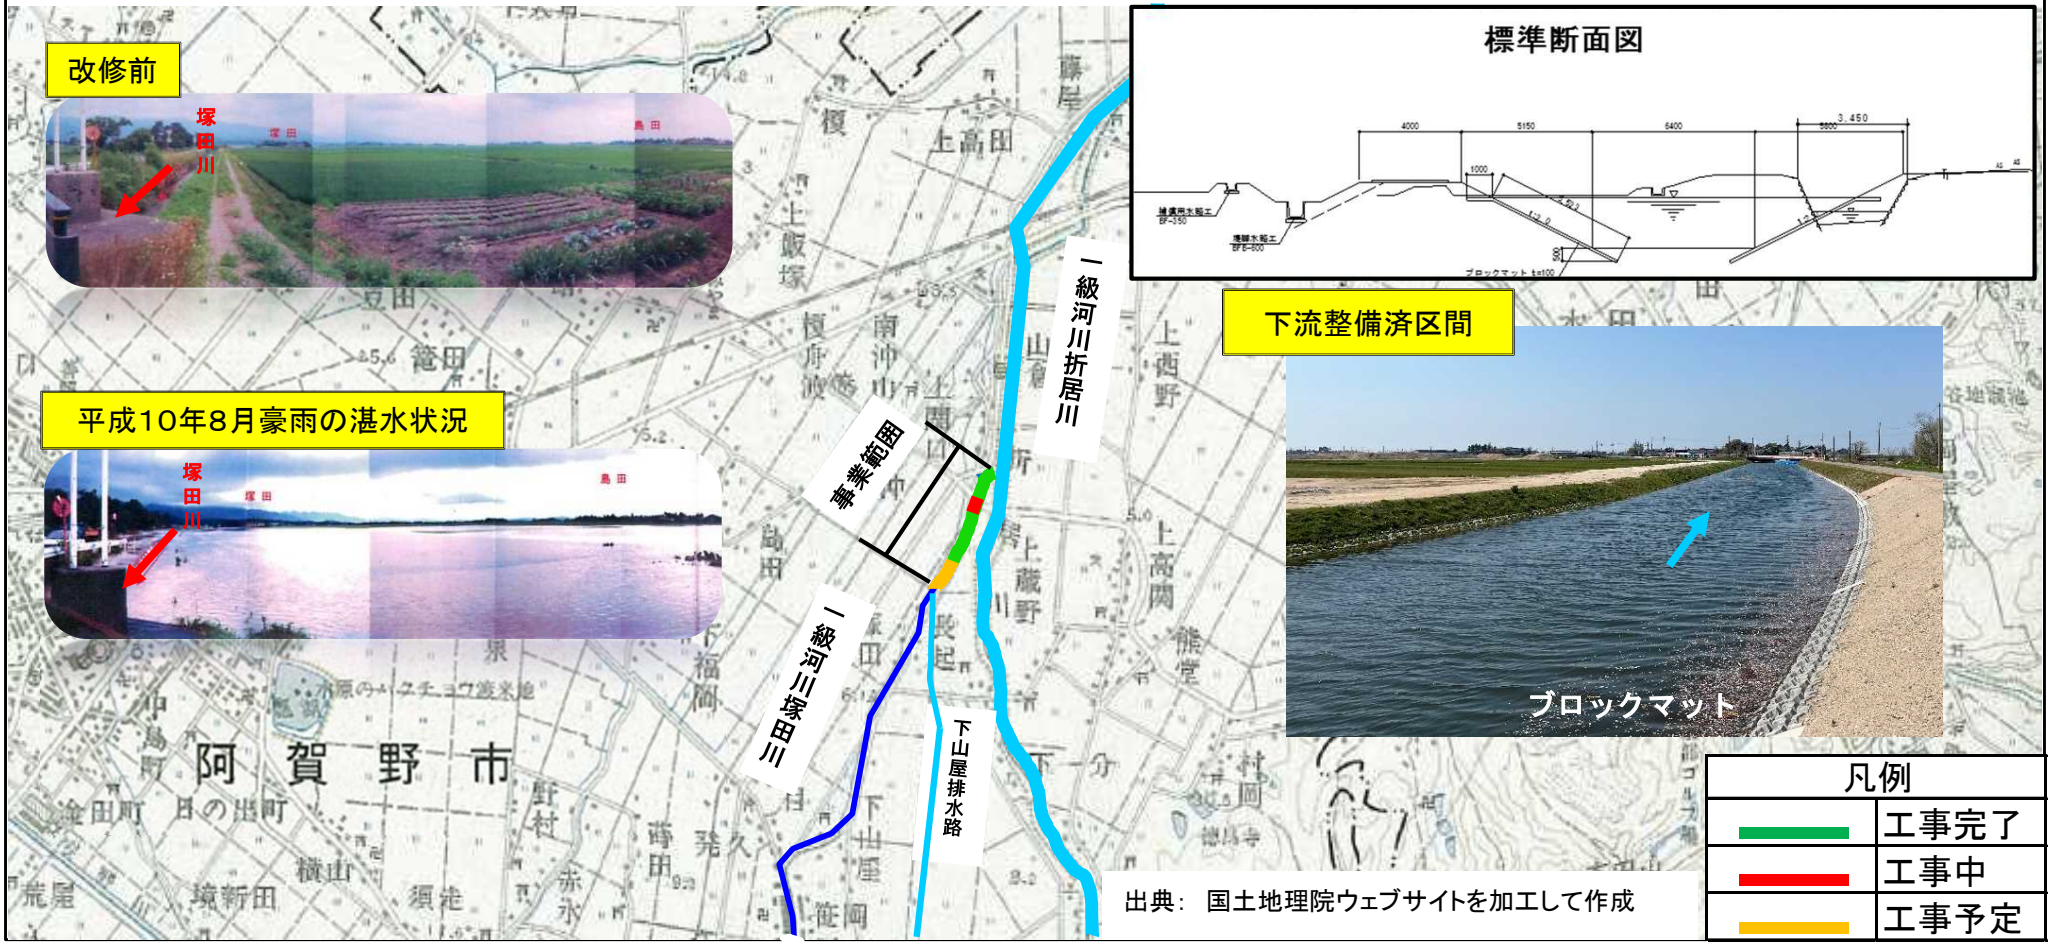

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	③土砂災害対策
実施内容	阿賀野川流域における砂防関係施設の整備
実施主体	新潟県

阿賀野川流域における砂防関係施設の整備

（様式2-取組概要）

区　　分	Ⅰ　氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
分　　類	⑥　流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	間伐等の森林整備
実施主体	東蒲原郡森林組合等　（新潟県林政課）

間伐・除伐・人工造林等の森林整備を実施した。

間伐後の施行地

（様式2-取組概要）

区　　分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
分　　類	⑥　流域の雨水貯留機能の向上
実施内容	森林の復旧
実施主体	新潟県農林水産部治山課

荒廃した森林に実施する治山施設の整備とあわせて、植栽・保育を行うことで森林の復旧を図り、土砂災害が発生しにくい状態になります。さらに、間伐等の森林整備の実施により水源かん養機能が向上し、雨水貯留機能の発揮が期待される森林に再生します。

（事業実施）

（実施後 10年）

（実施後 40年）

崩壊地の復旧から森林再生まで
