新潟維持出張所作業結果

7月

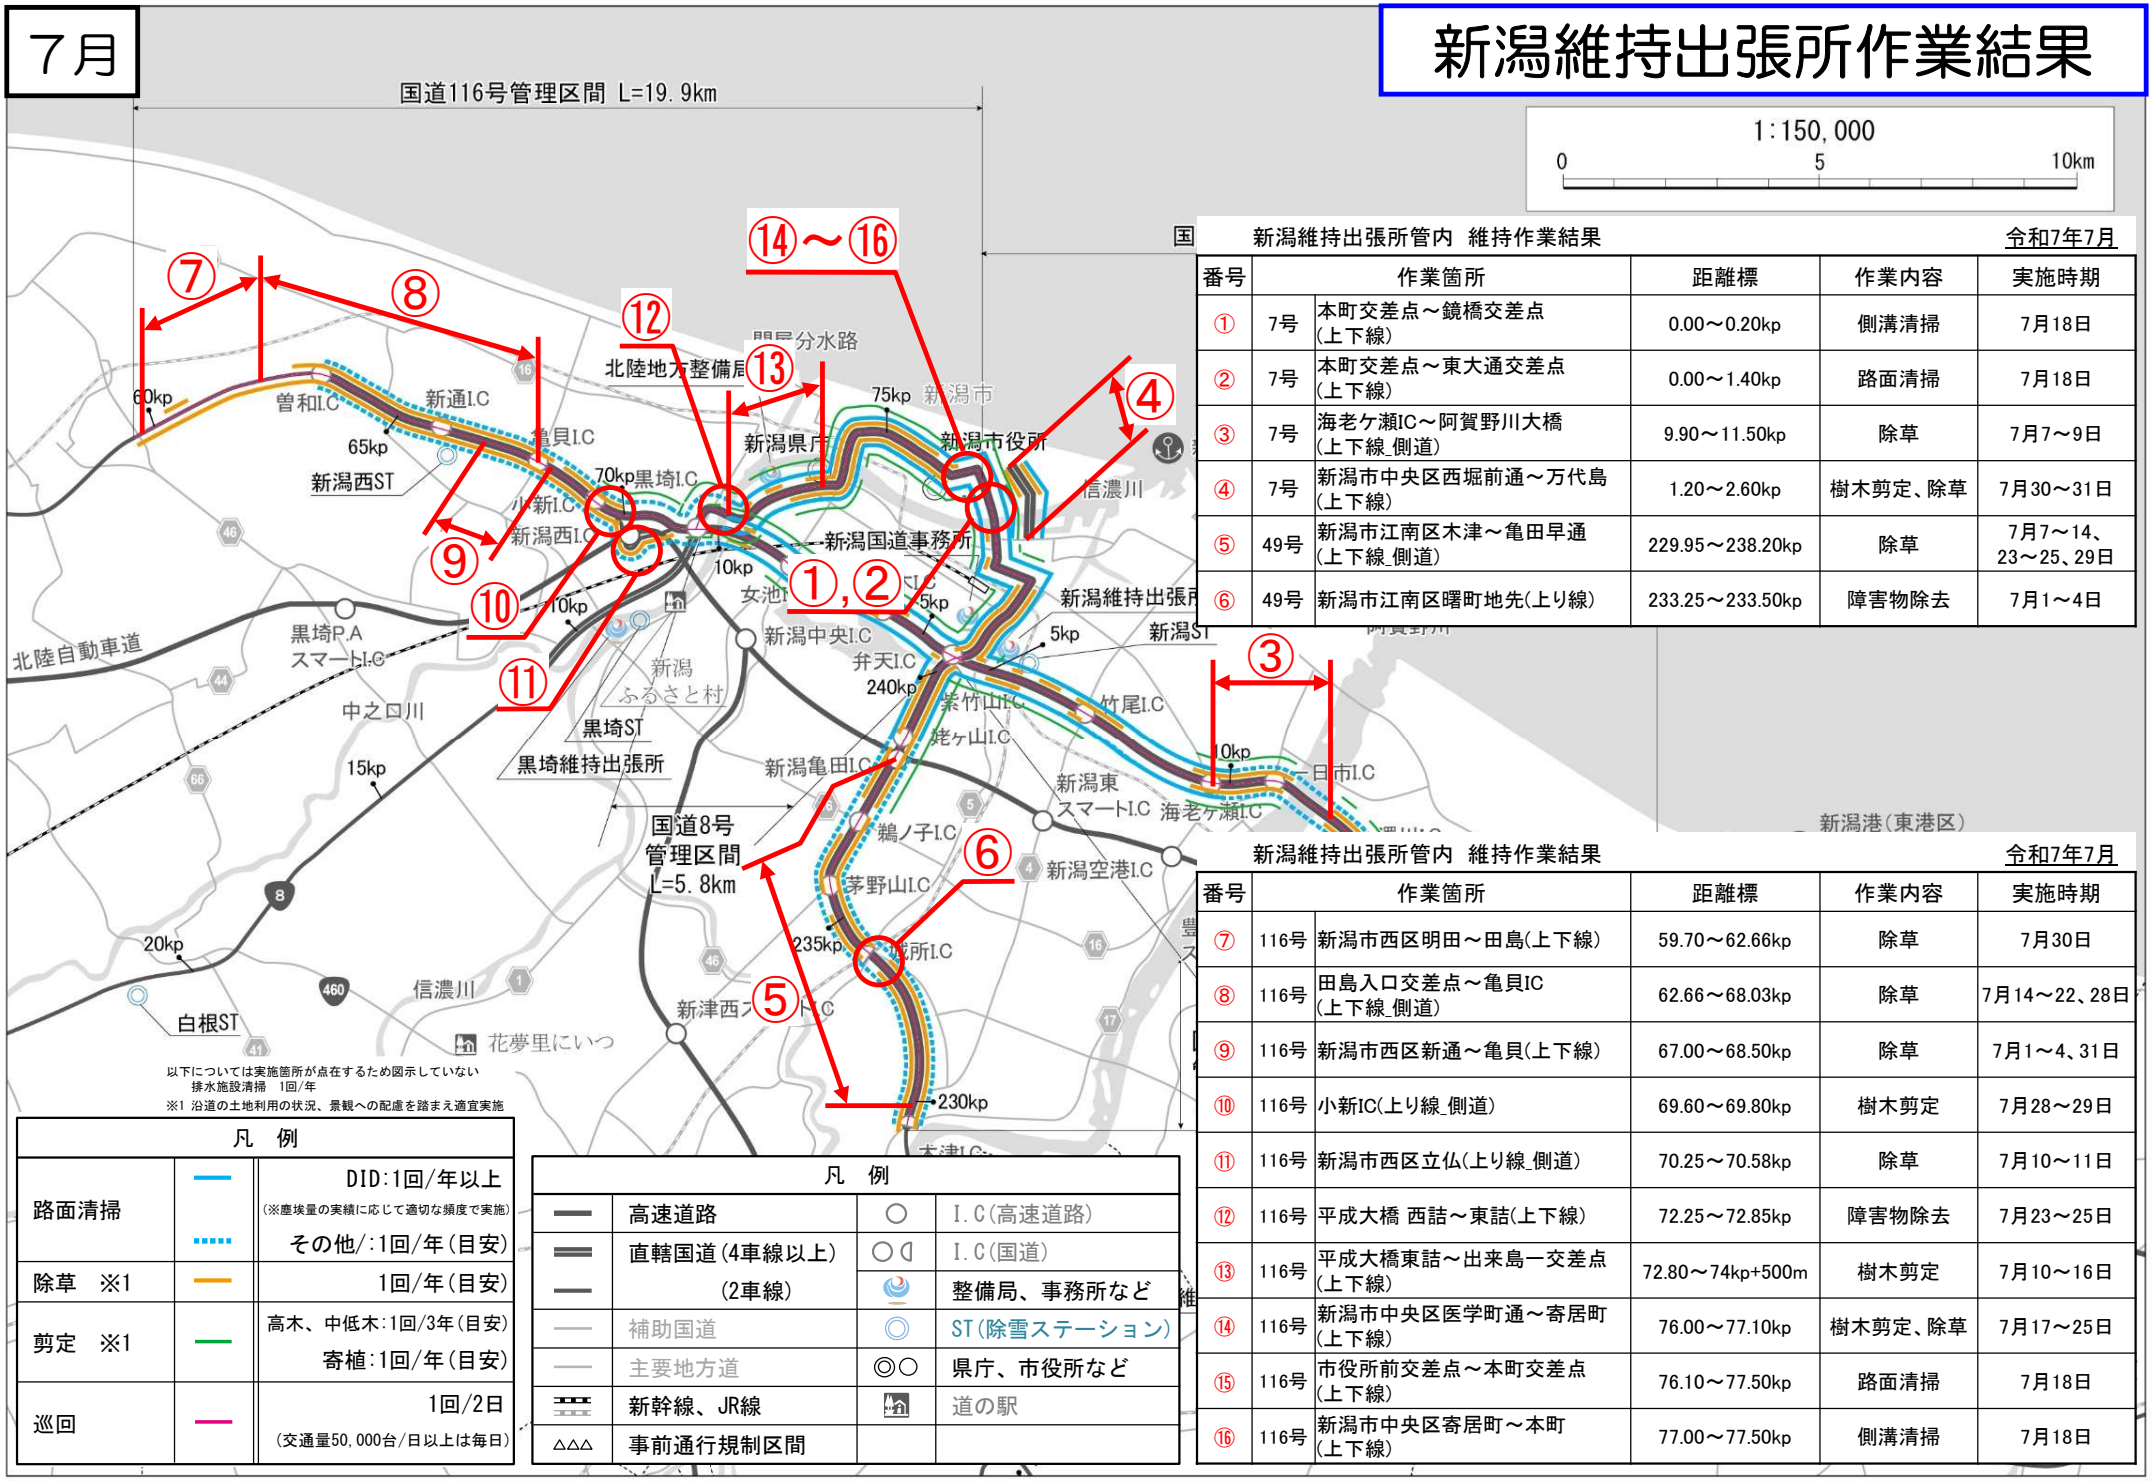

新潟維持出張所管内 維持作業結果　令和7年7月

番号	作業箇所		距離標	作業内容	実施時期
①	7号	本町交差点～鏡橋交差点(上下線)	0.00～0.20kp	側溝清掃	7月18日
②	7号	本町交差点～東大通交差点(上下線)	0.00～1.40kp	路面清掃	7月18日
③	7号	海老ケ瀬IC～阿賀野川大橋(上下線_側道)	9.90～11.50kp	除草	7月7～9日
④	7号	新潟市中央区西堀前通～万代島(上下線)	1.20～2.60kp	樹木剪定、除草	7月30～31日
⑤	49号	新潟市江南区木津～亀田早通(上下線_側道)	229.95～238.20kp	除草	7月7～14、23～25、29日
⑥	49号	新潟市江南区曙町地先(上り線)	233.25～233.50kp	障害物除去	7月1～4日

新潟維持出張所管内 維持作業結果　令和7年7月

番号	作業箇所		距離標	作業内容	実施時期
⑦	116号	新潟市西区明田～田島(上下線)	59.70～62.66kp	除草	7月30日
⑧	116号	田島入口交差点～亀貝IC(上下線_側道)	62.66～68.03kp	除草	7月14～22、28日
⑨	116号	新潟市西区新通～亀貝(上下線)	67.00～68.50kp	除草	7月1～4、31日
⑩	116号	小新IC(上り線_側道)	69.60～69.80kp	樹木剪定	7月28～29日
⑪	116号	新潟市西区立仏(上り線_側道)	70.25～70.58kp	除草	7月10～11日
⑫	116号	平成大橋 西詰～東詰(上下線)	72.25～72.85kp	障害物除去	7月23～25日
⑬	116号	平成大橋東詰～出来島一交差点(上下線)	72.80～74kp+500m	樹木剪定	7月10～16日
⑭	116号	新潟市中央区医学町通～寄居町(上下線)	76.00～77.10kp	樹木剪定、除草	7月17～25日
⑮	116号	市役所前交差点～本町交差点(上下線)	76.10～77.50kp	路面清掃	7月18日
⑯	116号	新潟市中央区寄居町～本町(上下線)	77.00～77.50kp	側溝清掃	7月18日

凡　例

路面清掃	DID:1回/年以上	(※塵埃量の実績に応じて適切な頻度で実施)
	その他/:1回/年(目安)	
除草　※1	1回/年(目安)	
剪定　※1	高木、中低木:1回/3年(目安)	
	寄植:1回/年(目安)	
巡回	1回/2日	(交通量50,000台/日以上は毎日)

凡　例

	高速道路		I.C(高速道路)
	直轄国道(4車線以上)		I.C(国道)
	(2車線)		整備局、事務所など
	補助国道		ST(除雪ステーション)
	主要地方道		県庁、市役所など
	新幹線、JR線		道の駅
△△△	事前通行規制区間		

道路の維持管理作業の実施結果をお知らせします

実施箇所：国道116号
　　新潟市西区明田～田島地先（上下線）
　　（59.70～62.66kp）
実施時期：令和7年7月30日
実施内容：除草
代表掲載箇所：新潟市西区保古野木地先

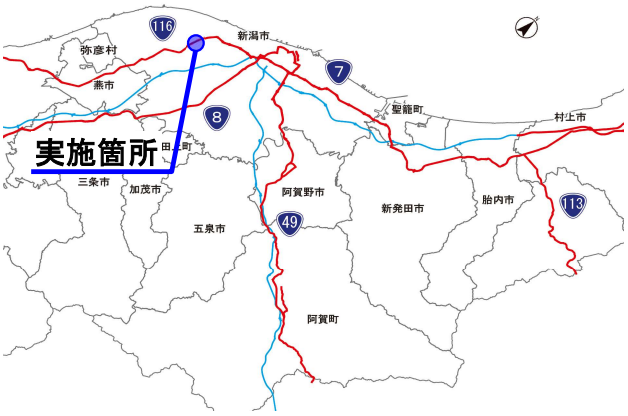

実施箇所　位置図

作業前

作業中

作業後

実施箇所：国道116号
　　新潟市中央区医学町通～寄居町
　　（上下線）（76.00～77.10kp）
実施時期：令和7年7月11～25日
実施内容：樹木剪定、除草
代表掲載箇所：新潟市中央区医学町通地先

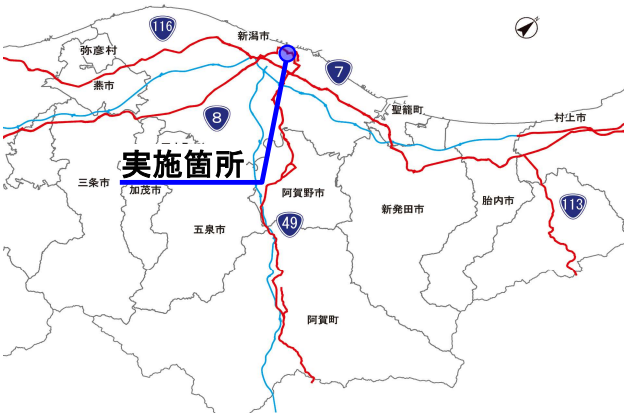

実施箇所　位置図

作業前

作業中

作業後
