北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について【監視・観測状況】

平成25年5月16日
12時00分現在

・伸縮計①：観測開始(5/10 15:00)から5月16日12時00分まで　累計126.5mmの変位を観測しています。
・伸縮計②：観測開始(5/14 17:00)から5月16日12時00分まで　累計3.5mmの変位を観測しています。
・移動杭　：5月14日までの結果を湯沢砂防ホームページ（http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/）に掲載しています。

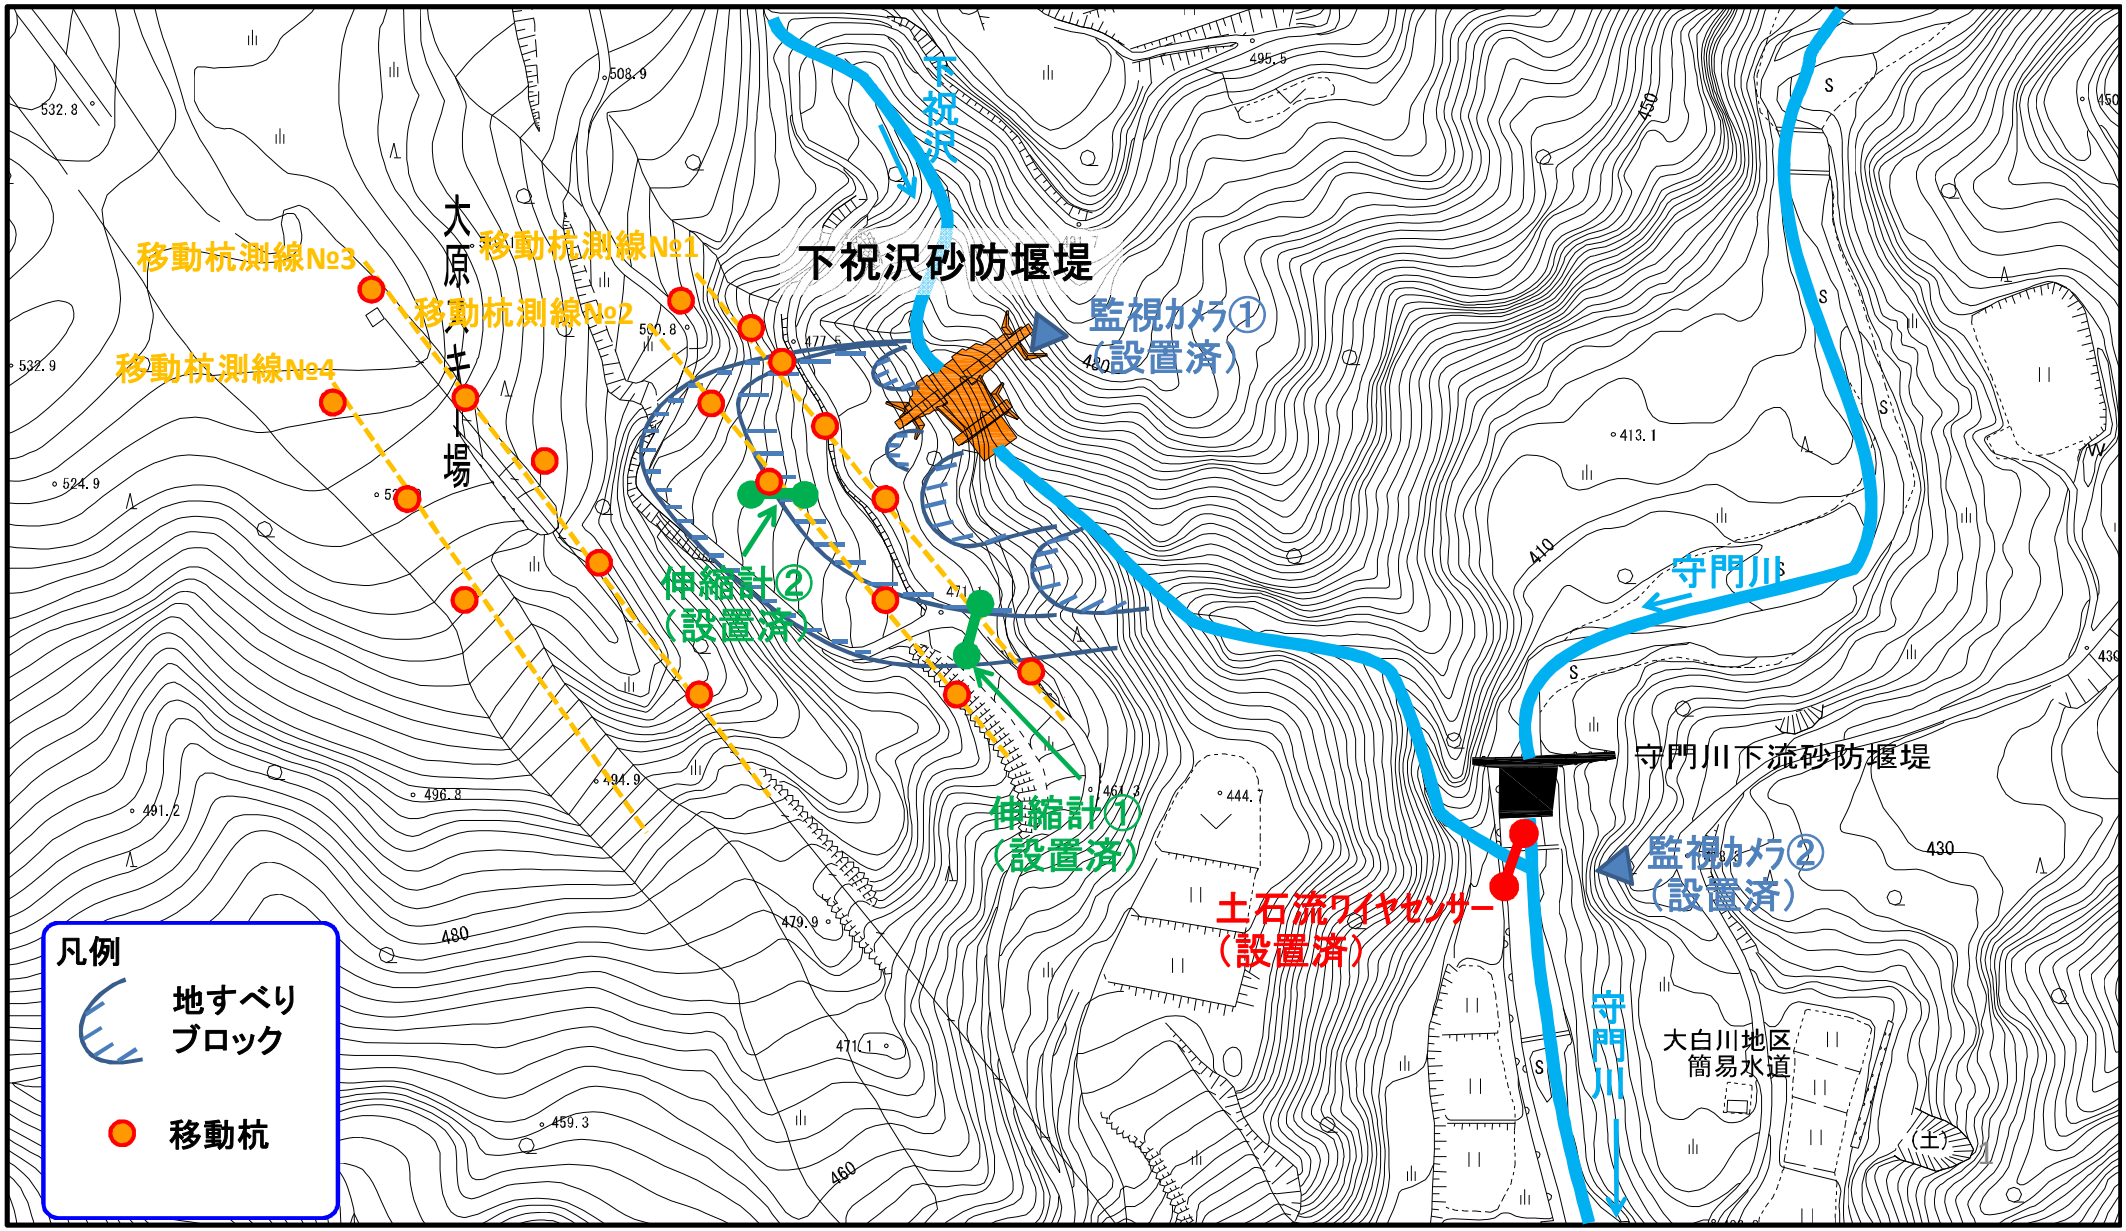

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について【応急対策工事状況】

流出土砂に備え、5月11日13時より守門川第1号砂防堰堤（新潟県管理）上流で除石（土砂掘削）を継続しています。
5月15日作業終了時　累計除石量2,500m3
5月16日引き続き除石作業中

H25.5.11　除石実施前

H25.5.15　作業終了時
