北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について【監視・観測状況】

平成25年5月18日
11時00分現在

●伸縮計①：観測開始(5/10 15:00)から5月18日11時00分まで　累計123.5mmの変位を観測しています。
●伸縮計②：観測開始(5/14 17:00)から5月18日11時00分まで　累計4.5mmの変位を観測しています。

●移動杭観測・5月16日までの結果を、湯沢砂防事務所ホームページ（http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/）に掲載しています。
・本日午前9時30分から、移動杭の観測を行っています。観測の結果は、明日ホームページに掲載する予定です。

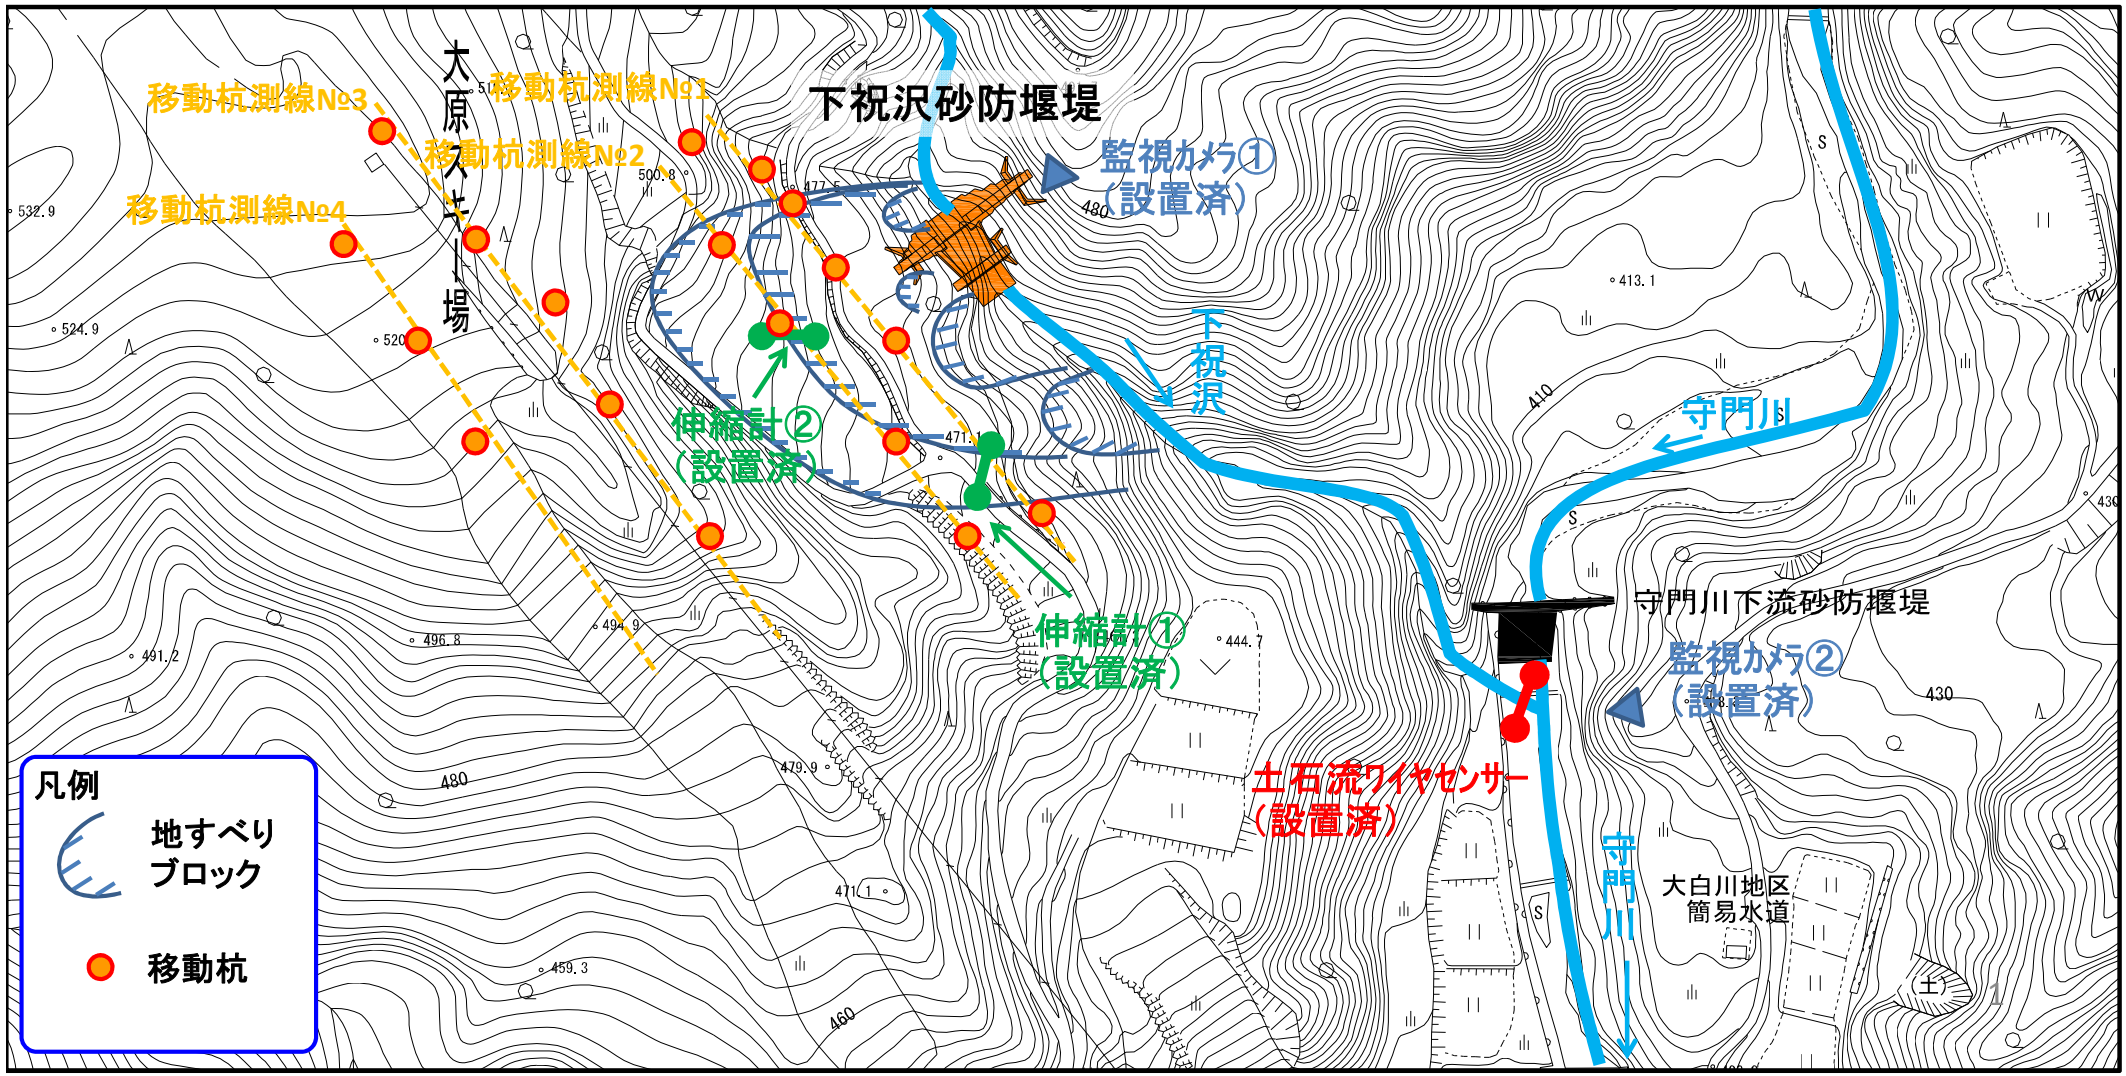

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について【応急対策工事状況】

●流出土砂に備え、5月11日13時より守門川第1号砂防堰堤（新潟県管理）上流で除石（土砂掘削）を継続しています。
・5月17日作業終了時　累計除石量約3,900m3
・5月18日も引き続き除石作業を行い、本日中に完了予定。

【守門川第1号砂防堰堤の状況】

H25.5.11　除石実施前

H25.5.17　作業終了時

【大原スキー場駐車場（土砂仮置き場）の状況】

H25.5.11　除石実施前（大原スキー場駐車場）

H25.5.17　作業終了時
