

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日 時	令和6年1月12日 11時00分
-----------------------	---------------------

件 名	令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について（第21報）
-----	------------------------------------

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	令和6年1月12日7時30分現在 令和6年1月1日令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について ○大規模な崩落等により通行不能となっている国道249号等の道路啓開活動を展開・継続 ○引き続き、石川県能登地方等におけるTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動等を展開 ※最新の作業状況等について、以下のX(旧Twitter)に投稿しています。
------	--

北陸地方整備局 ホームページ URL : https://www.hrr.mlit.go.jp/		X(旧 Twitter) 
--	---	--

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL（代表）025-280-8880 所 属 氏 名 企画部 企画課長 西村 雄喬
--------	--

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月11日(木) 7時00分時点
国土交通省 道路局

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に7方向で通路を確保

緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約8割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約5割
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	7方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所
※2: 内陸側・海側の両方

孤立地区数の推移

1月5日8時	33地区
1月10日16時	22地区

※内閣府防災資料より
※孤立地区には支援物資が届けられているとの情報



県道38号被害状況



国道249号作業状況



国道249号法面崩落



国道249号大谷ループ橋



国道249号大谷トンネル




凡例

- 国交省対応(走行可能)
- 県対応(この他にも作業を実施)
- 自衛隊対応
- × 被災規模 大
- ⊗ 被災規模 小～中程度
- × 完了(緊急復旧含む)
- 孤立集落(内閣府防災資料)
- 孤立集落(解消済)
- ★ 復旧業者到達地点
- 沿岸部への到達点



土砂崩落復旧前 土砂崩落復旧後

国道249号緊急復旧完了

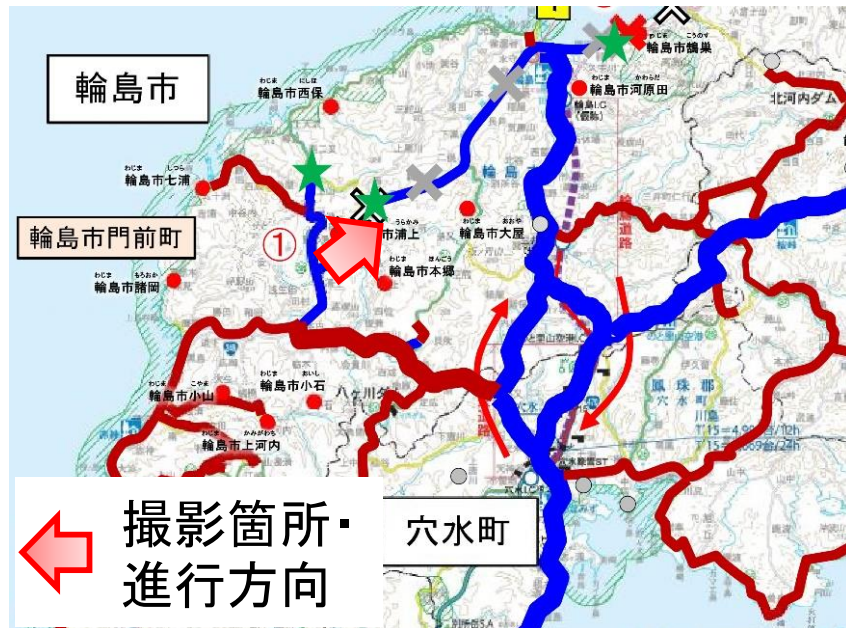

Before
令和6年1月10日(水)



After
令和6年1月11日(木)

前日(1/10)の活動状況





R249輪島市門前町浦上付近 倒木除去作業

＜本日(1/11)の作業予定＞

- 道路上の倒木、崩落土砂除去
- 引き続き輪島市街地方面へ啓開前進

＜昨日(1/10)の実績＞

- 倒木、崩落土砂除去を実施

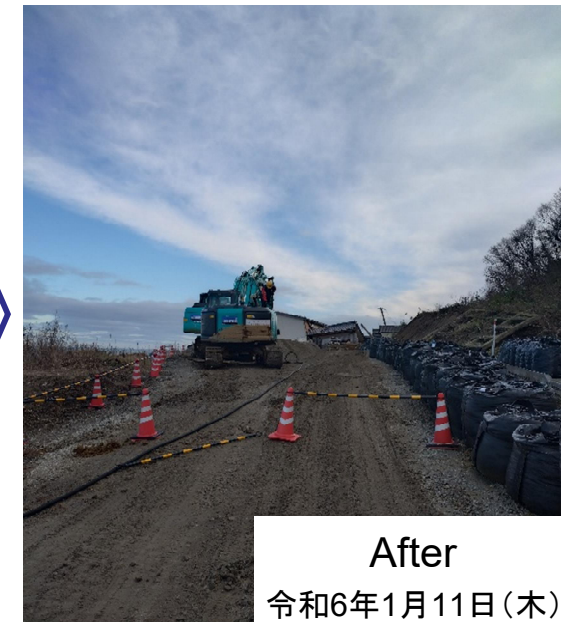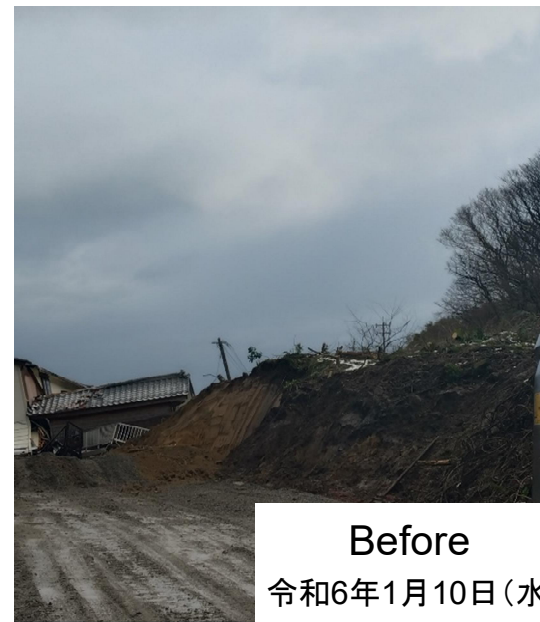

＜本日(1/11)の作業予定＞

- 崩落土砂撤去
- 伐採木撤去
- コンクリート殻撤去・運搬

＜昨日(1/10)の実績＞

- 迂回路設置のための崩落土砂撤去、土運搬を実施
- 大型土嚢の設置

前日(1/10)の活動状況



R249輪島市稲船町付近 大型土嚢設置・崩落土砂撤去作業



<本日(1/11)の作業予定>

- 崩落土砂撤去
- 除雪作業

<昨日(1/10)の実績>

- 路面の亀裂補修を実施
- 除雪作業を実施

前日(1/10)の活動状況



(主) 珠洲里線 八太郎峠付近(珠洲市側) 除雪作業

令和6年能登半島地震(最大震度7)による土砂災害発生状況

令和6年1月11日 6時15分時点

土砂災害発生件数

64件※1

【被害状況】

人的被害：死者：25名
安否不明者：3名
負傷者：2名

家屋被害：全壊：16戸
半壊：2戸
一部損壊：2戸

(いずれも土砂災害による被害と判明した箇所のみ)

石川県	38件
新潟県	14件
富山県	12件

※1:都道府県から土砂災害発生箇所として報告された件数

①石川県輪島市熊野町



②石川県輪島市市ノ瀬町




安否不明者:3名

③石川県珠洲市仁江町



死者:9名
負傷者:2名

④石川県鳳珠郡穴水町川島

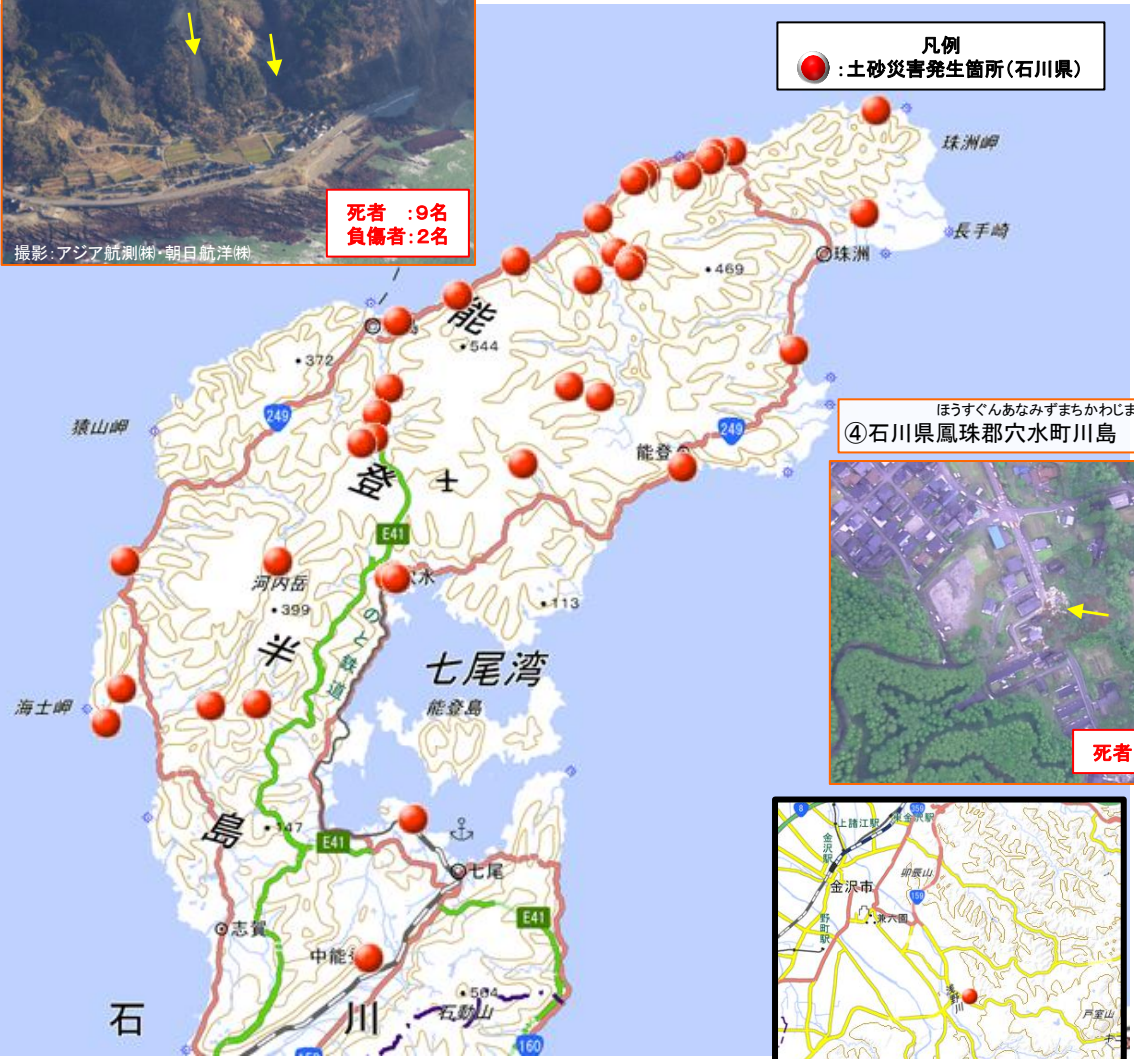

※これは速報値であり、今後数値等が変わる可能性があります。



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 被災状況調査班(道路) 活動状況～【東北地方整備局】

1月11日(木)の活動状況

<当日の活動内容>

- ・ 道路全6班で穴水町内の被災状況調査を実施。
- ・ 本日は、101路線の状況調査を実施。
- ・ 6日から本日までの調査成果を吉村穴水町長へ手交。



穴水町長へ調査成果を説明




吉村
穴水町長

雫石班長



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～【中部地方整備局】

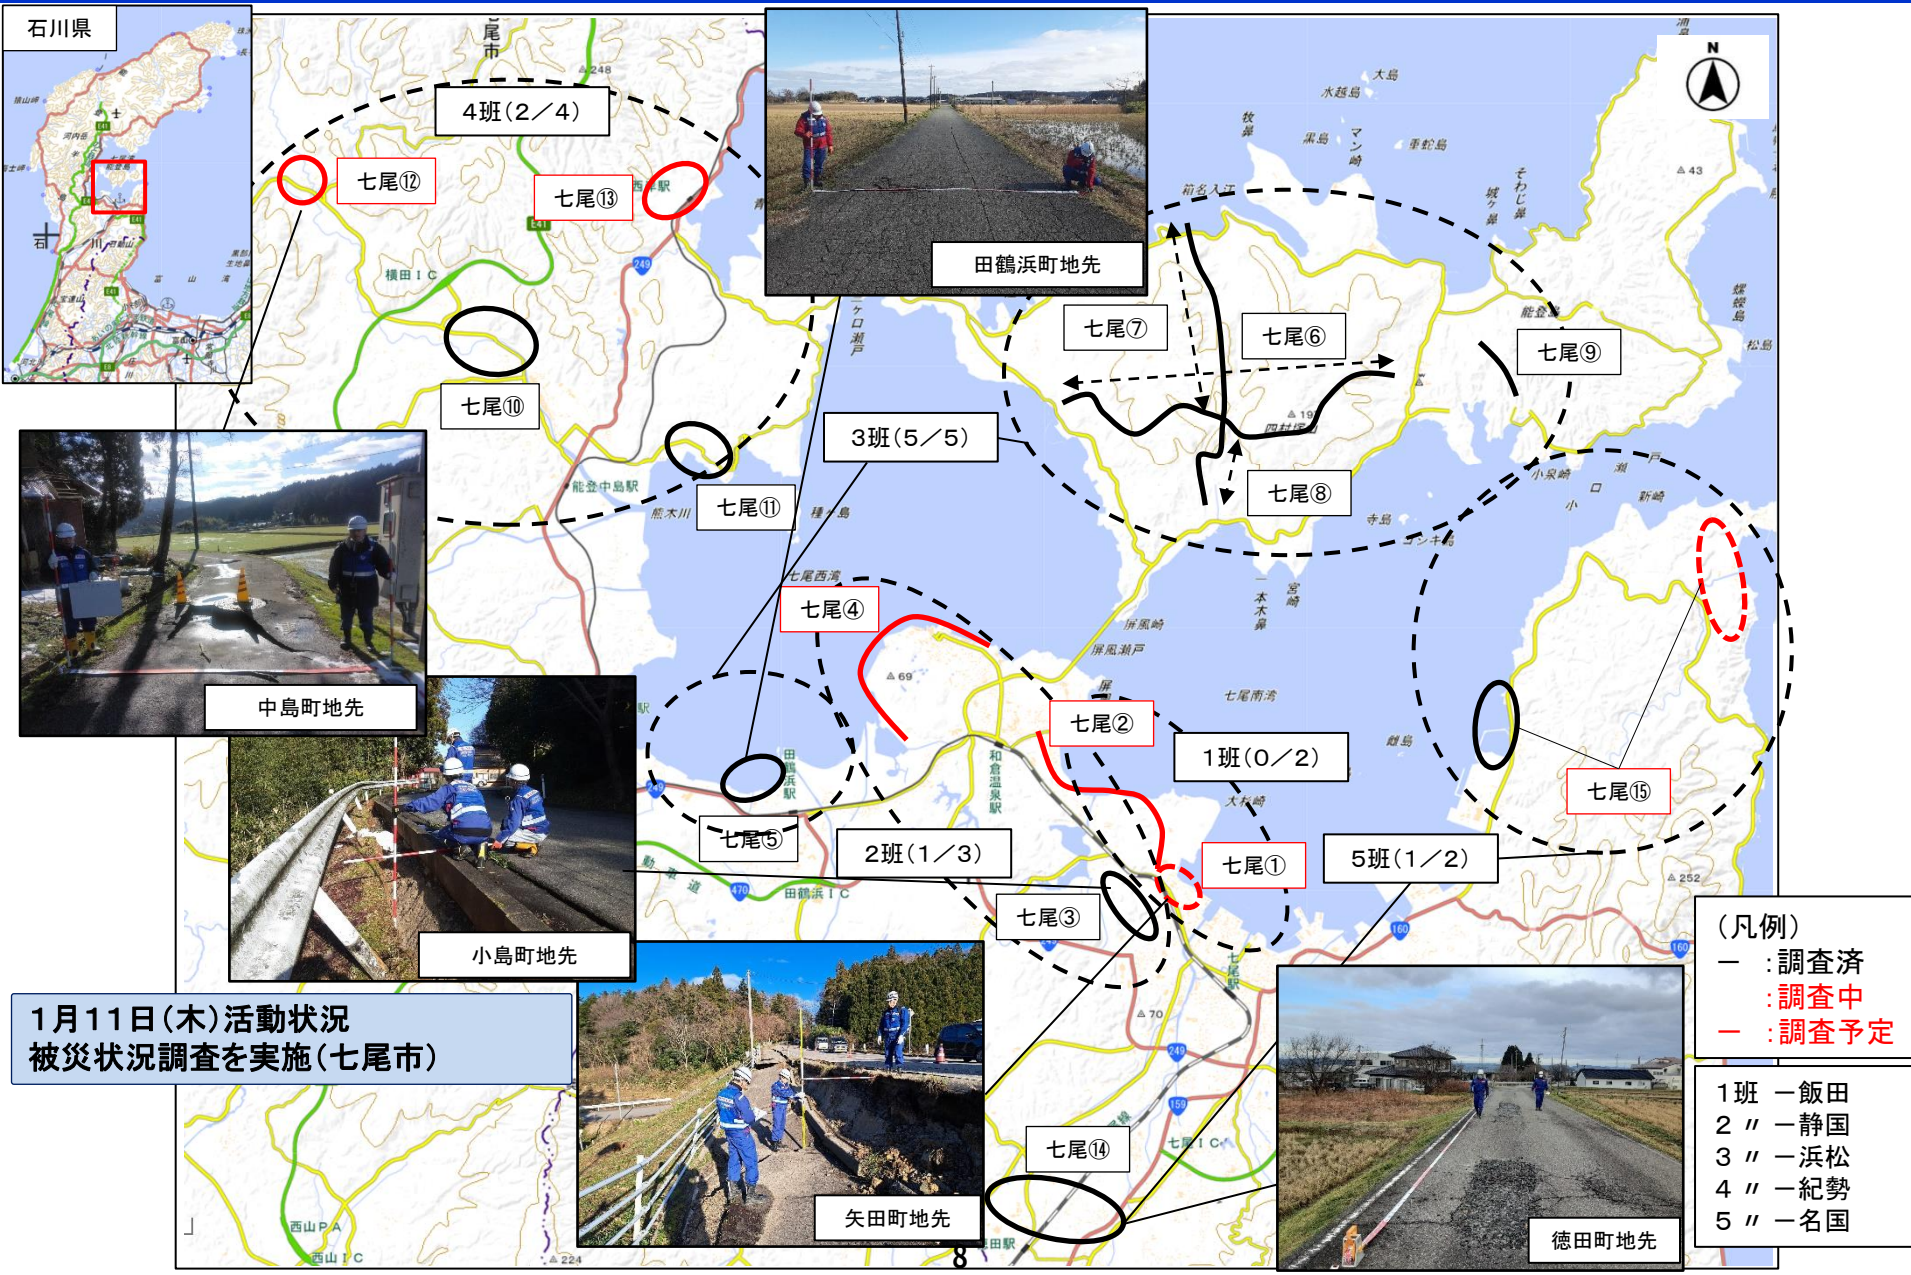



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～【関東地方整備局】

1月11日(木)の活動状況

<当日の活動内容>

- ・被災状況調査（輪島市、穴水町、七尾市）
※志賀町は被害状況未調査(2箇所)

<翌日の活動予定>

- ・被災状況調査
（輪島市、志賀町、穴水町、七尾市）



位置図(調査箇所)



被害状況調査(石川県輪島市大野地区)



被害状況調査(石川県輪島市西脇町)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月11日(木)現地調査概要

河川調査班第1班～第7班により、
2市4町(輪島市、珠洲市、志賀町、
中能登町、穴水町、能登町)で現地
調査及び資料作成等実施

1月12日(金)の予定

被災箇所に関する資料作成等実施



第3班 志賀町護岸被災状況調査



第5班 中能登町橋梁被災状況調査



第2班 能登町護岸被災状況調査



第3班 志賀町被災状況説明



第5班 中能登町資料作成状況



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 港湾空港調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月11日(木)の活動状況

・当日の活動内容

飯田港、福浦港、滝港
の被災状況調査

・翌日の活動予定

宇出津港、七尾港、穴水港

・その他特記事項

特になし



飯田港 被災状況調査(港湾業務艇「わかなⅡ」からの施設点検)



飯田港 港湾業務艇「わかなⅡ」での
打ち合わせ状況



調査箇所: 飯田港、福浦港、滝港



福浦港 被災状況調査



滝港 被災状況調査



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 建築物応急危険度判定班 活動状況～ 【本省・関東・近畿地方整備局】

1月11日(木)の活動状況
被災建築物の応急危険度判定を実施
(判定実施箇所: 珠洲市・輪島市)



判定実施箇所: 石川県珠洲市・輪島市



応急危険度判定の様子①
(石川県珠洲市)



応急危険度判定の様子②
(石川県珠洲市)



応急危険度判定の様子③
(石川県珠洲市)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 機械班 活動状況～【関東地方整備局】

1月11日(木)の活動状況

＜当日の活動内容＞

- ・散水車派遣(珠洲市)
- ・照明車派遣(志賀町、輪島市)

＜翌日の活動予定＞

- ・散水車派遣(珠洲市)
- ・照明車派遣(志賀町、輪島市)



位置図



照明車による活動状況(輪島市内)



照明車による活動状況(輪島市内)

北陸地方整備局対応状況（第21報）

令和6年1月12日7時30分現在

1. 北陸地方整備局の災害対応状況

令和6年能登半島地震に対する被害を警戒し、1月1日16時10分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

2. 北陸地方整備局の防災体制状況

1月12日7時30分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

3. 北陸地方整備局管内 総括情報

1) 人的被害

- 石川県：死者213名（七尾市5名、輪島市83名、珠洲市98名、
羽咋市1名、志賀町2名、穴水町20名、能登町4名）
行方不明者 37名（七尾市1名、輪島市33名、珠洲市3名）
重傷173名（珠洲市軽傷含む）（輪島市9名、珠洲市145名、
志賀町3名、中能登町1名、穴水町5名、能登町10名）
軽傷394名（金沢市9名、七尾市3名、小松市1名、輪島市 42名、
羽咋市7名、白山市2名、野々市市1名、津幡町1名、
志賀町77名、中能登町1名、穴水町225名、
能登町25名）
- 富山県：重傷 3名（富山市2名、射水市1名）
軽傷40名（富山市16名、高岡市3名、魚津市2名、氷見市9名、
黒部市5名、砺波市1名、小矢部市2名、射水市2名）
- 新潟県：重傷5名（新潟市1名、長岡市1名、見附市2名、上越市1名）
軽傷43名（新潟市20名、長岡市4名、三条市3名、柏崎市3名、
小千谷市3名、糸魚川市4名、五泉市1名、上越市5名）

2) 物的被害

- 石川県：
- ・住宅・非住宅被害 多数
（輪島市多数、珠洲市多数、かほく市多数、能登町多数、
内灘町多数、金沢市5件、七尾市359件、加賀市166件、
羽咋市15件、白山市56件、能美市89件、
野々市市19件、川北町2件、志賀町71件、
宝達志水町1件、中能登町52件、穴水町1000件）

■富山県：

・住宅・非住宅被害 2, 205 件

(富山市 264 件、高岡市 511 件、魚津市 17 件、
氷見市 205 件、滑川市 32 件、黒部市 7 件、砺波市 21 件、
小矢部市 404 件、南砺市 7 件、射水市 626 件、
上市町 35 件、立山町 6 件、入善町 18 件、朝日町 52 件)

■新潟県：

・住宅・非住宅被害 2, 444 件

(新潟市 494 件、長岡市 49 件、三条市 84 件、
柏崎市 118 件、新発田市 4 件、小千谷市 10 件、
加茂市 31 件、十日町市 16 件、見附市 19 件、
燕市 204 件、糸魚川市 374 件、妙高市 8 件、五泉市 70 件、
上越市 834 件、阿賀野市 29 件、佐渡市 85 件、
聖籠町 1 件、阿賀町 8 件、出雲崎町 1 件、津南町 1 件、
刈羽村 4 件)

3) 港湾

○現時点での被害状況等

- ・新潟西港（管理者）
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・新潟西港（直轄）
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・新潟東港（直轄）
点検完了。異常なし。
- ・両津港
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・岩船港
点検完了。異常なし。
- ・二見港
点検完了。異常なし。
- ・小木港（新潟県）
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・赤泊港
点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・寺泊港
点検完了。異常なし。
- ・柏崎港
点検完了。異常なし。
- ・直江津港

- 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・ 姫川港
 - 点検完了。異常なし。
- ・ 魚津港
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・ 伏木富山港（富山地区）
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・ 伏木富山港（新湊地区）
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
 - ガントリークレーン 2 基のうち 1 基（NC-1）使用不可（1 基による荷役は可能）。
 - ＜国有港湾施設＞
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・ 伏木富山港（伏木地区）
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
 - ＜国有港湾施設＞
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
 - ＜補助施設＞
 - 伏木港大橋及び接続する陸橋（左岸側）（通行止め中）
- ・ 輪島港
 - 1/3 TEC-FORCE（国総研等）調査結果、水平変位約 2 m だが利用は可能。海保調査の結果前面水深の地盤隆起あり。
 - 1/4 輪島港岸壁応急復旧（仮設道路築造）着手、完了。
 - 1/8 マリントウン岸壁防舷材 1 基脱落、設置に向け準備中
 - 1/9 空気式防舷材（4 基）は 1/10 陸送により輪島港運搬済。設置場所設置方法等は検討中。
- ・ 飯田港
 - 1/3 TEC-FORCE（港空研等）調査結果、岸壁(-5m)：大きな変位、沈下あり。利用不可。岸壁(-4.5m)：海側への残留変位あり。背後との段差あり。小型船の係留のみ利用可能。水域の航路啓開が必要。
 - 1/8 岸壁（-4.5m）応急復旧中。1/9 完了
 - 1/9 1/11～13 に飯田地区全体で深浅測量を実施中。
- ・ 宇出津港
 - へりによる被害状況調査
 - いやさか広場近くの船着場で沈下及びひび割れ。
 - 南第 2 防波堤背後の物揚場(-4.0m)でエプロンひび割れ。南防波堤背後の物揚場(-4.0m)でエプロンの沈下。（直轄）
 - 1/3 14:40 TEC-FORCE 調査完了
 - 1/7 海上保安庁による深浅測量（マルチビーム）を実施
- ・ 小木港（石川県）
 - 1/5 TEC-FORCE（金沢港湾）調査、岸壁(-5m)：はらみ、隆起、沈下あり、利用不可
 - 1/7 海上保安庁による深浅測量（マルチビーム）を実施
 - 1/10 潜水調査完了

- ・穴水港
 - へりによる被害状況調査
 - 物揚場(-4.0m) 2バースでエプロン沈下。物揚場(-4.0m)で岸壁前出し及び沈下。穴水宝山マリーナでエプロン沈下及び液状化。乗用車がエプロン陥没箇所転落。マリーナ側護岸(遊歩道)背後に土砂崩れ。(直轄)
- ・滝港
 - へりによる被害状況調査
 - 物揚場エプロン陥没あり。
 - 物揚場背後の埠頭用地 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)、排水口付近に損傷確認。
 - 物揚場法線 変状は見られない。
 - 護岸背後駐車場 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)、エプロンに陥没あり。(直轄)
- ・金沢港
 - 1/4 TEC-FORCE (港空研等) 調査結果、御供田1、2号岸壁(-10m):海側への大きな変位、利用不可。戸水岸壁(-10m):岸壁はらみ出し等、利用不可。
- ・七尾港
 - 1/3 TEC-FORCE (国総研等) 矢田新さん橋(第一西)(-7.5m)調査結果、岸壁エプロン及び栈橋に沈下あり、条件付で利用可能。
 - 1/5 TEC-FORCE (国総研等) 矢田新岸壁(第二東)調査結果、条件付で利用可能。
 - 1/8 港湾業務艇「わかなⅡ」による深浅測量(マルチビーム)を実施
- ・福浦港
 - 物揚場背後ふ頭に段差あり。臨港道路にひび割れあり。(管理者)
- ・塩屋港
 - 特に被害は見当たらない。(管理者)
- ・和倉港(管理者;七尾市)
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
 - 1/4 TEC-FORCE (敦賀港) 調査完了。
- ・半ノ浦港(管理者;七尾市)
 - 1/5 TEC-FORCE (敦賀港) 調査完了。
- ・福井港海岸
 - 点検完了。異常なし。
- ・敦賀港
 - 点検完了。異常なし。
- ・福井港
 - 点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。
- ・和田港
 - 点検完了。異常なし。
- ・内浦港
 - 点検完了。異常なし。
- ・鷹巣港
 - 点検完了。異常なし。

4) 下水道

○石川県

- ・処理場

全 57 箇所（被害無:33 箇所、機能確保済:18 機能停止（流入汚水なし）:6）

- ・ポンプ場

全 52 箇所（被害無:38 箇所、機能確保済:10 機能停止（流入汚水なし）:4）

- ・管路施設

点検対象 18 市町村（被害無:1 市町村、点検中:17 市町村）

○富山県

- ・処理場

全 29 箇所（被害無:26 箇所、機能確保済:3）

- ・ポンプ場 被害なし

- ・管路施設

点検対象 13 市町村（被害無:6 市町村、点検中:7 市町村）

○新潟県

- ・処理場

全 83 箇所（被害無:79 箇所、機能確保済:4）

- ・ポンプ場 被害なし

- ・管路施設

点検対象 28 市町村（被害無:24 市町村、機能確保済:3 市町村、点検中:1 市町村）

4. 幹線道路の被害状況

1) 高速道路（通行止めなし）

2) 直轄国道（2 路線、2 箇所）

- ・ R 8 上越市茶屋ヶ原（上下） 土砂崩落 通行止
- ・ R 4 7 0 のと三井 I C ～穴水 I C（上下） 通行止

3) 補助国道（3 路線、2 7 箇所）

<新潟県: >

- ・被災の箇所なし

<富山県: 2 路線、3 箇所>

<石川県: 2 路線、2 4 箇所>

4) 都道府県道等（6 2 路線、8 6 箇所）

<新潟県: 2 1 路線、2 1 箇所>

<富山県: 5 路線、5 箇所>

<石川県: 3 6 路線、6 0 箇所>

国道 2 4 9 号等において、大規模な崩落等を多数確認。日本建設業連合会の協力を得

て、道路啓開を実施中

5. 河川関係等の被害状況

1) 直轄

(直轄河川)

・石川県

○震度5強

手取川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

梯川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・富山県

○震度5強

常願寺川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

神通川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

小矢部川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所

庄川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
堤防天端の亀裂1カ所

○震度5弱

黒部川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・新潟県

○震度6弱

信濃川下流：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤体の沈下3カ所、堤防天端の亀裂4カ所、
堤防法面の亀裂1カ所

信濃川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所

○震度5強

関川：1次点検完了 異常なし、
2次点検完了 護岸損傷1カ所、舗装クラック1カ所、
特殊堤損傷1カ所

姫川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

○震度5弱

阿賀野川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

・長野県

○震度5弱

千曲川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

(直轄ダム)

・石川県

○震度4

手取川ダム 1次点検完了 異常なし

・富山県

○震度 4

宇奈月ダム 1 次点検完了 異常なし

・新潟県

○震度 5 強

三国川ダム 1 次・2 次点検完了 異常なし

○震度 4

大石ダム 1 次点検完了 異常なし

・山形県

○震度 4

横川ダム 1 次点検完了 異常なし

(直轄砂防)

- ・立山砂防事務所：点検対象市町村数 2 市町、点検完了 異常なし
- ・神通川水系砂防事務所：点検対象市町村数 2 市、点検完了 異常なし
- ・阿賀野川河川事務所：点検対象市町村数 1 町、点検完了 異常なし

(直轄海岸)

- ・石川県：石川海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、
巡視完了 異常なし
- ・富山県：下新川海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、
巡視完了 異常なし
- ・新潟県：新潟海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、
巡視完了 ブロック沈下1箇所

2) 都道府県

(補助河川)

- ・石川県：点検対象 6 2 水系 2 1 2 河川、点検中 6 9 河川で護岸の沈下・河道
閉塞等あり
- ・富山県：点検対象 1 4 水系 2 8 河川、点検完了 1 2 河川で護岸の沈下等あり
- ・新潟県：点検対象 4 5 水系 2 9 6 河川、点検完了 9 河川で護岸の沈下等あり
- ・長野県：点検対象 1 水系 2 河川、点検完了 異常なし
- ・岐阜県：点検対象 1 水系 1 河川、点検完了 異常なし

(補助ダム)

- ・石川県：点検対象 1 1 ダム 点検完了 1 1 ダム うち 9 ダム 被害なし、
うち 2 ダム 損傷あり（北河内ダム：貯水池周辺斜面小規模崩落、ダム
堤内のポンプ故障、小屋ダム：ダム天端舗装に一部クラック、ダム
堤体表面被覆の一部変状等）
- ・富山県：点検対象 1 6 ダム 点検完了 1 6 ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象 1 8 ダム 点検完了 1 8 ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象 8 ダム 点検完了 8 ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象 1 ダム 点検完了 1 ダム 被害なし

(利水ダム)

- ・石川県：点検対象10ダム 点検完了10ダム 被害なし
- ・富山県：点検対象37ダム 点検完了37ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象39ダム 点検完了39ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象8ダム 点検完了8ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象11ダム 点検完了11ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象18ダム 点検完了18ダム 被害なし
- ・山形県：点検対象1ダム 点検完了1ダム 被害なし

(補助砂防)

- ・石川県：点検対象市町村数 15市町、点検中
- ・富山県：点検対象市町村数 12市町、点検完了12市町 施設異常なし
- ・新潟県：点検対象市町村数 28市町村、点検完了28市町村 施設異常なし

(補助海岸)

- ・石川県：25海岸 19海岸点検完了。
6海岸で天端被覆工沈下、護岸被災等あり。
その他異常なし。その他順次点検予定。
- ・富山県：7海岸 7海岸点検完了。異常なし。
- ・新潟県：27海岸 27海岸点検完了。異常なし。

6. 自治体支援の状況

1) ホットライン

- ・震度5弱以上を観測した37市14町3村とのホットライン確立済み
- ・支援要請調整中

2) リエゾン・TEC-FORCE

- ・令和6年1月12日7時30分現在、133班446人を派遣中。
詳細は別表のとおり

3) 災害対策機械

派遣日	派遣先	機械名	台数	人員	活動状況
1月2日～ 1月4日	石川県かほく市 (かほく市役所)	給水車	1台	協力業者 3名 ※1月4日より、中部地方整備局から派遣の車両による支援	活動終了
1月4日～	石川県かほく市 (かほく市役所)	給水車	1台	中部地方整備局 1名 協力業者 4名	活動終了
1月2日～ 1月4日	富山県氷見市 (氷見市教育文化センター)	給水車	1台	協力業者 2名 ※1月4日より、中部地方整備局から派遣の車両による支援	活動終了

1月4日～	富山県氷見市 (氷見ふれあいスポーツセンター他)	給水車	1台	中部地方整備局 1名 協力業者 4名	活動中
1月4日～	石川県珠洲市	給水車	4台	関東地方整備局 3名 協力業者 4社 10名	活動中
1月4日	石川県七尾市	給水車	1台	近畿地方整備局 1名 協力業者 3名	活動終了
1月5日～	石川県中能登町	給水車	2台	近畿地方整備局 2名 協力業者 2社 7名	活動中
1月5日～	石川県能登町	給水車	6台	協力業者 6社 11名	活動中
1月6日～	石川県志賀町	給水車	1台	中国地方整備局 2名 協力業者 3名	活動中
1月4日	新潟県上越市茶屋ヶ原	照明車	2台	協力業者 4名	現地待機
1月4日～	石川県七尾市石崎町	排水ポンプ車	1台	協力業者 3名	活動中
<u>1月4日～</u> <u>11日</u>		<u>照明車</u>	<u>1台</u>		<u>活動終了</u>
1月4日～ 1月5日	石川県七尾市中島町河内	照明車	1台	協力業者 2社 4名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県珠洲市 (珠洲市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県輪島市 (輪島市役所)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県能登町 (能登町役場)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日～ 1月6日	石川県穴水町 (穴水町役場)	照明車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月4日	石川県中能登町 (中能登町役場)	照明車	1台	協力業者 1名	活動終了
1月4日～	石川県志賀町 (志賀町役場)	照明車	1台	関東地方整備局 2名 協力業者 1名	現地待機
1月5日～	石川県輪島市 (国道249号道路啓開)	照明車	9台	協力業者 9社	活動中
1月7日～	石川県輪島市 (国道249号道路啓開)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	活動中
1月4日	石川県珠洲市 (珠洲市役所)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月5日～	石川県穴水町 (穴水町役場)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	活動終了
1月11日 ～	石川県 <u>珠洲市</u> (<u>県道40号道路啓開</u>)	衛星通信車	1台	協力業者 2名	準備中

1月2日～	石川県輪島市、珠洲市	Car-SAT	1台	北陸地方整備局 2名	活動中
1月5日～	石川県輪島市、珠洲市	Car-SAT	1台	関東地方整備局 2名	活動中
1月5日～	石川県輪島市	Car-SAT	1台	中部地方整備局 2名	活動終了
1月6日～	石川県珠洲市	照明車 (電源供給)	5台	中国地方整備局	活動中
1月7日～	石川県輪島市	照明車 (電源供給)	6台	関東地方整備局	活動中

4) 可搬式浄水装置による給水支援

- ・可搬式浄水装置 2 台（水資源機構が保有）を派遣（石川県珠洲市）（1 月 5 日～）
12 日からは飲用に適した水を提供予定

7. 防災ヘリ

(ほくりく号)

1月2日 7:35～10:20、11:15～13:00

新潟県・富山県の被災状況調査（港湾）を実施

1月3日 石川県の被災状況調査（河川）は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 13:20～15:55

石川県の被災状況調査（道路）を実施

1月5日 9:22～12:00、13:30～16:15

石川県の被災状況調査（河川）を実施

1月9日 10:20～11:20

石川県の被災状況調査（道路）を実施

(みちのく号)

1月2日 9:52～12:32、13:39～16:20

石川県の被災状況調査（河川・港湾）を実施

1月3日 石川県の被災状況調査（道路）は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 11:13～13:38

石川県の被災状況調査（河川）を実施

1月5日 11:43～14:15

石川県の被災状況調査（道路）を実施。東北地方整備局に帰還

1月11日 10:40～12:51

石川県の被災状況調査（道路）を実施

(あおぞら号)

1月2日 10:05～12:21、13:32～15:08

石川県の被災状況調査（道路）を実施。関東地方整備局に帰還

8. 物資支援

令和6年1月11日12:00時点に各自治体に提供された数量

※1月1日～1月11日12時時点の物資・資材支援の集計で速報値であり、今後変わる場合があります。

■支援物資提供者

- ・北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、九州地方整備局
- ・村上市
- ・国立研究開発法人 土木研究所
- ・一般社団法人 日本建設業連合会
- ・一般社団法人 石川県建設業協会
- ・一般社団法人 長野県建設業協会
- ・一般社団法人 日本埋立浚渫協会
- ・北陸港湾空港建設協会連合会
- ・イオン株式会社

■支援内容 ※（ ）は前回報告からの増分

①石川県

<珠洲市>

飲料水 (0.5ℓ)	<u>8,536 本 (5,000 本)</u>	ブルーシート	<u>3,305 枚 (5 枚)</u>
飲料水 (1.5ℓ)	2,184 本 (0 本)	土嚢袋	15,490 個 (0 個)
飲料水 (2.0ℓ)	2,144 本 (0 本)	トラロープ	1,000m (0m)
給水袋	277 個 (0 個)	簡易トイレ袋	<u>6,600 袋 (4,500 袋)</u>
食料	2,630 食 (0 食)	仮設トイレ	46 台 (0 台)
カイロ	<u>3,090 個 (3,000 個)</u>		等

<輪島市>

飲料水 (0.5ℓ)	12,400 本 (0 本)	ブルーシート	<u>2,390 枚 (80 枚)</u>
飲料水 (1.5ℓ)	1,312 本 (0 本)	土嚢袋	800 個 (0 個)
飲料水 (2.0ℓ)	598 本 (0 本)	トラロープ	200m (0m)
給水袋	1,290 個 (0 個)	投光器	10 台 (0 台)
食料	13,894 食 (0 食)	仮設トイレ	10 個 (0 個)
カイロ	2,900 個 (0 個)	簡易トイレ	<u>7,900 個 (7,000 個)</u>
衛生用品	3,200 個 (0 個)	非常用トイレ	300 個 (0 個)
全身用ウェットタオル (10 枚入)	80 個 (80 個)	ガソリン携行缶 (20ℓ)	1 個 (1 個)
自転車	<u>5 台 (5 台)</u>		等

<能登町>

飲料水 (0.5ℓ)	<u>6,200 本 (5,000 本)</u>	ブルーシート	830 枚 (0 枚)
飲料水 (1.5ℓ)	294 本 (0 本)	投光器	5 台 (0 台)
飲料水 (2.0ℓ)	360 本 (0 本)	簡易トイレ	<u>3,550 個 (3,500 個)</u>
食料	<u>5,692 食 (5,000 食)</u>	カラーコーン	300 個 (0 個)
カイロ	60 個 (0 個)	バリケード	100 本 (0 本)
採石	<u>127 個 (127 個)</u>		

等

<七尾市>

飲料水 (0.50)	504 本 (0 本)	ブルーシート	500 枚 (0 枚)
食料(食)	294 食 (0 食)	カラーコーン	500 個 (0 個)
カイロ	2,000 個 (0 個)	投光器	10 台 (0 台)

等

<中能登町>

ブルーシート	645 枚 (0 枚)	土嚢袋	400 袋 (0 枚)
防災シート	81 枚 (0 枚)		

等

<穴水町>

飲料水 (0.50)	5,216 本 (0 本)	ブルーシート	610 枚 (0 枚)
飲料水 (1.50)	126 本 (0 本)	投光器	5 台 (0 台)
飲料水 (2.00)	144 本 (0 本)	簡易トイレ	3,800 個 (0 個)
食料	835 食 (0 食)	カイロ	150 個 (0 個)
仮設トイレ	12 個 (0 個)	カラーコーン	200 個 (0 個)
コーンバー	100 個 (0 個)	矢印看板	20 個 (0 個)
通行止め看板	30 個 (0 個)	耐候性大型土嚢	100 個 (0 個)
土嚢袋 (480×620)	400 個 (0 個)		

等

<宝達志水町>

ブルーシート	<u>1,950 枚 (0 枚)</u>	土嚢袋	<u>5,000 袋 (5,000 個)</u>
カラーコーン	<u>100 個 (100 個)</u>	コーンバー	<u>50 個 (50 個)</u>

<志賀町>

ブルーシート	772 枚 (0 枚)	トラロープ	200m (0m)
マスク	30,000 枚 (0 枚)	アルコール	300ℓ (0ℓ)
ウェットティッシュ	1,944 箱 (0 箱)	土嚢袋	2,600 袋 (0 袋)

<羽咋市>

土嚢袋	5,528 袋 (0 袋)	ブルーシート	100 枚 (0 枚)
-----	---------------	--------	-------------

<内灘町>

土嚢袋	5,000 袋 (0 袋)	ブルーシート	1,011 枚 (0 枚)
白シート	16 枚 (0 枚)	カラーコーン	100 個 (0 個)

②富山県

<氷見市>

飲料水 (0.50)	1,080 本 (0 本)	ブルーシート	<u>700 枚 (200 枚)</u>
カラーコーン	<u>200 個 (100 個)</u>	土嚢袋	1,000 袋 (0 袋)

<高岡市>

ブルーシート	437 枚 (0 枚)	土嚢袋	18,000 袋 (0 袋)
--------	-------------	-----	----------------

<魚津市>

ブルーシート 100 枚 (0 枚)

<射水市>

カラーコーン 100 個 (0 個) コーンバー 50 個 (0 個)

コーンウエイト 60 個 (0 個) 常温合材 50 袋 (0 袋)

<小矢部市>

カラーコーン 100 個 (100 個) コーンバー 50 個 (50 個)

9. 関係団体による支援

- ・石川県建設業協会の協力により、孤立している七尾市中島町河内地区の町道の道路啓開作業を展開（1月5日8:40作業完了⇒9:00孤立解消）
- ・日本埋立浚渫協会北陸支部及び中部支部により、珠洲市への支援物資輸送に着手。搬入完了
- ・九州地方整備局浚渫兼油回収船「海翔丸」で支援物資を輸送し七尾港に到着。日本埋立浚渫協会北陸支部が輪島市への陸上輸送を実施（1月5日物資の搬入完了）
- ・国道249号において、大規模な崩落等を多数確認。日本建設業連合会の協力を得て、道路啓開を実施または準備中
- ・建設電気技術協会北陸支部へ電気通信施設の応急対策を要請。
- ・日本埋立浚渫協会に緊急復旧を要請
 - 1/4～1/5 輪島港マリンタウン岸壁(-7.5m)背後の仮設道路築造完了
 - 1/8～1/9 飯田港岸壁(-4.5m)背後埋戻及び仮設道路築造完了
- ・海洋調査協会に被災した港湾の測量調査を要請
 - 1/8 七尾港 大田岸壁調査、以降その他港湾を調査中
- ・日本潜水協会に入出港時に支障となる障害物の潜水調査を要請
 - 1/8 飯田港 岸壁(-4.5m)前面潜水調査完了
 - 1/9 輪島港 マリンタウン岸壁(-7.5m)前面潜水調査完了
 - 1/10 小木港 岸壁(-4.5m)前面潜水調査完了
- ・北陸港湾空港建設協会連合会に輪島市へ支援物資輸送を要請
- ・「フェリー栗国」（宮崎県延岡進行 1/9 出港）が1月10日金沢港入港。金沢港で資機材積み込み後、輪島港入港済。

※その他、物資支援に関与を受けた機関については「8. 物資支援」を参照

10. その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

X(旧 Twitter)

URL : <https://www.hrr.mlit.go.jp/>



TEC-FORCE派遣状況

【別表】

令和6年1月12日_0730時点

区分	所属	派遣先	班数	人数
本省班	本省	石川県庁	1	22
先遣隊（総合司令班）	東北地整		2	6
	関東地整		1	4
	中部地整		1	4
	近畿地整		1	3
	中国地整		1	4
	国総研		1	1
リエゾン	本局	石川県庁	1	7
	本局	志賀町	1	1
	本局	穴水町	1	1
	本局	七尾市	1	1
	本局	輪島市	1	2
	港湾空港部	輪島市	1	1
	港湾空港部	珠洲市	1	1
	本局	珠洲市	1	2
	本局	中能登町	1	1
	本局	能登町	1	1
道路啓開班	本局	道路啓開支援センター (能登空港 多目的広場)	1	2
	羽越河国、長国、金 沢河国、富山河国、 本局	輪島市、珠洲市	5	10
道路調査班（市町道）	中部地整	七尾市	1	3
	東北地整	穴水町	1	4
	中国地整	輪島市	3	13
	九州地整	輪島市	8	24
道路調査班（被災状況）	東北地整	穴水町	5	20
	関東地整	志賀町	6	24
	中部地整	七尾市	5	20
	近畿地整	珠洲市	6	24
	中国地整	輪島市	2	8
	中国地整	能登町	1	4
	四国地整	珠洲市	4	16
砂防調査班	湯沢	石川県庁	1	4
	飯豊	珠洲市	1	4
	松本	能登町	1	4
	東北地整	珠洲市	5	20
	関東地整	七尾市	1	4
	関東地整	志賀町	1	4
	関東地整	穴水町	1	4
	関東地整	輪島市	3	12
	中部地整	輪島市	4	16
	近畿地整	輪島市	5	20
	中国地整	能登町	3	12

区分	所属	派遣先	班数	人数
河川調査班	羽越、信下	珠洲市	1	4
	信濃川	能登町	1	4
	利賀	志賀町	1	4
	千曲	穴水町	1	4
	阿賀野川、阿賀川	中能登町	1	4
	金沢河国	輪島市	1	3
	黒部	輪島市	1	4
港湾調査班	本局、金沢港湾、敦賀港湾、関東地整	宇出津港、七尾港、穴水港	4	11
建築物応急危険度判定班	本省	珠洲市	1	3
	関東地整	輪島市	2	6
	近畿地整	珠洲市	1	3
応急対策班（散水車・照明車）	北技、羽越、本局	富山BC	1	4
	長国、千曲川、北技	富山BC	1	4
	東北地整（散水車）	珠洲市	2	4
	関東地整（散水車）	珠洲市	1	2
	中部地整（散水車）	氷見市	1	1
	中部地整（散水車）	能登町	1	1
	近畿地整（散水車）	中能登町	2	4
	中国地整（散水車）	志賀町、能登町	1	2
	関東地整（照明車）	志賀町、輪島市	1	2
	中部地整（照明車）	珠洲市、輪島市	1	2
	中国地整（待機支援車）	富山県・石川県	1	1
水道支援班	北海道	石川県庁	1	2
	東北地整	輪島市	1	2
	関東地整	珠洲市	1	4
	中部地整	七尾市	1	2
	近畿地整	穴水町	1	2
	中国地整	志賀町	1	2
	四国地整	能登町	1	2
電源支援班	関東地整	輪島市	1	8
	関東地整	富山BC	1	1
	中国地整	珠洲市	1	2
ヘリサット		河川	1	1
衛星通信車（CAR-SAT）	松本砂防	珠洲市	1	1
	関東地整	輪島市	1	2
			133	446
