

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月29日(月)7時00分時点
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、10方向で通路を確保。
- 孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電気などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約9割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約8割 (迂回路を考慮: 約9割)
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	10方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

孤立地区数の推移 ※1

1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
1月21日16時	実質的に解消 (4地区14人) ※2

※1: 内閣府防災資料より
※2: 避難の意向なし

写真④ 国道249号法面崩落



R6.1.2 時点

写真⑤ 国道249号大谷ループ橋



R6.1.8 時点

写真⑥ 国道249号大谷トンネル



R6.1.6 時点

写真① 国道249号中屋トンネル



R6.1.12 時点

写真② 国道249号作業状況




R6.1.9 時点

のと里山海道 柳田ICから横田IC間(北向き一方通行)
金沢から穴水方向のみ通行可 ※一般車両通行止め



写真③ 国道249号緊急復旧完了



1/14 復旧前

1/15 復旧後

凡例

- : 国交省対応 (走行可能)
- : 県対応 (走行可能・この他にも作業を実施)
- : 自衛隊対応 (走行可能)
- : 自動車専用道路 (走行可能)
- : 自動車専用道路 (走行不可)
- ✕ : 被災規模 大
- : 孤立集落 (内閣府防災資料)
- ★ : 国復旧業者作業箇所
- : 沿岸部への到達点

令和6年能登半島地震(最大震度7)による土砂災害発生状況

令和6年1月29日6時00分時点

土砂災害発生件数

181件※1

【被害状況】

家屋被害：全壊	：42戸
半壊	：11戸
一部損壊	：8戸

(いずれも土砂災害による被害と判明した箇所のみ)

石川県	151件
新潟県	17件
富山県	13件

※1：都道府県から土砂災害発生箇所として報告された件数

わじまし くまのまち
①石川県輪島市熊野町



わじまし いちのせまち
②石川県輪島市市ノ瀬町




すずし にえまち
③石川県珠洲市仁江町 【道の駅す塩田村の西側】



凡例
●：土砂災害発生箇所(石川県)



ほうすぐんあなみずまちかわじま
④石川県鳳珠郡穴水町川島

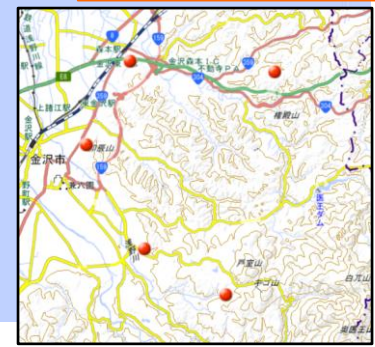

※これは速報値であり、今後数値等が変わる可能性があります。



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 被災状況調査班(道路) 活動状況～【東北地方整備局】


1月29日(月)の活動状況

- 穴水町へ中間報告実施
- 現地調査実施(5班)、内業実施(1班)

1月30日(火)の活動予定

- 内業4班、現地調査2班 予定

穴水町役場への中間報告及び現地調査状況(1月29日)

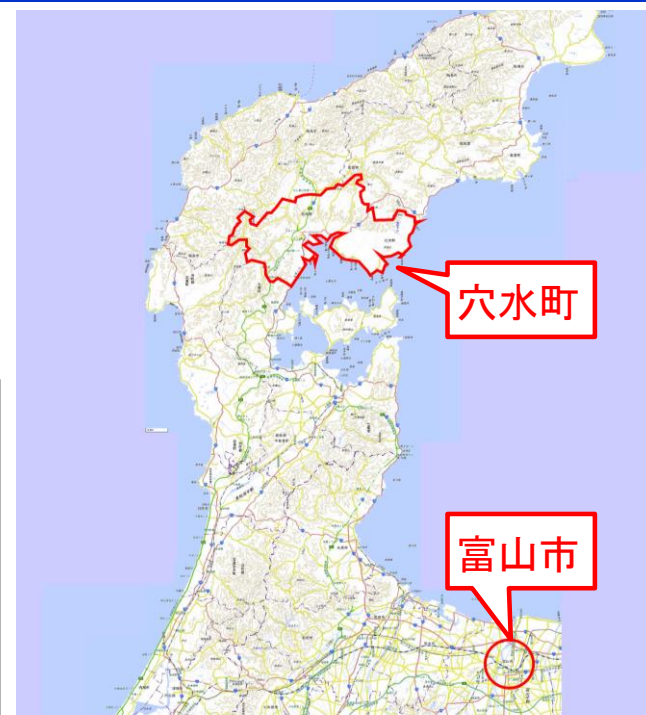



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月29日(月)の活動状況

- ・能登町 被災状況調査を実施
- ・輪島市 被災状況調査を実施

1月30日(火)の活動予定

- ・能登町 被災状況調査を実施
- ・輪島市 被災状況調査を実施



被災状況調査(輪島市_深見町地先)



被災状況調査(輪島市_深見町地先)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月29日(月)現地調査概要
2市1町(輪島市、珠洲市、能登町)で
現地調査及び資料作成等実施

1月30日(火)の予定
現地調査及び資料作成等実施



第1班 珠洲市 被災状況調査



第2班 能登町 被災状況調査



第2班 能登町 被災状況調査



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 海岸班 活動状況～【四国地方整備局】

＜1月29日(月)の活動状況＞

- ・珠洲市にて河川河口の津波遡上調査
(竹中川、磐若川)

＜翌日の活動予定＞

- ・現地調査状況とりまとめ作業
(県央総合土木事務所)



津波遡上調査(珠洲市_竹中川)



津波遡上調査(珠洲市_磐若川)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 港湾空港班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月29日(月)の活動状況 当日の活動内容

- ・小木港における安全対策の実施



調査箇所: 小木港



小木港における安全対策の実施




令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 機械班 活動状況～【関東地方整備局】

<1/29(月)の活動内容>

- ・散水車派遣(珠洲市)
- ・照明車派遣(輪島市)
- ・待機支援車 珠洲市、能登町、輪島市で稼働

<翌日の活動予定>

- ・散水車派遣(珠洲市)
- ・待機支援車 珠洲市、能登町、輪島市で稼働

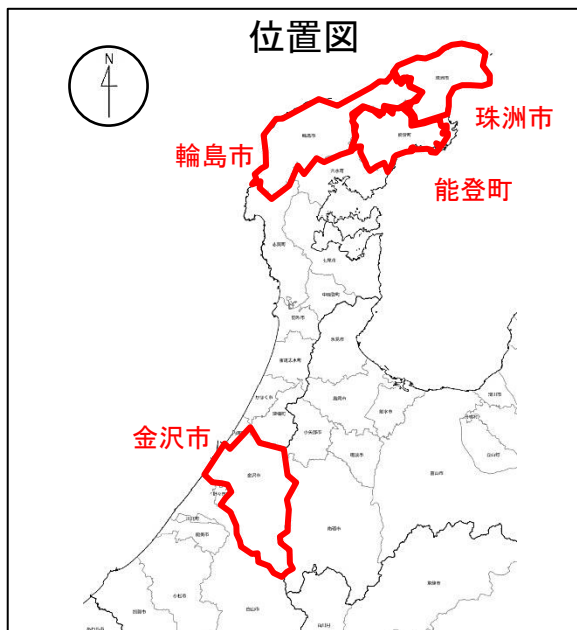

輪島市での照明車活動状況
