

令和3年3月30日
河川部

流域治水プロジェクト（とりまとめ）

～ 流域全体で行う「流域治水」への転換 213機関が参加 ～


近年頻発している激甚な水災害や気候変動による今後の降雨量の増大と水災害の激甚化・頻発化に備え、集水域から氾濫域にわたる流域全体のあらゆる関係者（延べ213機関）が協働して、流域全体で水災害を軽減させる治水対策、「流域治水」への転換を進める必要があります。

このたび、北陸地方整備局管内における一級水系の流域治水プロジェクトをとりまとめましたので、発表します。

《 北陸地方整備局管内の一級水系 12水系 》

- 荒川水系（新潟県・山形県）
- 阿賀野川水系（新潟県・福島県）
- 信濃川水系（新潟県・長野県）
- 関川水系（新潟県・長野県）
- 姫川水系（新潟県・長野県）
- 黒部川水系（富山県）
- 常願寺川水系（富山県）
- 神通川水系（富山県・岐阜県）
- 庄川水系（富山県・岐阜県）
- 小矢部川水系（富山県・石川県）
- 手取川水系（石川県）
- 梯川水系（石川県）

北陸地方整備局管内河川流域図

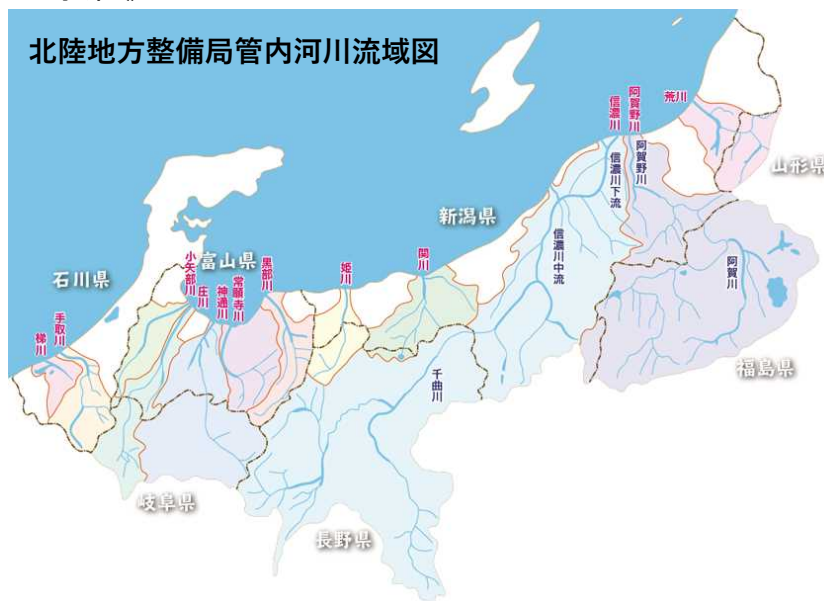

※参考資料・詳細については、[北陸地方整備局のホームページ](#)をご覧ください。

（上記をクリックしてご覧いただけます）

同時発表記者クラブ
新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場
山形県政記者クラブ

問い合わせ窓口

国土交通省北陸地方整備局 河川部 [電話025-280-8880]

【ハード対策に関すること】 電話025-280-8958（課直通）

河川計画課長 後藤 健

【ソフト対策に関すること】 電話 025-370-6770（課直通）

水災害対策センター長 鈴木 忠彦

流域治水プロジェクト

～ 流域全体で行う「流域治水」への転換 213機関が参加 ～

○「流域治水プロジェクト」は、国、流域自治体、企業等が協働し、河川整備に加え、雨水貯留浸透施設や土地利用規制、既存ダムの事前放流など、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像を取りまとめたものであり、北陸管内の12水系において策定・公表しました。

流域のあらゆる関係者が協働して行う対策 北陸管内での主な対策事例

■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・堤防整備、堤防強化（浸透対策）、河道掘削、急流河川対策（護岸）、許可工作物の改築、護岸整備、河道拡幅、樹木伐採、橋梁改築、霞堤の保全
- ・治水ダムの建設・再編
- ・雨水貯留浸透・排水施設の整備
- ・砂防関係施設の整備・海岸保全施設の整備
- ・既存ダム等における事前放流等の実施、体制構築
- ・ため池等既存施設の補強や有効活用
- ・水田の貯留機能向上のための田んぼダムの取組推進
- ・森林整備、治山対策 など


■ 被害対象を減少させるための対策

- ・高床式住まいの推進
- ・住宅地盤嵩上げに対する助成
- ・立地適正化計画（防災指針）の策定による水害リスクの低い地域への居住誘導や既成市街地の防災力向上
- ・多段階な浸水リスク情報の充実 など

■ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・マイ・タイムライン作成の普及促進・支援、ハザードマップの周知
- ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成に向けた支援
- ・小中学校における防災教育の推進
- ・水位計、河川監視カメラの増設
- ・国・県・市町・住民が連携した水防訓練の取組
- ・水害リスク空白域の解消 など

■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策



大河津分水路改修事業
（信濃川水系 信濃川河川事務所）



田んぼダムの実施 荒川水系
（実施）荒川土改、
（実施支援）新潟県、村上市

■ 被害対象を減少させるための対策



高床式住まいの推進
（信濃川水系 小千谷市）



住宅地盤嵩上げに対する助成
（梯川水系 小松市）

■ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



住民参加型防災訓練
（荒川水系 胎内市）



マイ・タイムライン作成の普及促進・支援
（関川水系 信濃町）

対策のロードマップを示して連携を推進

■ 目標達成に向けた工程を段階的に示し、実施主体間の連携を促進

短期：ハード対策やソフト対策で、短期・集中対策によって浸水被害の軽減を図る期間（概ね5年間）

中期：実施中の主要なハード対策の完了など、当面の安全度向上を図る期間（概ね10年～15年間）

中長期：戦後最大洪水等に対して、流域全体の安全度向上によって浸水被害の軽減を達成する期間（概ね20～30年間）

<ロードマップのイメージ>

区分	主な対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策	堤防整備、堤防強化（浸透対策）、河道掘削等	河川事務所、県			
	水田の貯留機能向上のための田んぼダムの取組推進	県、市町村			
被害対象を減少させるための対策	高床式住まいの推進	市町村			
	多段階な浸水リスク情報の充実	河川事務所			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	マイ・タイムライン作成の普及促進・支援、ハザードマップの周知	河川事務所、県、市町村			
	水害リスク空白域の解消	河川事務所、県、市町村			

あらゆる関係者と協働する体制として協議会を設置



流域治水協議会開催の様子

■ 国、県、市町村、民間企業等延べ213機関が参画し協議会を実施
（参加機関は、各協議会規約を参照してください。）

荒川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～荒川流域の浸水被害の軽減に向けた治水対策の推進～

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、荒川水系においても、事前防災対策を進める必要があり、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、荒川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和42年羽越水害と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・河道拡幅、堤防整備、河道掘削、水衝部対策、堤防強化（浸透対策）等【羽越河国、新潟県、村上市】
- ・砂防関係施設の整備【飯豊砂防、新潟県】
- ・公共下水道雨水幹線の整備【村上市】
- ・既存ダム5ダムにおける事前放流等の実施・体制構築【羽越河国、荒川水力、赤芝水力、東北電力】
- ・田んぼダムの実施【荒川土改】及び実施支援【新潟県、村上市】
- ・ため池の防災水管理の実施支援【山形県、新潟県、村上市】
- ・森林整備対策（間伐、林道整備等）【置賜森管、下越森管村上、森林整備センター】
- ・治山対策【置賜森管、下越森管村上】

●被害対象を減少させるための対策

- ・多段階な浸水リスク情報の充実【羽越河国】

●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・避難体制の強化
（ハザードマップ作成周知、マイタイムラインの普及促進、防災教育や防災知識の普及、要配慮者避難確保計画策定）
- ・土地の水災害リスク情報の充実
（中小河川における浸水想定区域図作成）
- ・経済被害の軽減
（排水計画検討等、林道整備の推進（災害時において代替路機能））
- ・関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化
（災害時等のJETT派遣及び気象支援資料の提供）

村上市

洪水氾濫対策
・普通河川滝矢川改修（護岸整備）
内水氾濫対策
・公共下水道雨水幹線の整備
流域の雨水貯留機能の向上
・田んぼダムの実施支援
・ため池の防災水管理の実施支援

避難体制の強化
・ハザードマップ作成周知
・マイタイムラインの普及促進
・防災教育や防災知識の普及
・要配慮者避難確保計画策定 等



学校授業におけるマイタイムライン作成支援【村上市】

位置図



※本図の浸水範囲は、大臣管理区間における荒川本川の氾濫によって生じる範囲を示しており、支川等他区間の氾濫による浸水範囲は含まれていません。



荒川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～荒川流域の浸水被害の軽減に向けた治水対策の推進～

R3.3策定

- 荒川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村、利水ダム管理者が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
 - 【短期】 浸水被害が最も大きい岩船駅周辺の浸水深軽減のための河道掘削を実施。（岩船駅周辺の小中学校の被害解消）
田んぼダムの実施及び実施支援、雨水幹線の整備等の流域における対策、住民の防災意識向上のための取組等のソフト対策を実施。
 - 【中長期】 堤防強化対策として水衝部対策、浸透対策を実施。洪水時に流下阻害となる河口砂州対策の実施

【ロードマップ】

区分	対策内容	実施主体	工程※2	
			短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策	河道掘削	羽越河国		
	水衝部対策、堤防強化（浸透対策）			
	河口砂州、堤防整備、支川合流点対策			
	乙大日川改修（河道拡幅、堤防整備）	新潟県		
	普通河川滝矢川改修（護岸整備）	村上市		
	公共下水道雨水幹線の整備	村上市		
	砂防関係施設の整備	飯豊砂防、新潟県		
	既存ダムによる事前放流の実施	羽越河国、荒川水力、赤芝水力、東北電力		
	田んぼダムの実施及び実施支援	（実施）荒川土改、 （実施支援）新潟県、村上市		
	ため池の防災水管理の実施支援	山形県、新潟県、村上市		
	森林整備対策（間伐等、林道整備）	置賜森管、下越森管村上、森林整備センター		
	治山対策	置賜森管、下越森管村上、山形県		
被害対象を減少させるための対策	多段階な浸水リスク情報の充実	羽越河国		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	避難体制の強化、 土地の水災害リスク情報の充実、 経済被害の軽減 関係者と連携した早期復旧・復興の体制強化	羽越河国、置賜森管、下越森管村上、山形気象台、新潟気象台、山形県、新潟県、小国町、村上市、胎内市、関川村、荒川水力、赤芝水力、東北電力 等		

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

※2：スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約60億円
対策内容 河道拡幅、堤防整備、
河道掘削、水衝部対策、
堤防強化（浸透対策）等

■砂防対策

全体事業費 約350億円※1
※1：飯豊山系直轄砂防事業として

■下水道対策

全体事業費 約3億円

阿賀野川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～会津から越後まで流域一体となった被害軽減に向けた治水対策の推進～

- 阿賀野川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する
- 【短期】 氾濫被害が甚大となる盆地部、低平地での重大災害を防ぐため、堤防整備や河道掘削を実施。
山間部から低平地を抱える流域の水災害リスクの特性を踏まえ、ハザードマップの整備やマイタイムライン・避難確保計画作成支援、防災講座による啓発活動、水位計・カメラの設置、防災関連通信整備・運用による避難体制強化を実施。
- 【中期】 狭窄部・扇頂部での流下能力不足解消、盆地部・低平地での氾濫対策を図るため、横断工作物の改築や河道掘削を実施。
- 【中長期】 河川での堤防強化、山地部での砂防、治山・森林整備、盆地部・低平地での河川・下水道事業を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

【ロードマップ】

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	堤防整備、堤防強化、河道掘削、宅地嵩上げ	阿賀川河川事務所、阿賀野川河川事務所、福島県、新潟県			
	橋梁改築・逆流防止樋門設置	阿賀野川河川事務所			
	横断工作物改築	阿賀野川河川事務所			
	阿賀川全域における水衝部対策	阿賀川河川事務所			
	砂防関係施設の整備	阿賀野川河川事務所、福島県、新潟県			
	森林整備・治山対策	会津森林管理署、下越森林管理署、福島県、新潟県、森林整備センター等			
	雨水貯留管・ポンプ場の整備	新潟市 等			
	雨水貯留・浸透施設を備えた学校施設整備	会津若松市 等			
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画の策定及び見直し等検討	新潟市、五泉市、阿賀野市 等			
	民間等の新規開発事業における雨水流出抑制施設の検討	会津若松市 等			
	多段的な浸水リスク情報の充実、水害リスク空白域の解消	阿賀川河川事務所、阿賀野川河川事務所			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	危機管理型水位計・簡易カメラによる水災害リスク情報の提供、浸水想定区域の作成・公表	阿賀川河川事務所、阿賀野川河川事務所、福島県、新潟県			
	ハザードマップの作成・公表、避難確保計画、マイタイムラインの作成支援、防災講座 等	会津若松市、喜多方市、新潟市、阿賀野市、五泉市、新発田市 等			
	防災行政無線、防災ラジオ、エリアメール、あんしんメール等整備・配信	磐梯町、新潟市、阿賀野市、五泉市、新発田市、阿賀町 等			

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

※スケジュールについては、今後事業進捗によって変更する場合があります。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約1,275億円
対策内容 堤防整備、河道掘削、堤防強化、護岸整備、宅地嵩上げ 等


■砂防対策

全体事業費 約394億円※1
※1：飯豊山系直轄砂防事業及び滝坂地区直轄地すべり対策事業として


■下水道対策

全体事業費 約92億円
対策内容 雨水貯留施設の整備

～ 「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進 ～



- ・緊急復旧などを迅速に行う防災拠点等の整備
- ・河川、砂防、農業用ため池等の各種ハザードマップの作成・普及
- ・マイ・タイムライン等の作成・普及
- ・公共交通機関との洪水情報の共有
- ・小中学校における防災教育の推進
- ・住民への情報伝達手段の強化
- ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成に向けた支援
- ・企業等への浸水リスク情報の共有
- ・水害リスク空白域の解消 等



信濃川水系流域治水プロジェクト（千曲川・信濃川）【ロードマップ】

～ 「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進 ～

■信濃川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村等が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】令和元年東日本台風洪水、平成23年7月新潟・福島豪雨といった戦後最大規模の洪水に対し、

信濃川上流(千曲川)は堤防整備・強化及び水位低下を目的として狭窄部(立ヶ花等)の流下能力向上を含めた河道掘削、遊水地等の整備や雨水貯留施設等の整備を推進する。

信濃川中流は、狭窄部(大河津分水路河口部)の流下能力向上(山地部掘削、第二床固改築等)や遊水地等の整備、排水ポンプ、雨水貯留施設等の整備、田んぼダムの取組等を推進する。

信濃川下流では、新潟市街地等での重大な災害の発生を未然に防ぐため、河道掘削、堤防整備(もぐり橋解消、やすらぎ堤概成)、排水ポンプや雨水貯留施設等の整備、田んぼダムの取組等を推進する。

また、浸水被害が発生した場合、被害が広域化・長期化する等の地域的特徴を踏まえ、都市計画マスタープラン等に基づく災害に強いまちづくりの推進や、確実な避難のためのマイ・タイムラインの活用、河川防災ステーション等の防災拠点の整備等を推進する。

【中長期】令和元年東日本台風洪水、平成23年7月新潟・福島豪雨といった戦後最大規模の洪水に対し、

信濃川上流(千曲川)は、家屋部で越水による浸水が発生しないよう更なる水位低下を目指し、引き続き河道掘削、堤防整備、遊水地、大町ダム等再編等を推進する。

信濃川中流は、狭窄部(大河津分水路河口部)の流下能力向上(山地部掘削、第二床固改築等)や長岡市街地等での重大な災害の発生を防ぐための河道掘削等を推進する。

信濃川下流では、新潟市街地等での重大な災害の発生を未然に防ぎ、支派川の負担軽減のため、河道掘削やもぐり橋解消(小須戸橋架替・築堤)を推進する。

区分	対策内容		実施主体	工程	
				短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	戦後最大洪水等による浸水被害を軽減するための河川改修、洪水調節施設整備等	千曲川(堤防整備・強化、河道掘削、遊水地整備、大町ダム等再編事業の推進等)	国交省、県、電力事業者	信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 大町ダム等再編事業	遊水地等完成 土砂対策設備完成 洪水調節操作の実施条件が整い次第、治水効果を発現
		信濃川中流(堤防整備・強化、河道掘削、遊水地整備、大河津分水路改修事業の推進等)	国交省、県	信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 大河津分水路改修事業	遊水地等完成 事業完成 第二床固完成
		信濃川下流(堤防整備、河道掘削、小須戸橋架替事業の推進等)	国交省、県、市町村	小須戸橋架替事業	小須戸橋架替、築堤完成
	排水機場、雨水貯留施設、排水ポンプ等の整備、田んぼダムの取組推進等		国交省、農水省、県、市町村		
	砂防関係施設の整備		国交省、県		
	森林整備・治山対策		林野庁、県、森林整備センター		
被害対象を減少させるための対策	「まちづくり」による水害に強い地域への誘導		県、市町村		
	高床式住まい・住宅かさ上げ等の推進		市町村		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	河川防災ステーション等の防災拠点の整備		国交省、市町村	河川防災ステーション (長沼地区/長岡地区/天野地区) 完成	
	マイ・タイムライン等の活用による防災知識の普及		国交省、県、市町村		
	要配慮者施設の避難に関する取組		国交省、県、市町村		

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

■河川対策

全体事業費 約6,304億円

対策内容 河道掘削、遊水地、堤防整備、堤防強化、護岸整備、放水路整備、排水機場整備、河川管理施設耐震対策、河川防災ステーション、橋梁架替、災害復旧、大河津分水路改修、大町ダム等再編、裾花川流域ダム再生事業等

■砂防対策

全体事業費 約1,131億円

(信濃川水系直轄砂防事業及び浅間山直轄火山砂防事業として)
対策内容 砂防関係施設の整備等


■下水道対策

全体事業費 約895億円

対策内容 排水ポンプ、雨水貯留施設整備等

関川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～田園と都市と一体となった流域治水対策の推進～

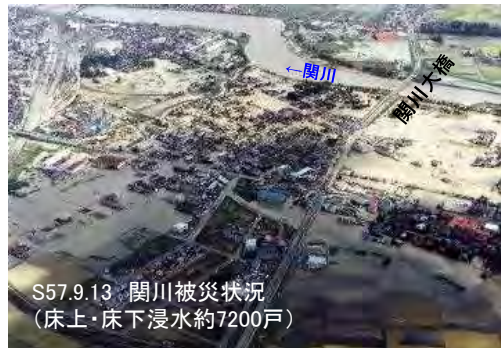

●令和元年東日本台風において各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、関川流域においても、事前防災対策を進める必要がある。

●関川は、上越地方の拠点都市である上越市を縦断し、関川下流域の高田平野には、重要港直江津港、北陸自動車道、上信越自動車道、北陸新幹線の基幹交通施設があることから、首都圏や中京圏、北陸地方、環日本海経済圏を結ぶ交通の要衝となっている。しかし、過去の水害で示されているとおり、昔から数多くの洪水被害に見舞われている地域である。

●このため、河道掘削、堤防整備、護岸整備等の河川対策は元より、上流の長野県から下流の新潟県に至る流域全体で、流出抑制のための対策(儀明川ダム建設、利水ダムの事前放流、田んぼダム、治山対策、森林整備・保全)を実施するほか、雨水ポンプ施設及び雨水管渠の整備などの内水対策、氾濫時の被害軽減のための立地適正化計画による居住誘導やハザードマップ、マイ・タイムラインの促進などによる水害リスクの周知等を実施する。

●これらの取組により、国管理区間においては、戦後最大の昭和57年9月洪水と同規模の洪水を安全に流し、流域における浸水被害の軽減を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・保倉川放水路整備
- ・河道掘削、堤防整備、護岸整備、堤防強化、急流河川対策、河床低下対策等
- ・儀明川ダム建設
- ・利水ダム等2ダムにおける事前放流等の実施及び検討、体制構築(関係者:国、新潟県、上越市、東北電力株)
- ・雨水ポンプ施設及び雨水管渠等の排水施設の整備
- ・排水ポンプ車や可搬式ポンプ等の配備
- ・田んぼの高度利用(田んぼダム)の促進
- ・砂防関係施設の整備
- ・間伐、植栽等の森林整備・保全
- ・治山ダム、山腹工等の治山対策等


■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・水害危険性を周知する河川の指定
- ・小中学校における水災害教育の支援
- ・要配慮者利用施設による避難確保計画の作成に向けた支援
- ・防災無線のデジタル化及び情報発信の多重化
- ・報道機関への水位及び画像情報の提供
- ・マイ・タイムライン作成の普及促進・支援
- ・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの設置及び公開
- ・雨水管理総合計画の一環として雨水排水路に水位計を設置しHPで公表
- ・関係機関が連携した水防実働訓練の実施
- ・関係機関による洪水に対するリスクの高い箇所(重要水防箇所)の共同点検の実施
- ・関係機関同士の情報伝達(ホットライン)の確立
- ・大規模水害を想定した排水計画案の検討
- ・堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの実施
- ・土砂災害警戒区域等の周知
- ・土砂災害のリスク情報の現地表示(標識設置)
- ・水害リスク空白域の解消等

立地適正化計画の見直し等検討



防災無線のデジタル化及び情報発信の多重化



飯山市

新潟県

信濃町

マイ・タイムライン作成の普及促進・支援



(防災訓練での普及活動状況・信濃町)

砂防関係施設の整備(関川流域)

(新潟県、長野県)

水害周知河川の指定

(新潟県・儀明川)

堤防整備護岸整備等

(新潟県)

河道掘削

(国)

堤防整備護岸整備等

(新潟県)

堤防整備護岸整備等

(新潟県)

雨水ポンプ施設の整備

(上越市)

保倉川放水路整備

(国)

儀明川ダム建設

(新潟県)

森林整備・保全

(森林管理署、森林整備センター)

間伐



治山対策

(治山ダム・森林管理署)

利水ダムの事前放流

(笹ヶ峰ダム・新潟県)

(上越市)

※本図の浸水範囲は大臣管理区間における関川及び保倉川本川の氾濫によって生じる浸水範囲を示しており、支川等他区間の氾濫による浸水範囲は含まれていません。
※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。

■被害対象を減少させるための対策

- ・立地適正化計画の見直し等検討
- ・GISを活用した不動産業者への水害実績の情報提供
- ・多段階な浸水リスク情報の充実等

GISを活用した不動産業者への水害実績の情報提供



(GISのイメージ・上越市)

凡例

- 浸水範囲
(戦後最大のS57.9洪水実績)
- 大臣管理区間
- 保倉川放水路概略ルート帯
- 堤防整備・護岸整備等
- 河道掘削
- ポンプ施設整備
- ダム整備
- 事前放流の実施ダム

関川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～田園と都市と一体となった流域治水対策の推進～

● 関川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短 期】 国管理区間(河口～12.2k)において戦後最大洪水(約2,600m³/s)と同規模の洪水を安全に流下できる河道掘削を重点的に実施。また、低平地であり、度々内水被害を受けている上越市では、上越市雨水管理総合計画に基づき、雨水ポンプ施設及び雨水管渠の整備を実施。更に引き続き保倉川放水路の整備に向けた調査検討を推進。そのほか、上流域では、砂防関係施設の整備、治山対策及び森林整備・保全を実施。あわせて、立地適正化計画の見直し等検討、GISを活用した不動産業者への水害実績の情報提供、雨水排水路に水位計を設置しホームページで公表(上越市)、防災無線のデジタル化及び情報発信の多重化(飯山市)、マイ・タイムラインの普及促進・支援、国県市町が連携した水防訓練や要配慮者施設等における避難計画の作成支援及び避難訓練の支援等のソフト対策を推進する。

【中 長 期】 関川支川保倉川では、河川整備計画規模の洪水に対応するため、保倉川放水路(700m³/sを分派)整備を実施。また、各支川において洪水氾濫の発生を防止するため、河道掘削や堤防整備を実施するとともに、沿川に住宅等が密集し河道拡幅が困難な儀明川の洪水流量を軽減させるため、その上流に儀明川ダムの建設を行う。

【ロードマップ】

区 分	対策内容	実施主体	工 程	
			短 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	保倉川放水路整備	高田河川国道事務所		
	河道掘削	高田河川国道事務所		
	河道掘削、堤防整備 等	新潟県		
	儀明川ダム建設	新潟県		
	雨水ポンプ施設の整備 等	上越市		
	砂防関係施設の整備	新潟県、長野県		
	治山対策	上越森林管理署、北信森林管理署、新潟県、長野県、妙高市、上越市		
	森林整備・保全	森林管理署、森林整備センター、新潟県		
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画の見直し等検討	妙高市、上越市		
	GISを活用した不動産業者への水害実績の情報提供	上越市		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	被害軽減対策	高田河川国道事務所、新潟県、長野県、妙高市、上越市、信濃町、飯山市		

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約899億円
対策内容 保倉川放水路、
河道掘削 等

■下水道対策

全体事業費 約23億円
対策内容 雨水ポンプ施設、
雨水管渠 等

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

～流域全体で“難治の川” 姫川を治める～





信松坂
 資料運搬状況・
 森林管理署
 の姫川本川の氾濫によって生じる浸水範囲を示しており、
 含まれていません。
 的な支川を示したものである。
 調査・検討等により変更となる場合があります。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。

姫川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～流域全体で“難治の川” 姫川を治める～

- 姫川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 急流河川特有の洪水流の強大なエネルギーに対する堤防の安全度を確保するため、西中地区において急流河川対策(護岸)を実施。また、上流域の土砂流出抑制等のため、河床低下対策、砂防関係施設の整備、治山対策、森林整備・保全を実施。あわせて、立地適正化計画の策定及び見直し等検討、土砂災害のリスク情報の現地表示(長野県)、防災重点農業用ため池ハザードマップの作成(糸魚川市)、マイ・タイムラインの普及促進・支援、要配慮者施設等における避難計画の作成支援及び避難訓練の支援等のソフト対策を推進する。
【中 長 期】 引き続き急流河川対策を実施し、堤防の侵食に対する安全性が相対的に低い箇所の解消を図るほか、河道掘削および堤防整備を実施し、河川整備計画目標流量に対しての流下断面を確保する。また、上流部でも土砂流出抑制等の対策を継続する。あわせて、雨水貯留施設、透水性舗装について検討整備を進め、流域全体における流出抑制を図る。

【ロードマップ】

区 分	対策内容	実施主体	工 程	
			短 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	急流河川対策、堤防整備 等	高田河川国道事務所		
	河床低下対策 等	長野県		
	砂防関係施設の整備	松本砂防事務所、新潟県、長野県		
	治山対策	上越森林管理署、中信森林管理署、新潟県、長野県、糸魚川市、大町市、小谷村		
	森林整備・保全	上越森林管理署、中信森林管理署、新潟県、長野県、大町市、小谷村、森林整備センター		
	雨水貯留施設の整備検討	糸魚川市		
	村道等における透水性舗装の検討	小谷村		
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画の策定及び見直し等検討	策定: 大町市、小谷村、白馬村 見直し等検討: 糸魚川市		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	被害軽減対策	高田河川国道事務所、新潟県、長野県、糸魚川市、大町市、白馬村、小谷村		



※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

- 河川対策

全体事業費 約65億円
対策内容 急流河川対策、河道掘削、堤防整備 等
- 砂防対策

全体事業費 約236億円
対策内容 砂防関係施設の整備

黒部川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～清流されどあばれ川 急流河川黒部川を流域一体で治める～



黒部川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～清流されどあばれ川 急流河川黒部川を流域一体で治める～

●黒部川では、砂防、ダム、河川、海岸の各領域で、国、県、市町、施設管理者が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】侵食による堤防決壊を防ぐため、急流河川対策、堤防整備、樹木伐採、河道掘削を実施。あわせて急流河川かつ急勾配の扇状地地形のため、洪水・土砂が短時間に流下することや海岸が近接する特徴を踏まえ、既存ダムによる事前放流、砂防・治山・海岸保全対策、立地適正化計画への防災指針の記載と取組、マイ・タイムラインや避難確保計画の作成支援、霞堤の保全のための土地利用ルールの検討や、製造業立地の比率の高い地域特性を踏まえ、大規模工場やライフライン・交通の水防支援のための災害リスク情報の作成・共有等を実施。

【中期】戦後第2位の洪水を安全に流すための堤防整備、樹木伐採、河道掘削を実施。あわせて、霞堤の保全のための土地利用ルールの運用、浸水防止計画、BCPの策定等を実施。

【中長期】戦後第1位の洪水を安全に流すための堤防整備、樹木伐採、河道掘削を実施。

【ロードマップ】

区分	対策内容		実施主体	工程		
				短期	中期	中長期
氾濫を出来るだけ防ぐ・減らすための対策	流下能力の確保	樹木伐採、河道掘削	黒部河川事務所	戦後第2位洪水(4,800m ³ /s)対応		
		堤防整備		戦後第1位洪水(5,200m ³ /s)対応		
	急流河川対策		黒部河川事務所	縦工整備		
	既存ダム6ダムによる事前放流の実施・体制構築		黒部河川事務所 富山県、施設管理者			
	連携排砂(ダム機能の維持、河床低下の防止、海岸侵食の進行抑制)		黒部河川事務所 施設管理者			
	砂防関係施設の整備		黒部河川事務所、富山県			
	海岸保全施設の整備・養浜		黒部河川事務所、富山県			
	森林整備・治山対策		富山森林管理署、富山県 (国研)森林整備センター			
被害対象を減少させるための対策	土砂災害・流木リスクの分析に基づく対策の実施		黒部河川事務所 富山森林管理署、富山県 (国研)森林整備センター			
	霞堤の保全(氾濫流の拡大防止)		黒部河川事務所 関係市町、土地所有者			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組(防災指針策定など)		黒部市、入善町、朝日町			
	企業水防支援、ライフライン・交通のBCP支援(水災害リスク情報の充実)		黒部河川事務所 富山県、関係市町 施設管理者			
	監視カメラ・観測機器による危険箇所の早期把握		黒部河川事務所 富山県、関係市町			
	マイ・タイムライン、要配慮者施設における避難確保計画の作成支援		黒部河川事務所、富山県 関係市町、施設管理者			
	排水作業準備計画の活用		黒部河川事務所 富山県、関係市町			
	緊急輸送ルートの確保(河川管理・海岸工事用通路の整備・活用)		黒部河川事務所 富山県、関係市町			

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗 によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約48億円

■砂防対策

全体事業費 約48億円

常願寺川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～急流河川特有の洪水防御と流域治水対策の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、常願寺川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 常願寺川流域は、富山県の経済・社会の中心地域となっている反面、「我が国屈指の急流河川」「土砂流出の著しい河川」であり、洪水流のエネルギーが非常に大きく、中小洪水でも堤防が侵食し、決壊する危険がある。一度氾濫すると氾濫流は、拡散して広がり広範囲に被害がおよぶ等の水害リスクの高い地域である。
- このため、急流河川対策（護岸整備）や浸透対策、砂防、森林整備・治山対策、利水ダムによる事前放流の実施、防災指針策定、洪水等リスクの現地表示やタイムラインといったツールによる水害リスクの周知等を実施する。
- これらの取り組みにより、国管理区間においては、戦後最大の昭和44年洪水と同規模の洪水が発生しても家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。



河道掘削、堤防強化
急流河川対策（護岸）
堤防整備

- ・立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取り組み（防災指針策定など）
- ・洪水等リスクの現地表示
- ・浸水実績の周知
- ・排水ポンプ車の出動要請の連絡体制整備
- ・水防災教育（出前講座の活用）

水防災教育（出前講座の活用）



富山河川国道事務所、富山市、舟橋市

マイ・タイムラインの作成及び普及

〔みんなでタイムラインプロジェクト〕
富山河川国道、黒部河川、北陸技術事務所が合同で取組んでいる。



富山県、舟橋市、滑川市、上市町においても普及のための取組みを実施

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・急流河川対策（護岸）、堤防強化（浸透対策）、堤防整備、河道掘削、霞堤の保全
- ・砂防関係施設の整備
- ・森林整備、治山対策
- ・利水ダム8ダムにおける事前放流等の実施・体制構築（関係者：国、富山県、北陸電力（株）等）
- ・準用河川の河道拡幅
- ・開発行為における雨水貯留施設整備への助成

■被害対象を減少させるための対策

- ・立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取り組み（防災指針策定など）
- ・多段階な浸水リスク情報の充実

砂防関係施設の整備



立山砂防事務所、富山県

森林整備・治山対策




富山森林管理署、富山水源林整備事務所
富山県

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・洪水等リスクの現地表示
- ・浸水実績の周知
- ・避難訓練への住民参加促進
- ・排水ポンプ車の出動要請の連絡体制整備
- ・水防災教育（出前講座の活用）
- ・マイ・タイムラインの作成及び普及
- ・要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援
- ・災害情報普及及支援
- ・浸水被害軽減対策
- ・水位計・監視カメラの活用
- ・水害リスク空白域の解消


急流河川対策

急流河川特有の洪水エネルギーに対し、堤防の安全性を確保する。

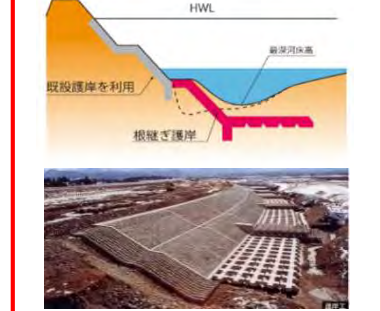


浸透対策

浸透に対して安全性が確保されない堤防に、堤防の質的整備として浸透対策を実施する。



多段階な浸水リスク情報の充実

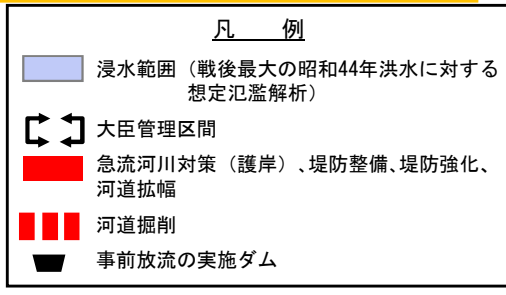

県境 市町村境 流域境

長野県

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

常願寺川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～急流河川特有の洪水防御と流域治水対策の推進～

常願寺川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短 期】国管理区間において常願寺川左岸下流部および右岸中流部において急流河川特有の流水の強大なエネルギーに対する急流河川対策を完成させる。
併せて、立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組、災害リスクの現地表示、マイ・タイムラインの作成及び支援、要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援などを実施する。

【中 期】常願寺川右岸下流部において急流河川対策を完成させるとともに、常願寺川右岸中流部を洪水時の堤防決壊から立山町や舟橋村を守る対策を実施し、事業推進を図る。

【中長期】流下能力解消のための河道掘削、堤防整備、堤防強化を図るための対策を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

【ロードマップ】

区 分	対策内容	実施主体	工 程		
			短 期	中 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流水の強大なエネルギーに対する急流河川対策(護岸)	富山河川国道事務所			
	堤防強化を図るため浸透対策	富山河川国道事務所			
	流下能力不足解消のための河道掘削、堤防整備	富山河川国道事務所			
	砂防関係施設の整備	立山砂防事務所、富山県			
	森林整備、治山対策	富山森林管理署、 富山水源林整備事務所、富山県			
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組(防災指針策定など)	富山市			
	多段階な浸水リスク情報の充実	富山河川国道事務所			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水等リスクの現地表示 水位計・監視カメラの活用	富山河川国道事務所、 富山県、富山市			
	マイ・タイムラインの作成及び普及 要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び普及 避難訓練への住民参加、水防災教育(出前講座の活用)	富山河川国道事務所、 富山県、富山市、立山町、 舟橋村、滑川市、上市町			

気候変動を
踏まえた更なる
対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗 によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約70億円

■砂防対策

全体事業費 約420億円

～上流・下流が一体となった浸水被害解消のための流域治水対策の推進～

～上流・下流が一体となった浸水被害解消のための流域治水対策の推進～

- ・令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、神通川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- ・神通川流域は、富山県の経済・社会の中心地域となっている反面、「我が国屈指の急流河川」であることから、洪水流のエネルギーが非常に大きく、中小洪水でも堤防が侵食し、決壊する危険がある。
また、熊野川合流点付近から下流区間においては、堤防断面が不足するなど流下能力が不足しており、一度氾濫すると氾濫流は拡散して広がり、広範囲に被害がおよぶ等の水害リスクの高い地域である。
- ・このため、急流河川対策（護岸整備）や堤防整備、河道掘削、調整池整備、砂防、森林整備・治山対策、利水ダムによる事前放流の実施、水田貯留、防災指針策定、洪水等リスクの現地表示やタイムラインといったツールによる水害リスクの周知等を実施する。
- ・これらの取り組みにより、国管理区間においては、戦後最大の平成16年洪水と同規模の洪水が発生しても家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。

【位置図】



凡 例

-  浸水範囲（戦後最大の平成16年洪水
に対する想定氾濫解析）
-  大臣管理区間
-  急流河川対策（護岸）、堤防整備、
護岸整備、河道拡幅
-  河道掘削
-  調節池整備
-  ダム整備
-  事前放流の実施ダム
-  雨水貯留施設の整備
-  下水道等の排水施設の整備

砂防関係施設の整備



神通川水系砂防事務所
富山県、岐阜県

マイ・タイムラインの作成及び普及

〔みんなでタイムラインプロジェクト〕
富山河川国道、黒部河川、北陸
技術事務所が合同で取組んでいる。



その他、富山県、岐阜県で普及のための
取組みを実施

■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・急流河川対策(護岸)、堤防整備、堤防強化(浸透対策)、河道掘削、許可工作物の改築、護岸整備、河道拡幅、樹木伐採、橋梁改築、調節池整備、大島ダム整備(検証中)、霞堤の保全
- ・砂防関係施設の整備
- ・森林整備、治山対策
- ・雨水貯留施設の整備、下水道等の排水施設の整備
- ・利水ダム等21ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
(関係者:国、富山県、岐阜県、北陸電力(株)、関西電力(株)等)
- ・準用河川の河道拡幅
- ・水田貯留

■被害対象を減少させるための対策

- ・立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取り組み（防災指針策定など）
- ・多段階な浸水リスク情報の充実

■被害の軽減、早急復旧・復興のための対策

- ・洪水等リスクの現地表示、浸水実績の周知
- ・洪水ハザードマップの作成・配布
- ・避難訓練への住民参加促進、水防資材の配布
- ・排水ポンプ車の出動要請の連絡体制整備
- ・水防災教育(出前講座の活用)、マイ・タイムラインの作成及び普及
- ・要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援
- ・広域避難計画の検討
- ・土砂災害警戒区域等の指定・周知
- ・水位計・監視カメラの活用
- ・水害リスク空白域の解消

森林整備・治山対策



富山及び飛騨森林管理署、富山及び
 皇水源林整備事務所、富山県、岐阜県

宜川圈域


- 護岸整備、河道掘削、堤防整備、橋梁改築、樹木伐採、調節池整備、堤防強化、大島ダム整備（検証中）、ダム管理施設整備（丹生川ダム）

多段階な浸水リスク情報の充実



堤防整備(富山市街地重点防御築堤事業)

富山市街地を洪水氾濫から守るため、堤防のかさ上げ、拡幅などの河川改修を重点的に実施

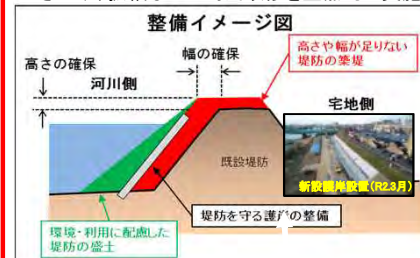

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

※岐阜県内の令和2年7月豪雨災害による被災箇所における対策については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

— ■ — ■ 県境 ——— 市町村境 ——— 流域境

神通川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～上流・下流が一体となった浸水被害解消のための流域治水対策の推進～

神通川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】国管理区間における神通川右岸中流部において、富山市街地重点防御築堤事業の堤防整備を完成させるとともに、左岸上流部の急流河川対策を完成させることで富山市街地を守る。

併せて、立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組、洪水ハザードマップの配布、マイ・タイムラインの作成及び支援、要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援などを実施する。

【中期】左岸中流部において急流河川対策を完成させるとともに、本川右岸下流部と井田川などにおいて流下能力不足解消のための堤防整備を完成させる。

【中長期】井田川の堤防整備を完了するとともに、右岸上流部の急流河川対策及び熊野川の堤防整備に着手し、流域全体の安全度向上を図る。

【ロードマップ】

区 分	対策内容	実施主体	工 程		
			短 期	中 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流下能力不足解消のための堤防整備(富山市街地重点防御築堤事業)、河道掘削を行い富山市街地を守る	富山河川国道事務所			
	流水の強大なエネルギーに対する急流河川対策	富山河川国道事務所			
	流下能力不足解消のための河道拡幅、護岸整備、河道掘削など	富山県、岐阜県			
	砂防関係施設の整備	神通川水系砂防事務所、富山県、岐阜県			
	森林整備、治山対策	富山及び飛騨森林管理署、富山及び岐阜水源林整備事務所、富山県、岐阜県			
	雨水貯留施設の整備、下水道等の排水施設の整備	富山市			
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組(防災指針策定など)	富山市		立地適正化計画への防災指針の記載と取組など	
	多段階な浸水リスク情報の充実	富山河川国道事務所			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水ハザードマップの作成・配布 洪水等リスクの現地表示、水位計・監視カメラの活用	富山河川国道事務所、富山県、岐阜県、富山市、高山市、飛騨市			
	マイ・タイムラインの作成及び普及 要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び普及 避難訓練への住民参加、水防災教育(出前講座の活用)	富山河川国道事務所、富山県、岐阜県、富山市、高山市、飛騨市			

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗 によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策	■砂防対策	■下水道対策
全体事業費 約828億円	全体事業費 約444億円	全体事業費 約39億円

庄川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～急流河川における堤防安全度向上と流域治水対策の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、庄川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 庄川流域は、富山県の経済・社会の中心地域となっている反面、「我が国屈指の急流河川」であることから、洪水流のエネルギーが非常に大きく、中小洪水でも堤防が侵食し、決壊する危険がある。一度氾濫すると氾濫流は、拡散して広がり広範囲に被害がおよぶ等の水害リスクの高い地域である。
- このため、急流河川対策(護岸整備)、利賀ダムの整備、砂防、森林整備・治山対策、利水ダムによる事前放流の実施、雨水貯留施設整備、水田貯留、防災指針策定、洪水等リスクの現地表示やタイムラインといったツールによる水害リスクの周知等を実施する。
- これらの取り組みにより、国管理区間においては、戦後最大の平成16年洪水と同規模の洪水が発生しても家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。

【位置図】



凡 例

- 浸水範囲(戦後最大の平成16年洪水に対する想定氾濫解析)
- 大臣管理区間
- 堤防整備・堤防強化
- 樋門・樋管整備、橋梁改築 等
- ダム整備
- 事前放流の実施ダム
- 雨水貯留施設の整備
- 下水道等の排水施設

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- 急流河川対策(護岸)、堤防整備、合流点処理、河道拡幅、護岸整備、河道掘削、樹木伐採、橋梁改築(架替)、利賀ダム整備(建設中)、霞堤の保全
- 砂防関係施設の整備
- 森林整備、治山対策
- 利水ダム等17ダムにおける事前放流等の実施、体制構築(関係者:国、富山県、岐阜県、関西電力(株)、電源開発(株)等)
- 雨水貯留施設整備、下水道等の排水施設整備
- 農業用排水路・洪水調整池等の整備、水田貯留
- 各家庭等における雨水貯留施設整備への助成

■被害対象を減少させるための対策

- 立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取り組み(防災指針策定など)
- 多段階な浸水リスク情報の充実


■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- 洪水等リスクの現地表示、洪水ハザードマップの作成・配布
- 浸水実績の周知、避難訓練への住民参加の促進
- 水防災教育(出前講座の活用)
- マイタイムラインの作成及び普及、広域避難計画の検討
- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び支援
- 災害情報普及支援、浸水被害軽減対策
- 土砂災害警戒区域等の指定・周知
- 水位計・監視カメラの活用
- 水害リスク空白域の解消



急流河川対策

急流河川特有の洪水のエネルギーに対し堤防の安全性を確保する



マイ・タイムラインの作成及び普及

[みんなでタイムラインプロジェクト]
富山河川国道、黒部河川、北陸技術事務所が合同で取組んでいる。



その他、富山県、岐阜県、高岡市、砺波市、白川村で普及のための取組みを実施

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

庄川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～急流河川における堤防安全度向上と流域治水対策の推進～

庄川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】国管理区間における庄川左岸中流部及び左右岸下流部において、急流河川特有の流水の強大なエネルギーに対する堤防の安全を確保し、高岡市、射水市、砺波市を守る急流河川対策を完成させる。

併せて、立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組、洪水ハザードマップの配布、マイ・タイムラインの作成及び支援、要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援などを実施する。

【中長期】利賀ダムの整備を完成させるとともに、流下能力不足解消のための橋梁架替、合流点処理及び庄川右岸下流部において流下能力不足解消のための堤防整備を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

【ロードマップ】

区 分	対策内容	実施主体	工 程	
			短 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流水の強大なエネルギーに対して下流部の射水市を守る急流河川対策	富山河川国道事務所		
	流下能力不足解消のための堤防整備、橋梁架替、支川への影響を低減させるための合流点処理	富山河川国道事務所 利賀ダム工事事務所		
	利賀ダムの整備			
	流下能力不足解消のための堤防整備、河道拡幅、河道掘削、護岸整備	富山県、岐阜県		
	砂防関係施設の整備	富山県、岐阜県		
	森林整備、治山対策	富山及び飛騨森林管理署、 富山及び岐阜水源林整備事務所、 富山県、岐阜県		
	農業用排水路、洪水調整池等の整備	富山県		
被害対象を減少させるための対策	雨水貯留施設の整備、下水道等の排水施設の整備	高岡市、射水市、砺波市		
	立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組（防災指針策定など）	富山市、高岡市	立地適正化計画への防災指針の記載と取組など	
	多段階な浸水リスク情報の充実	富山河川国道事務所		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水ハザードマップの作成・配布 洪水等リスクの現地表示、水位計・監視カメラの活用	富山河川国道事務所、 富山県、岐阜県、富山市、高山市		
	マイ・タイムラインの作成及び普及 要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び普及 避難訓練への住民参加、水防災教育（出前講座の活用）	富山河川国道事務所、 富山県、岐阜県、富山市、高岡市、 射水市、砺波市、白川村、高山市		

気候変動を
踏まえた更なる
対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約1,392億円


■下水道対策

全体事業費 約9億円

小矢部川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～本川・支川一体となった浸水被害解消のための流域治水対策の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、小矢部川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 小矢部川流域は、富山県の経済・社会の中心地域となっている反面、庄川扇状地の末端に位置していることから、氾濫流は拡散しないものの流下型の氾濫形態であると共に、庄川の氾濫域と重複するため、氾濫が発生すると湛水時間が長期化する等の水害リスクの高い地域である。
- このため、浸透対策、堤防整備、護岸整備、砂防、森林整備・治山対策、利水ダムによる事前放流の実施、雨水貯留施設整備、水田貯留、防災指針策定、ハザードマップの周知やタイムラインといったツールによる水害リスクの周知等を実施する。
- これらの取り組みにより、国管理区間においては、戦後最大の平成10年洪水と同規模の洪水が発生しても家屋浸水を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。

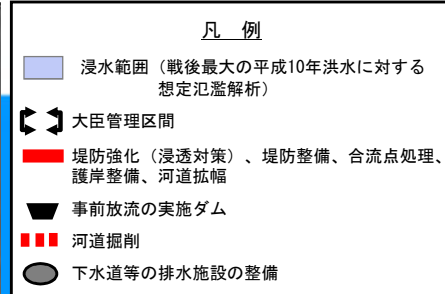


- ### ■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
- 堤防強化（浸透対策）、堤防整備、河道掘削、合流点処理、護岸整備、河道拡幅、霞堤の保全
 - 砂防関係施設の整備
 - 森林整備、治山対策
 - 利水ダム等6ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、富山県等）
 - 雨水貯留施設の整備、下水道等の排水施設の整備
 - 農業用排水路・洪水調節池等の整備、水田貯留
 - 各家庭等における雨水貯留施設整備への助成

- ### ■被害対象を減少させるための対策
- 立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取り組み（防災指針策定など）
 - 多段階な浸水リスク情報の充実


- ### ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
- 洪水ハザードマップの配布
 - 避難訓練への住民参加促進
 - 水防災教育（出前講座の活用）、マイ・タイムラインの作成及び普及
 - 要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援
 - 災害情報普及支援、浸水被害軽減対策
 - 水位計監視カメラの活用
 - 水害リスク空白域の解消

浸透対策イメージ

浸透に対して安全性が確保されない堤防において、堤防の質的整備として浸透対策を実施。



多段階な浸水リスク情報の充実

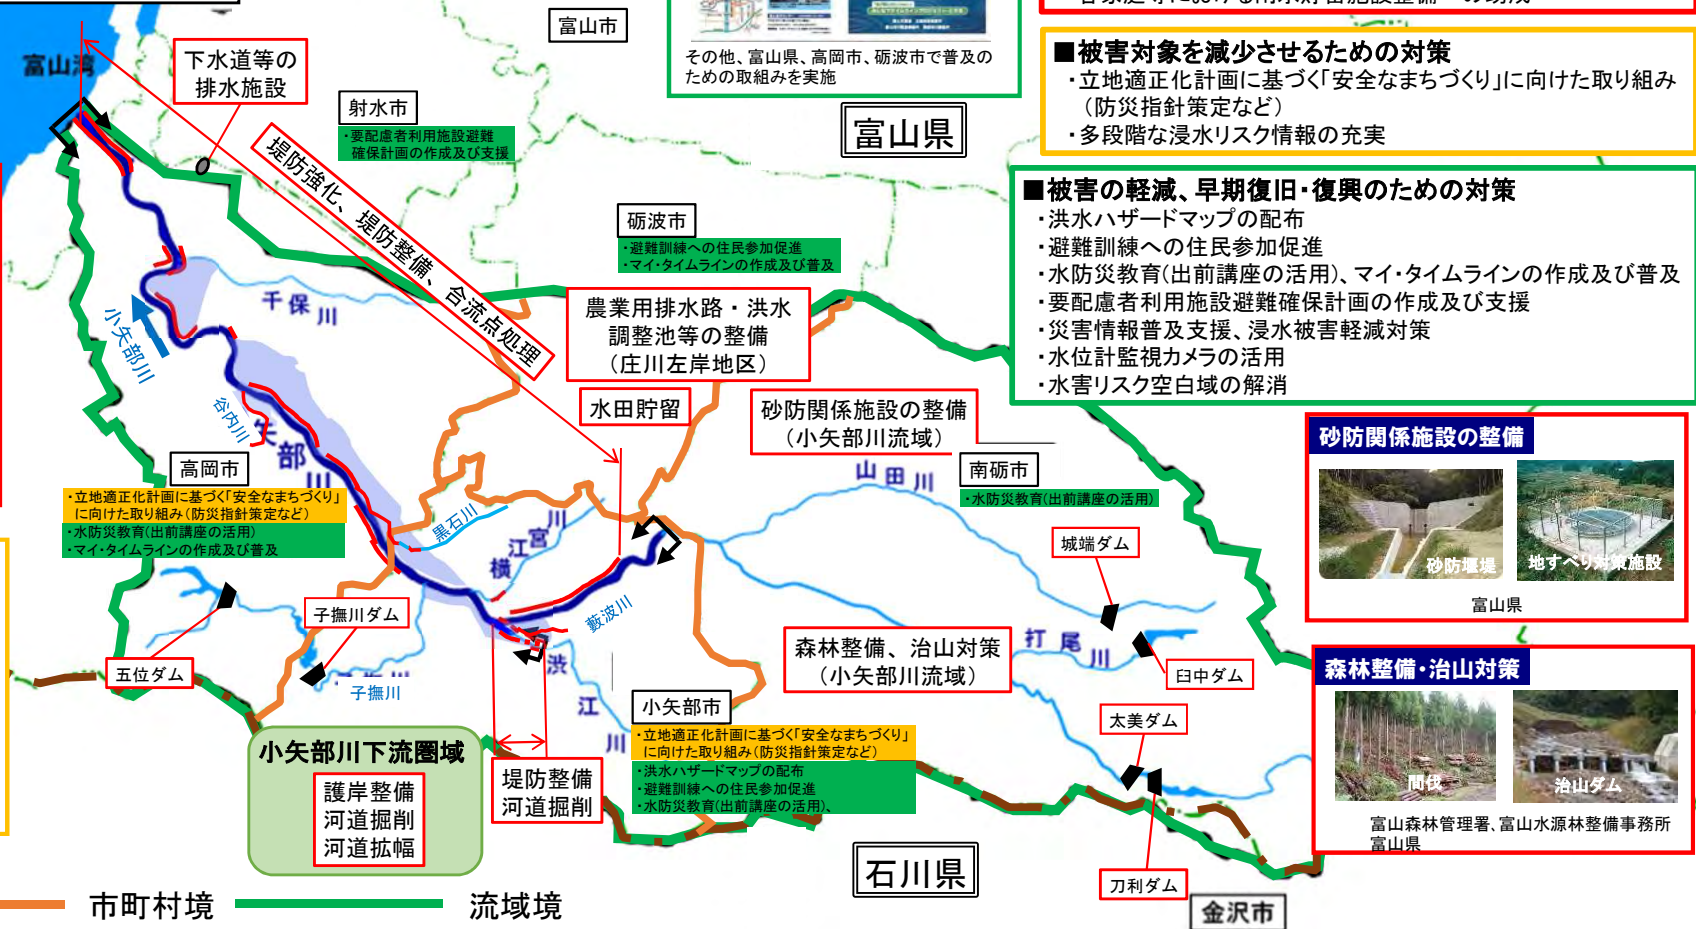

小矢部川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～本川・支川一体となった浸水被害解消のための流域治水対策の推進～

小矢部川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市町村が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短 期】国管理区間における小矢部川右岸中下流部において堤防の浸透対策を完成させ、洪水時の堤防決壊から高岡市を守る対策を実施する。

併せて、立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組、洪水ハザードマップの配布、マイ・タイムラインの作成及び支援、要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び支援などを実施する。

【中長期】小矢部川左岸中流部において高岡市を守る堤防の浸透対策を完成させるとともに、河口部の流下能力不足解消のための堤防整備を実施する。

また、小矢部川左岸下流部において洪水時の堤防による堤防の決壊から高岡市を守る対策や合流点処理を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

【ロードマップ】

区 分	対策内容	実施主体	工 程	
			短 期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	堤防強化を図るための浸透対策	富山河川国道事務所		
	流下能力不足解消のための堤防整備 支川への影響を低減させるための合流点処理	富山河川国道事務所		
	流下能力不足解消のための河道拡幅、河道掘削、護岸整備	富山県		
	砂防関係施設の整備	富山県		
	森林整備、治山対策	富山森林管理署、 富山水源林整備事務所、富山県		
	農業用排水路、洪水調整池等の整備	富山県		
	雨水貯留施設の整備、下水道等の排水施設の整備	高岡市、射水市		
被害対象を減少させるための対策	立地適正化計画に基づく「安全なまちづくり」に向けた取組 (防災指針策定など)	高岡市、小矢部市	立地適正化計画への防災指針の記載と取組など	
	多段階な浸水リスク情報の充実	富山河川国道事務所		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水ハザードマップの配布 水位計・監視カメラの活用	富山河川国道事務所、 富山県、小矢部市		
	マイ・タイムラインの作成及び普及 要配慮者利用施設避難確保計画の作成及び普及 避難訓練への住民参加、水防災教育（出前講座の活用）	富山河川国道事務所、 富山県、高岡市、射水市 砺波市、小矢部市、南砺市		

気候変動を
踏まえた更なる
対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約 1 7 7 億円

■下水道対策

全体事業費 約 2 億円

～急流河川の強大なエネルギーや浸水リスクから地域をまもる流域治水の推進～

- - - 市町村境
 ——— 市町村境
 ——— 流域境
- ※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある



手取川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～急流河川の強大なエネルギーや浸水リスクから地域をまもる流域治水の推進～

● 手取川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】 手取川は全国有数の急流河川であることから、洪水時に流下するエネルギーが非常に大きく、堤防を侵食等させ氾濫するおそれがあり、このため急流河川対策を推進。下流の支川では、合流点の未整備、支川の改修が未整備であることから、洪水による浸水が懸念される。このため国では合流点処理として樋門を、県は支川改修を連携して進めることで、沿川の治水安全度を向上させる。また、市街地における浸水対策として白山市では雨水排水路整備を実施、野々市市では雨水幹線の改修を実施。金沢市では流出抑制対策として雨水貯留や浸透ますの整備を実施。また、川北町では霞堤の保全として霞堤止水ゲートの設置による機能確保を実施。あわせて、マイ・タイムラインの作成、国・県・市が連携した水防訓練や要配慮者施設等における避難計画の作成・訓練実施の促進等のソフト対策を実施。

【中期】 短期に引き続き、本川では急流河川対策を推進。樋門整備が完了することから支川改修を推進。また、上流域での土砂流出抑制や森林の保水・防災機能を発揮するために砂防関係施設の整備や森林整備・保全を実施。

【ロードマップ】

区分	対策内容		実施主体	工程	
				短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	堤防整備・急流河川対策(護岸)・河道掘削		金沢河川国道事務所		
	支川対策	合流点処理(樋門設置)	金沢河川国道事務所	西川・熊田川合流点	
		堤防整備・護岸整備・河道掘削	石川県		
	雨水貯留、浸透施設の整備・雨水排水路の整備		金沢市・白山市・能美市・野々市市		
	砂防関係施設の整備		金沢河川国道事務所・石川県		
被害対象を減少させるための対策	霞堤の保全(止水ゲートの設置)		川北町		
	止水板の設置に対する助成		金沢市		
	立地適正化計画(防災指針)の策定		白山市・能美市・金沢市・野々市市・小松市		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	被害軽減対策		金沢河川国道事務所・石川県 白山市・能美市・野々市市		
	水位計・河川監視カメラの増設		石川県		

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

水防訓練の実施

要配慮者施設等における避難計画の作成、訓練実施の促進

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約184億円

■砂防対策

全体事業費 約335億円

■下水道対策

全体事業費 約2,638億円

梯川水系流域治水プロジェクト【位置図】

～水の郷こまつを洪水氾濫からまもる流域治水の推進～

- 令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、梯川水系においても、事前防災対策を進める必要がある。
- 梯川は氾濫原が低平地であるという特性を踏まえ、流域では小松市による総合治水対策の推進に関する条例や開発事業者に対しての雨水流出抑制対策推進などを実施するとともに、被害の軽減を図るためマイ・タイムラインの周知等を実施する。
- 国管理区間においては、戦後最大の昭和34年台風7号と同規模の洪水を安全に流し、流域における浸水被害の軽減を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ・堤防整備、河道掘削、護岸整備、橋梁改築
- ・砂防関係施設の整備
- ・既存ダムにおいて事前放流等の実施、体制構築
- ・石橋川遊水地の整備
- ・内水排除のためのポンプの新設
- ・学校敷地を活用した校庭貯留施設の活用
- ・雨水貯留施設等設置に対する助成
- ・農業用水路の活用
- ・森林整備・保全
- ・開発事業において雨水流出抑制対策を実施 等

■被害対象を減少させるための対策


- ・多段階な浸水リスク情報の充実
- ・総合治水対策の推進に関する条例
- ・住宅地盤の嵩上げに対する助成
- ・立地適正化計画（防災指針）の策定による水害リスクの低い地域への居住誘導や既成市街地の防災力向上 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- ・マイ・タイムラインの作成
- ・要配慮者施設等における避難計画の作成及び訓練実施の促進
- ・水害リスク空白域の解消
- ・水位計、河川監視カメラの増設
- ・国・県・市町が連携した水防訓練の取り組み
- ・LINEを活用した危機管理の強化 等



九竜橋川雨水ポンプ場（内水排除）

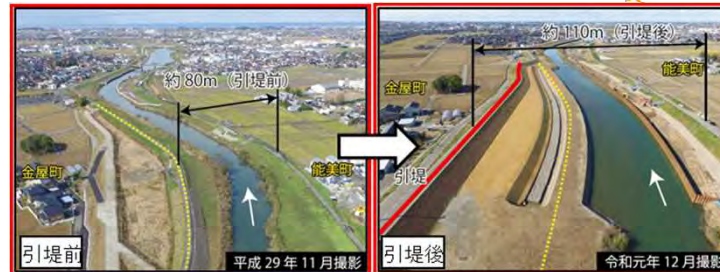

堤防の整備と河道掘削



総合治水対策の推進に関する条例
（小松市）




住宅地盤嵩上げに対する助成（小松市）



LINEを活用した危機管理の強化
（事例：小松市）



水防訓練の実施
（国・県・各市町・関係団体）



市町村境 流域境

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

石川県

能美市

小松市

【位置図】



- ・校庭貯留施設の活用
- ・農業用水路の活用
- ・マイ・タイムラインの作成
- ・水防訓練の実施
- ・要配慮者施設等の避難計画作成及び訓練実施
- ・LINEを活用した防災情報配信

- ・総合治水対策の推進に関する条例
- ・宅地の嵩上げ助成
- ・マイ・タイムラインの作成
- ・水防訓練の実施
- ・要配慮者施設等の避難計画作成及び訓練実施
- ・LINEを活用した防災情報配信

梯川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～水の郷こまつを洪水氾濫からまもる流域治水の推進～

● 梯川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短 期】 梯川では、洪水時の水位上昇の著しい白江大橋から荒木田大橋を概成することにより、平成25年7月出水(780m³/s)と同規模の洪水を安全に流下できる堤防整備等を重点的に実施。また、低平地であり、度々内水被害を受けている小松市では、総合治水対策の推進に関する条例に基づき、開発事業者に対し雨水流出抑制対策を推進するとともに、石橋川遊水地の整備を実施。あわせて、マイ・タイムラインの作成、国・県・市が連携した水防訓練や要配慮者施設等における避難計画の作成・訓練実施の促進等のソフト対策を実施。

【中 長 期】 梯川では、国管理区間(河口～12.2k)において、河川整備計画規模の洪水(1,000m³/s)を安全に流下できる堤防整備等を実施。また、小松市においては、総合治水対策の推進に関する条例に基づき、開発事業者に対し雨水流出抑制対策を推進。

【ロードマップ】

区分	対策内容	実施主体	工程	
			短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	堤防整備・河道掘削	金沢河川国道事務所	白江大橋～荒木田大橋	荒木田大橋上流
	河道掘削・護岸整備	石川県		
	横断工作物改築(橋梁改築)	金沢河川国道事務所、石川県		
	梯川逆水門改修	金沢河川国道事務所		
	既存ダムの洪水調節機能強化	石川県		
	石橋川遊水地の整備	小松市		
	砂防関係施設の整備	石川県		
	森林整備・保全	林野庁、石川県、(国研)森林研究・整備機構		
被害対象を減少させるための対策	総合治水対策の推進に関する条例住宅地盤の嵩上げに対する助成	小松市		
	立地適正化計画(防災指針)の策定	小松市、能美市		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	被害軽減対策	金沢河川国道事務所、石川県・小松市・能美市		
	水位計・河川監視カメラの増設	石川県		水防訓練の実施 要配慮者施設等における避難計画の作成、訓練実施の促進

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

【事業費（R2年度以降の残事業費）】

■河川対策

全体事業費 約299億円

■下水道対策

全体事業費 約10億円
